



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กต.ปร.ท.ท. (พิเศษ)
รับที่ ๙๔๓๒๖
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๖
เวลา ๑๖.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๘

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๒๐๒๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๗๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจกส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๓๔๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๘๑๗๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๔

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๑๕๕๓

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขานุการกรม

ท ก.บ. ๕๔

(นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๕

เรียน อปส.

สพ. แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ให้ อปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

สนก.

๒๐ ส.ค. ๕๘

๖

ทราบ

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)

อปส.

๓ ก.ย. ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) 5640

๕๖

๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ก)๒๘๑๓๖



กองกลาง	๑๓๕๕๔
เลขรับ	๑๓๕๕๔
วันที่	๑๓/๑๑/๖๖
๑๐-๗๑	

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๑๓๕๕๔
เลขรับ	๑๓๕๕๔
วันที่	๑๓/๑๑/๖๖
เวลา	๐๙.๓๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย)
เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ก) ๒๓๙๙๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๔๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับเรื่อง รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) [ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕)] ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชี้แจงว่า การก่อสร้างสะพานแยกกกายเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทของกรุงเทพมหานครเดิมที่มีอยู่แล้ว
แต่ต่อมาเมื่อมีโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้ปรับลดระดับความสูงของสะพานเพื่อไม่ให้บดบัง
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของรัฐสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (แยกกกาย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจง และให้กระทรวงมหาดไทย
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานแยกกกายว่าเป็นการดำเนินการตามแผนที่มียู่แล้ว
มิใช่การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เจ้าพนักงาน

เจ้าพนักงาน

(นางแก้วใจ นันทะกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.cabinet.thaigov.go.th



ที่ มท ๐๗๑๖/ ๑๕๕/๒๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็น ๔ ประเด็นดังนี้

๑. ผลงานสะสมที่ทำได้ ๑๒.๕๓% (ล่าช้ากว่าแผน ๖๗.๗๒%)

๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบอีกประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของงานปรับปรุงทัศนียภาพ

๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ขนดินออกจากพื้นที่ได้แล้ว ๘๑๑,๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก ๒๒๑,๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร

๔. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จำนวน ๑ เล่ม

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ไม่มี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๕-๕๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมพ์นภัส ทับเชิงทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๕(สร.๑)๕๕๕/๒๕๕๘ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘


เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

พลเอก


(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี

คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่.....

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย)

โดย

กระทรวงมหาดไทย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ) และนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร่วมกันรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้น คณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเร็วต่อไป

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจพิจารณาแล้ว

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความเห็นในส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ผลงานสะสมที่ทำได้ ๑๒.๕๓% (ล่าช้ากว่าแผน ๖๗.๗๒%)
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบอีกประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของงานปรับภูมิทัศน์
๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ขนดินออกจากพื้นที่ได้แล้ว ๘๑๑,๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก ๒๒๑,๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร

๔. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สารบัญ

หน้า

- สารบัญ ก
- บทสรุปผู้บริหาร ข
- สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ๑
- ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ๙

บทสรุปผู้บริหาร

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผู้รับจ้างครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ นับวันเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ด้วยการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ประกอบกับปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และไม่มีที่พักดิน จึงทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราว และงานขุดดิน งานก่อสร้างรากฐาน และงานต่อเนื่องส่วนอื่นๆ
- ตามสัญญาก่อสร้าง กำหนดแบ่งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่โดยประมาณ ๑๒๓ ไร่) ออกเป็น ๔ ครั้ง โดยกำหนดส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ในความเป็นจริงได้มีการแบ่งการส่งมอบพื้นที่ออกเป็นครั้งย่อยๆ และล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะในขอบเขตการก่อสร้างอาคารหลักครบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้อีกประมาณ ๒๐ ไร่
- ปริมาณดินที่ต้องขุดเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลบ.ม. โดยตามสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดและขนย้ายดินไปยังพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ ซึ่งในช่วงแรกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการบริจาคดินให้กับวัดและหน่วยงานราชการควบคู่ไปกับการขายทอดตลาด แต่ต่อมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ที่ กค๐๓๑๔/๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระงับการบริจาคดินทั้งหมดและให้ดำเนินการขายทอดตลาดเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การระบายดินออกจากพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ปัจจุบันสามารถขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้แล้ว จำนวน ๘๑๑,๓๘๔ ลบ.ม. เหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก จำนวน ๒๒๑,๔๓๔ ลบ.ม.
- สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน โดยจะต้องทำงานเสาเข็มเจาะ งานระบบป้องกันดินพังและขุดดินขนย้ายดิน และงานฐานรากอาคาร ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนงานทั้งโครงการ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๑๒.๕๓ % (ล่าช้ากว่าแผนงาน -๖๗.๗๒%)
- ตามที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จากสาเหตุผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ออกไปจำนวน ๔๗๙ วัน เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาโดยมีการนัดประชุมอย่างต่อเนื่อง (ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงาน ที่ประชุมจึงมีมติให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการหารายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มิ.ย. 58	หมายเหตุ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 12.53 %	มีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างขั้นได้ดิน ได้แก่
		ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 80.25 %	- งานขุดและถมดิน (เพิ่มขึ้น 34,156 ลบ.ม.)
		ล่าช้ากว่าแผน 67.72 %	- งานฐานรากอาคารหลัก แล้วเสร็จ 537 ฐาน จาก 910 ฐาน (เพิ่มขึ้น 44 ฐาน)
	หมายเหตุ ผลงานสะสมเมื่อ 31 พ.ค. 2558 ทำได้ 11.25 %		- งานพื้นชั้น B2 แล้วเสร็จ 24,391 ตร.ม. จาก 80,000 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 10,952 ตร.ม.)
			- งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B2 แล้วเสร็จ 411 ต้น จาก 742 ต้น (เพิ่มขึ้น 53 ต้น)
			- งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B1 (แล้วเสร็จ 79 ต้น จาก 4 ต้น)
			- งานติดตั้ง Bracing Layer 2 แล้วเสร็จ 2,407 ม. จาก 9,278 ม.

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มิ.ย. 58	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)	ยังไม่มี การส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม	ส่งมอบแล้ว 102 - 3 - 76 ไร่ (คิดเป็น 83.5%) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด โดยส่งมอบครั้งแรกล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 57 เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 20 - 0 - 80 ไร่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มิ.ย. 58	หมายเหตุ
3	การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง (ปริมาณดินทั้งหมด 1,032,818 ลบ.ม.)	- ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ 811,384 ลบ.ม. (78.56%)	ขนย้ายได้เพิ่มจากเดือน พฤษภาคม 34,156 ลบ.ม.
		- เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก 221,434 ลบ.ม. (21.44%)	(อัตราเฉลี่ย 1,139 ลบ.ม. / วัน)

ข้อมูลการขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

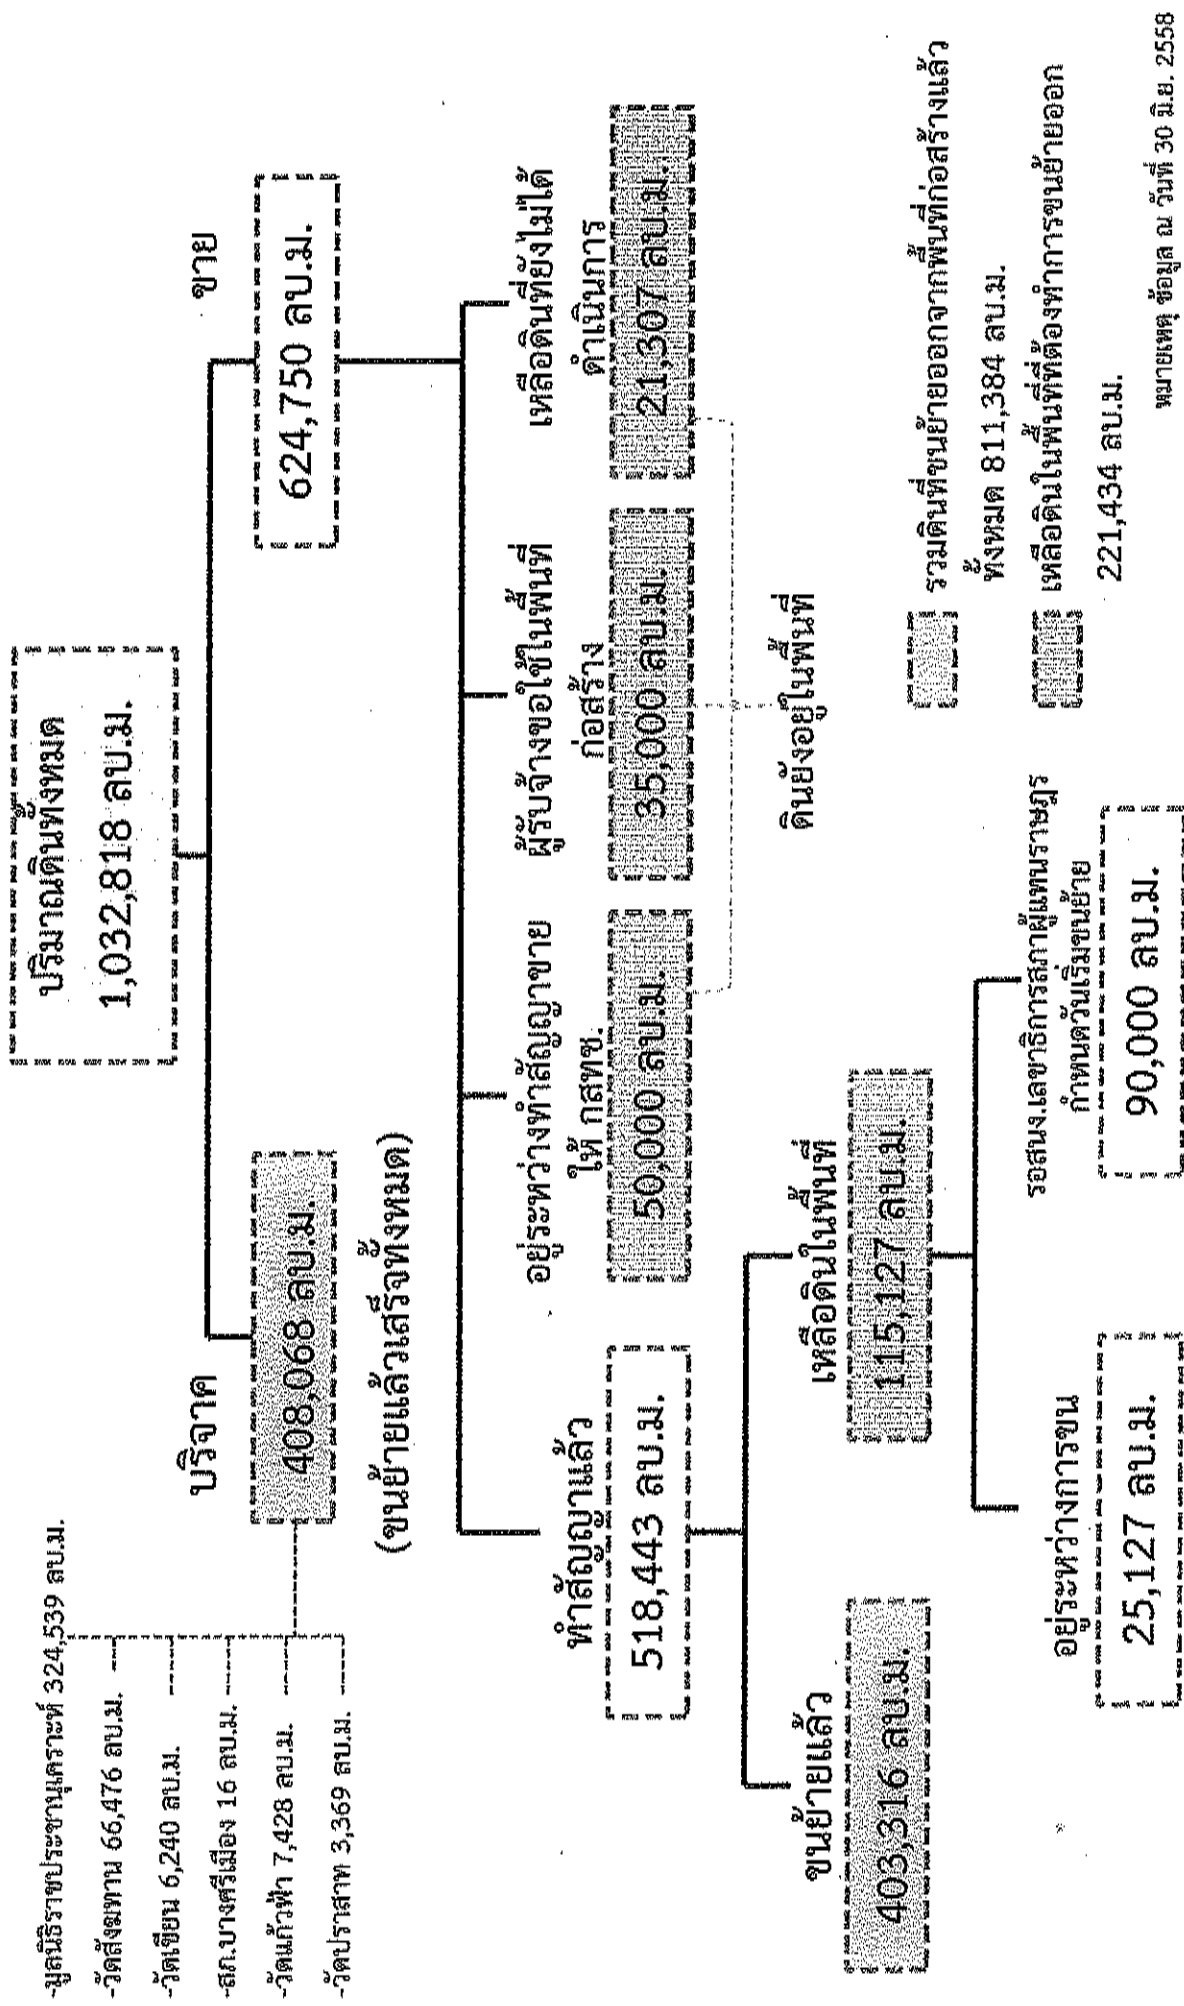


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มิ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค	4.1 ได้มีการเร่งรัดติดตามพื้นที่จากหน่วยงานเดิม ดังนี้	
	4.1 ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือ	4.1.1 พื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานของ
	ยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง	เป็นพื้นที่บ้านพัก อพ.ศอพท. สำนักงานเลขาธิการ	คณะกรรมการการกำหนดรายละเอียด
	กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่	สภาผู้แทนราษฎรได้รับพื้นที่คืนจากสำนักงานปลัด	ขอเบี่ยงงานรื้อถอนและประเมินราคา
	ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลาน-	กระทรวงกลาโหมแล้ว	ซากอาคาร เพื่อการรื้อถอนอาคารเดิม
	ประชาชน ลานประชาธิปไตย อาคาร	4.1.2 พื้นที่ของ กพม. เป็นพื้นที่ห้องสมุดและ	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมลงนามใน
	รักษาความปลอดภัย เป็นต้น	ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้องทำการรื้อถอน	สัญญารื้อถอน ระหว่างกรุงเทพมหานคร
	ซึ่งตามแผนงานผู้รับจ้างจะใช้เวลา	อาคารเดิมออกก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้สำนักงานเลขาธิการ	กับผู้รับจ้าง
	ก่อสร้างงานส่วนดังกล่าวเป็นเวลา	สภาผู้แทนราษฎร	
	376 วัน	4.1.3 พื้นที่ของ สพฐ. เป็นพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ	
		ซึ่งจะส่งมอบพื้นที่คืนให้สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทน-	
		ราษฎร ภายในเดือน ส.ค. 2558 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	
		4.1.4 พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	- อยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อสร้างอาคารที่พัก
			แห่งใหม่ให้เสร็จโดยเร็วภายใน ธ.ค. 58

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘

ผังแสดงพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

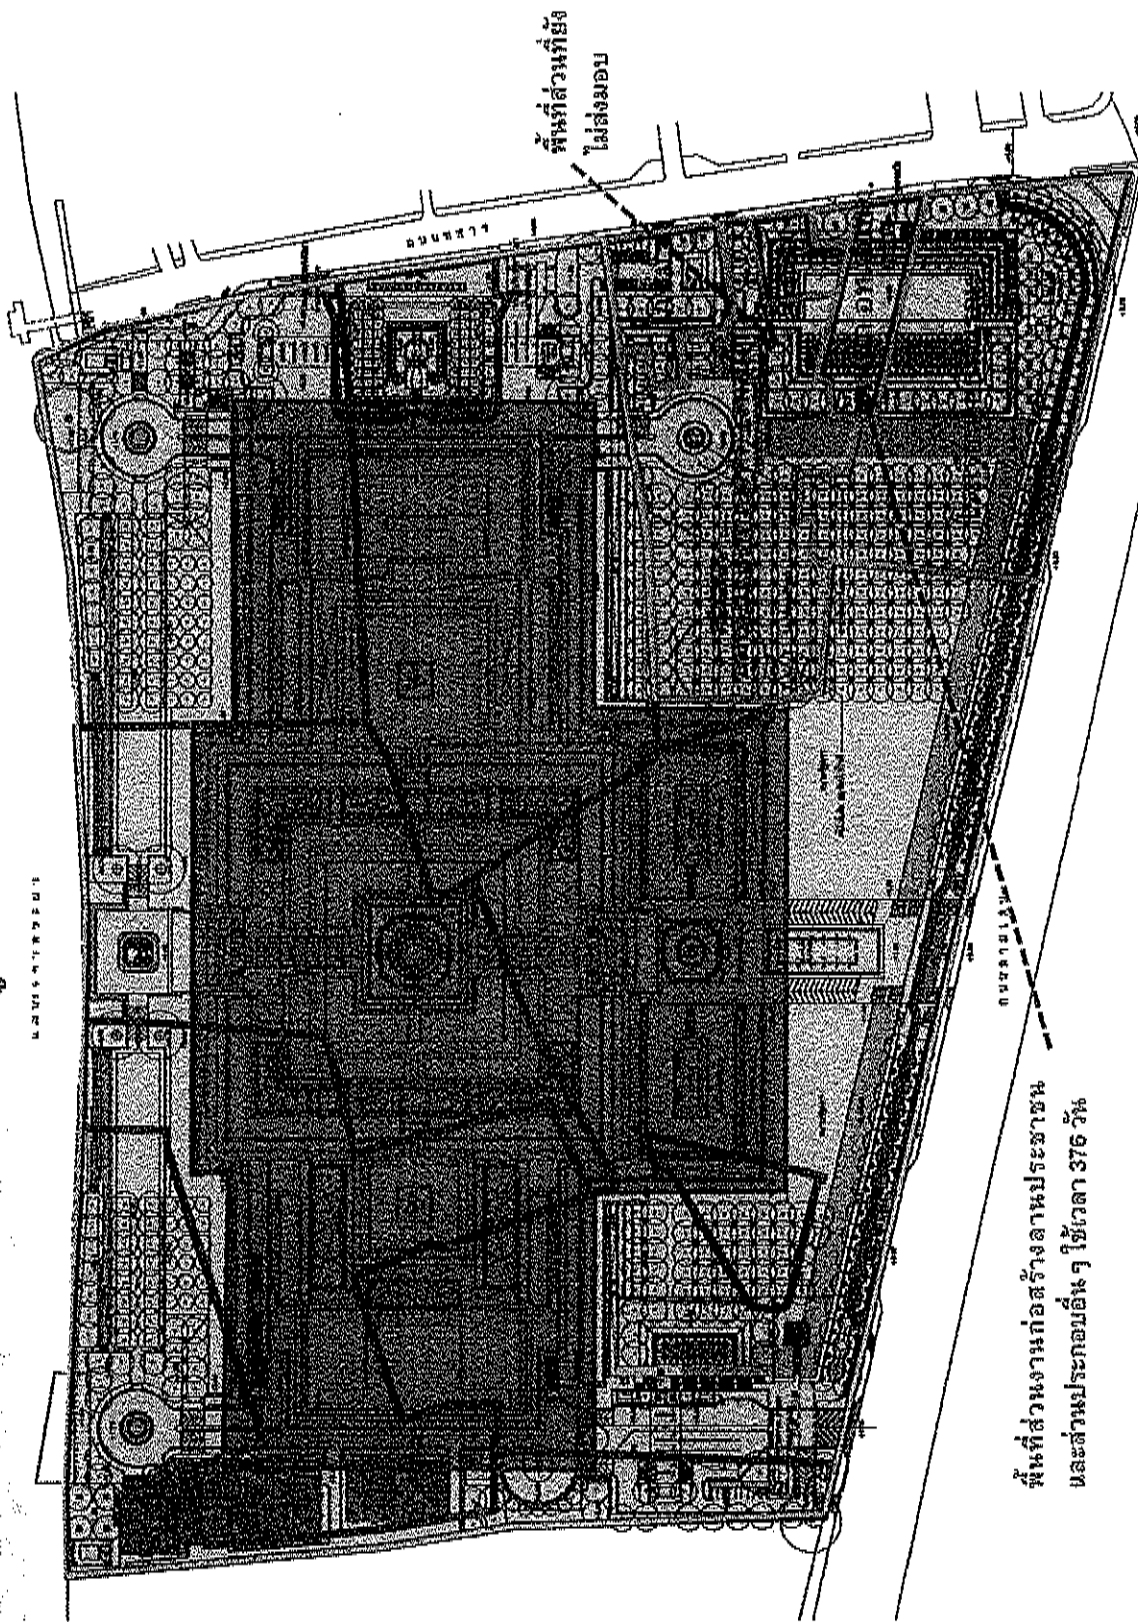

พื้นที่ส่วนงานก่อสร้างด้านประชาชน
และส่วนประกอบอื่นๆ ใช้เวลา 376 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มิ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือไปยัง	กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง
	4.2 ปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ำ	กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลพื้นที่ดังกล่าว	ศึกษาและออกแบบโครงการ
	เข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา	ขอให้เจรจากับเจ้าของบ้านให้ย้ายออกไปจากพื้นที่โดยเร็ว	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ
	บริเวณก่อสร้างเพื่อนริมน้ำเจ้าพระยา		เจ้าพระยาตามนโยบายของ
	เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเชื่อม		กรม. ซึ่งหากโครงการ
	แม่น้ำ		ดังกล่าวสามารถดำเนินการ
			ได้ตามกรอบเวลาเริ่มก่อ
			สร้างในเดือนมกราคม 2559
			บ้านที่รูก่้างดังกล่าวก็จะ
			ต้องได้รับการชดเชยและ
			ออกจากพื้นที่


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘


ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

เปลี่ยนตงงานพนชน B2 เพื่อดำเนินการ ติดตง Bracing Layer 2

(เพื่อคำนวณกำหนดเงินบริเวณชนใต้ดิน)

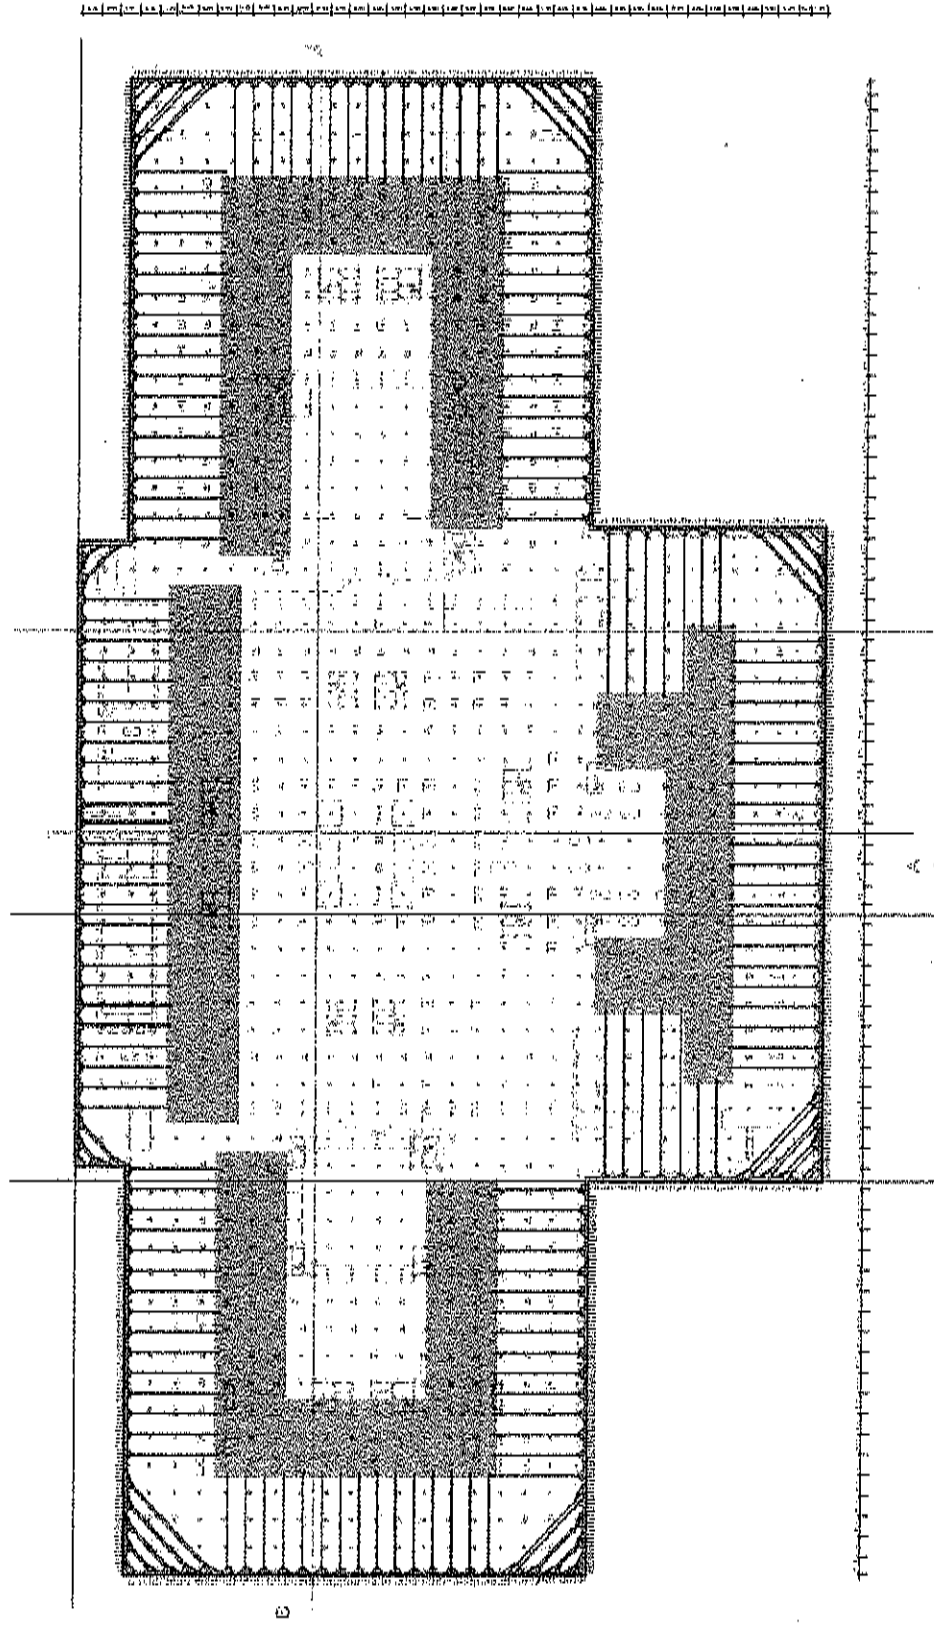

ผังความก้าวหน้างานพื้นที่ดิน ชั้น B2

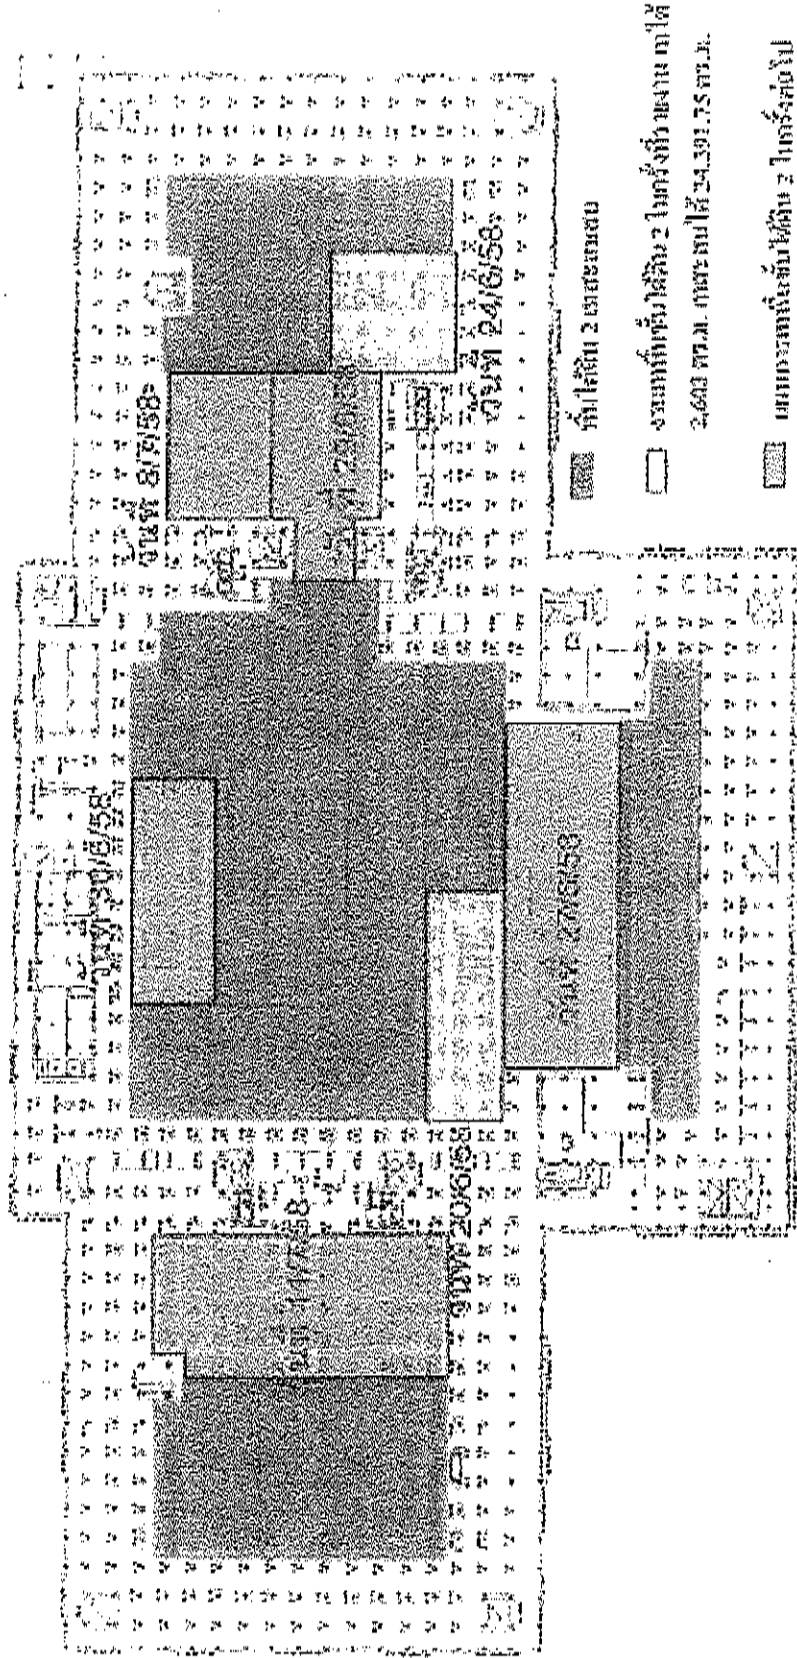


พื้นที่แล้วเสร็จ 24,391 ตร.ม. คงเหลือ 55,609 ตร.ม.

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘




ภาพถ่ายสภาพหน้างาน

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

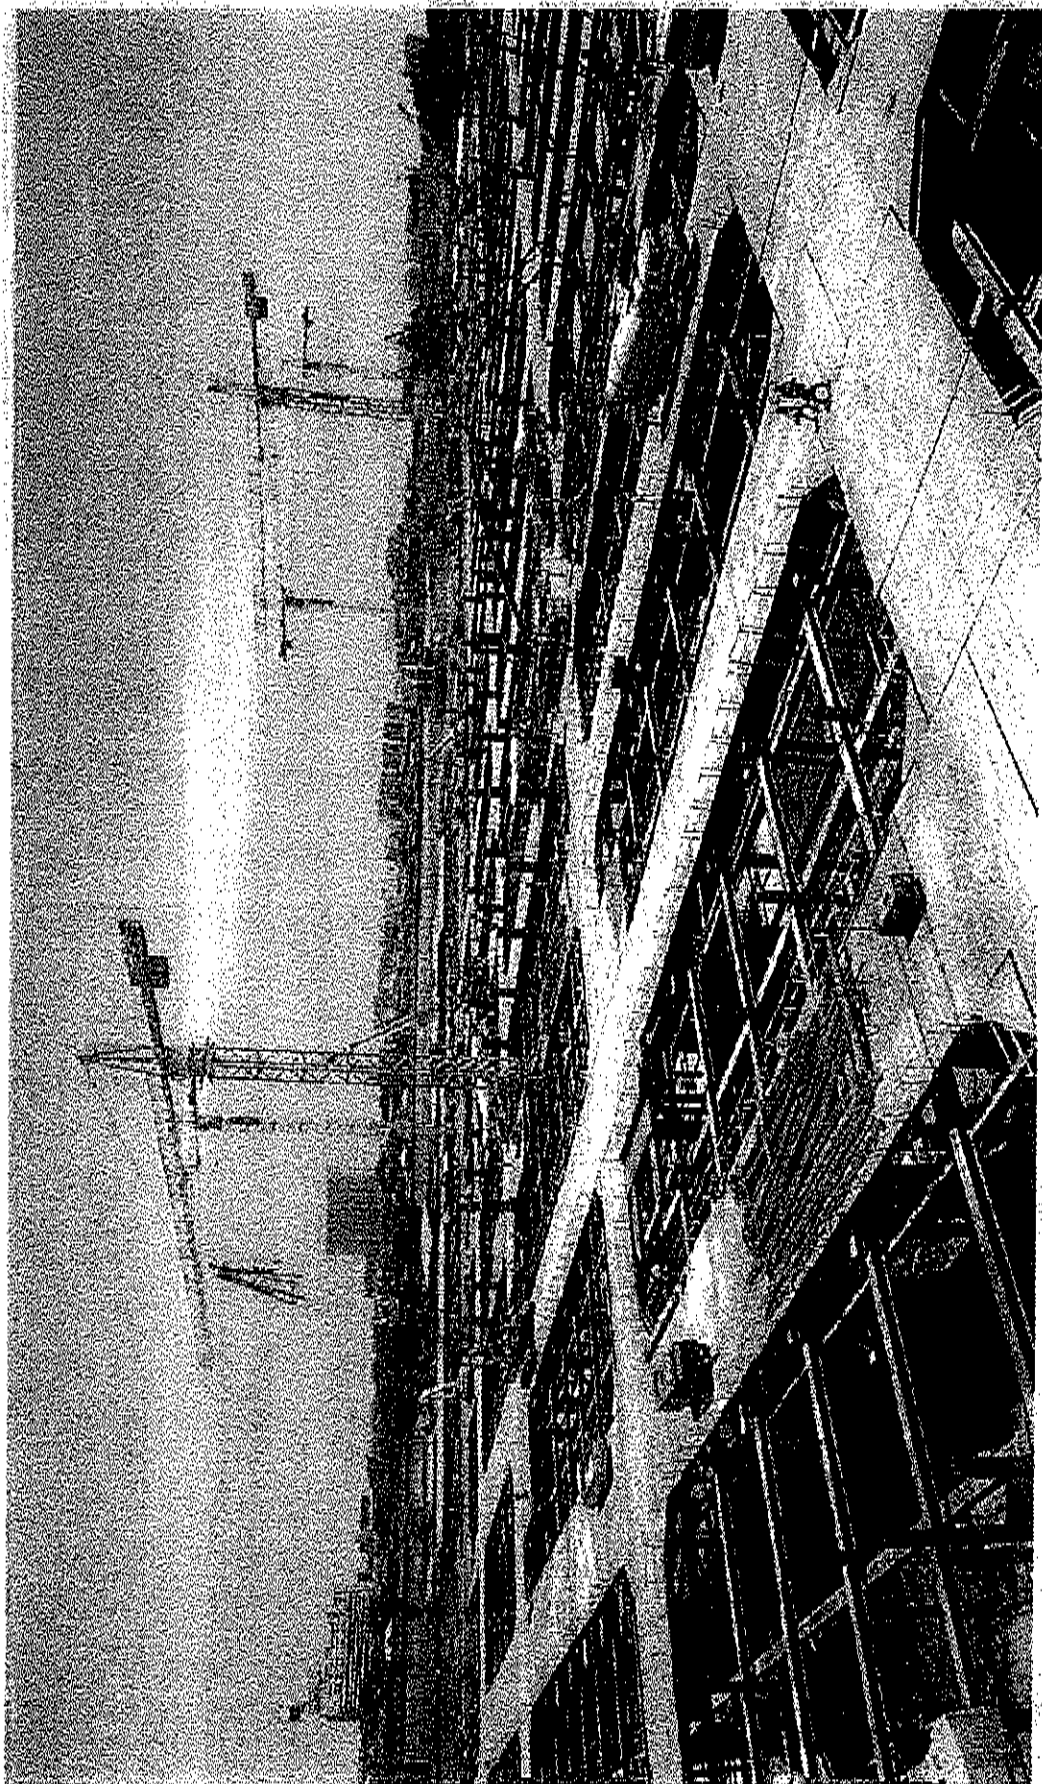

ภาพถ่ายสภาพหน้างาน



คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

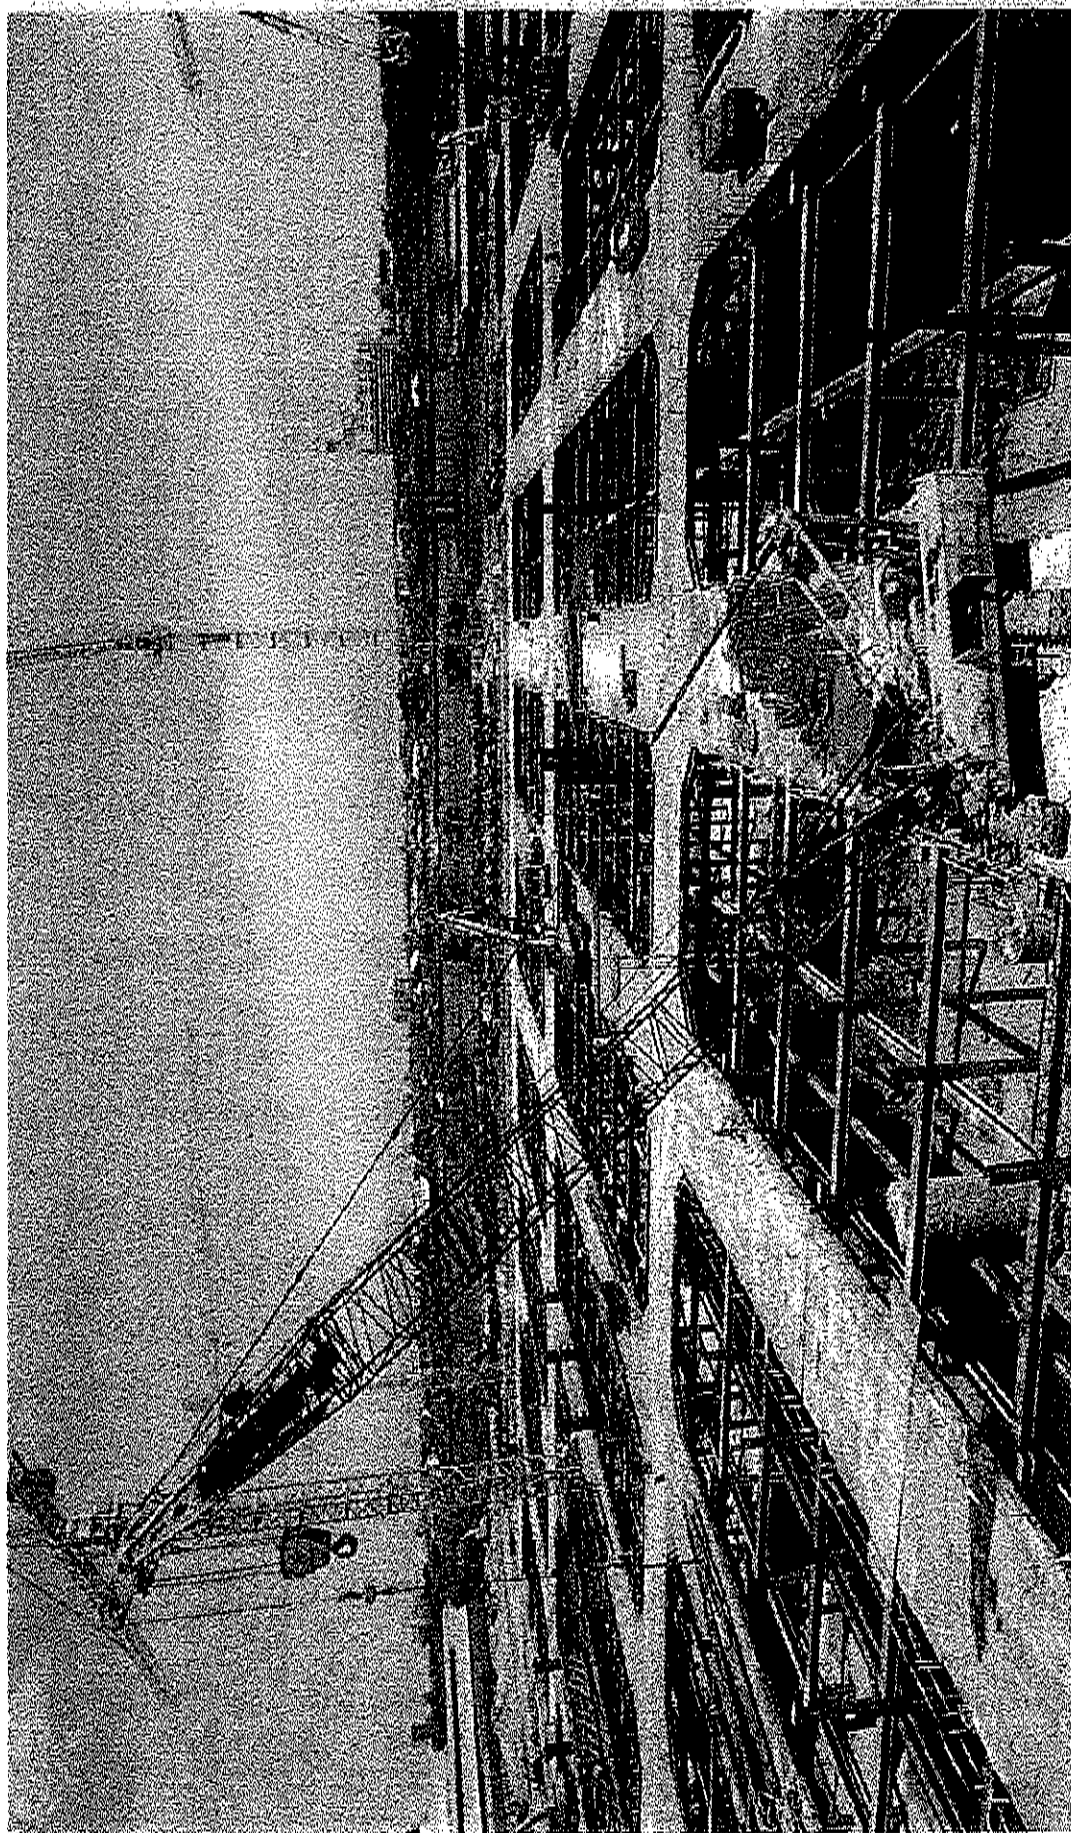

ภาพถ่ายสภาพหน้างาน



คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘


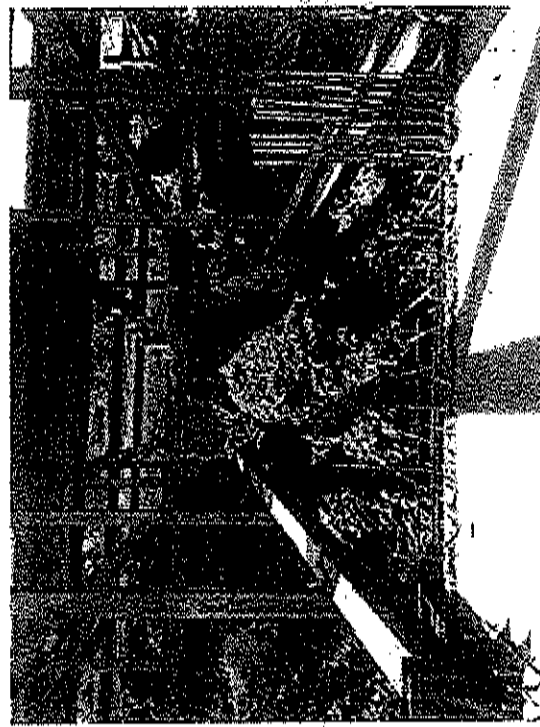
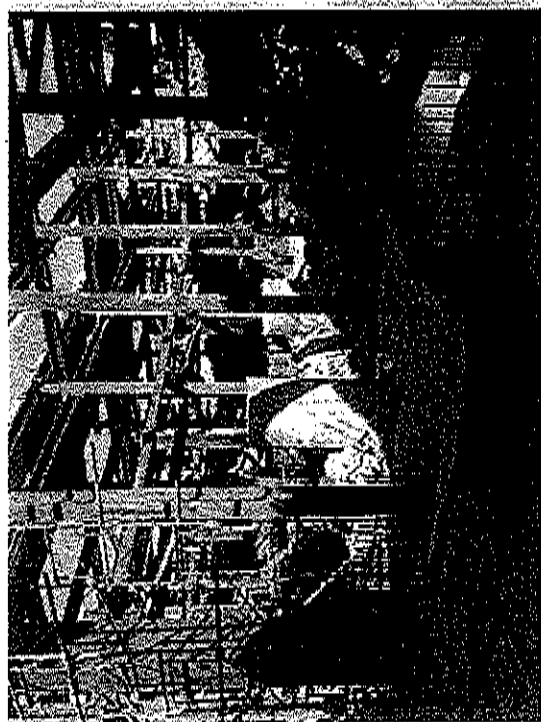


ภาพถ่ายงานฐานราก โครงสร้าง ชั้นใต้ดิน B2

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

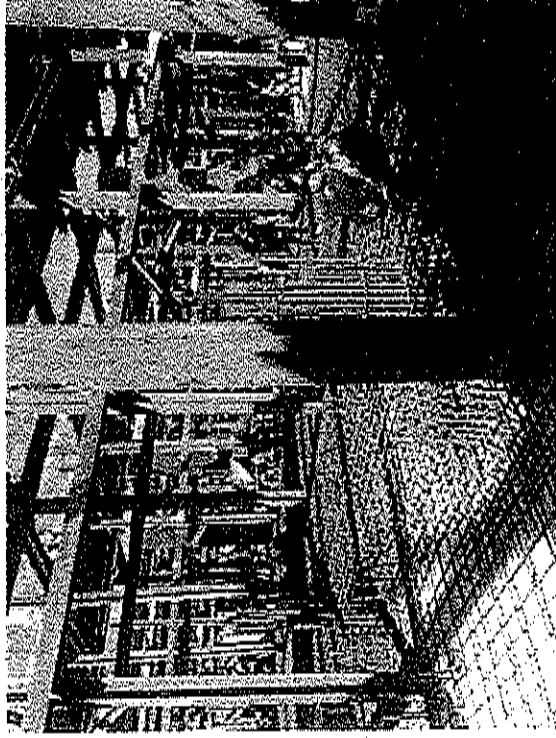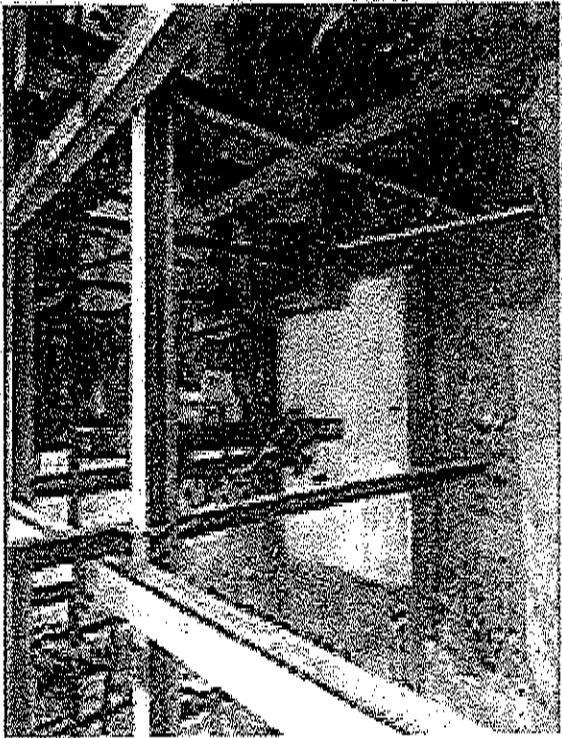

ภาพถ่ายงานฐานราก ชั้นใต้ดิน B2

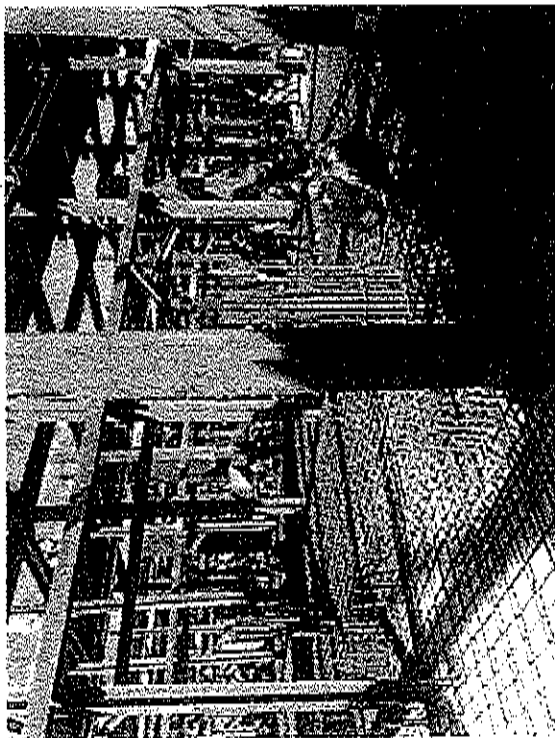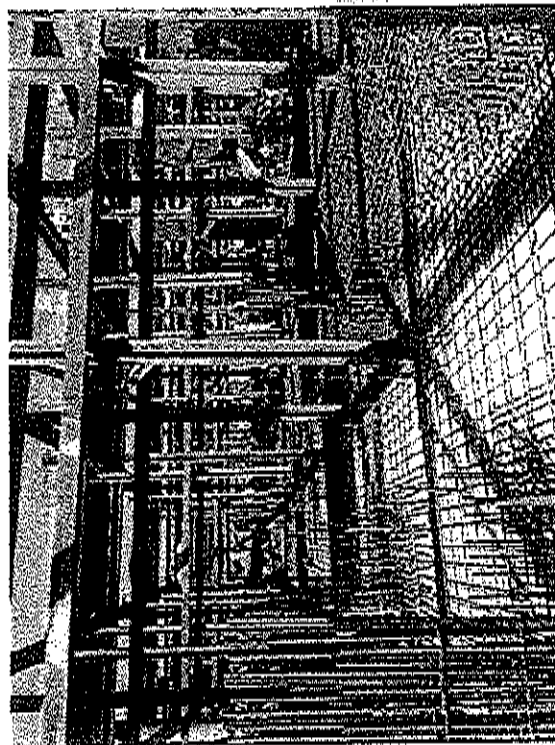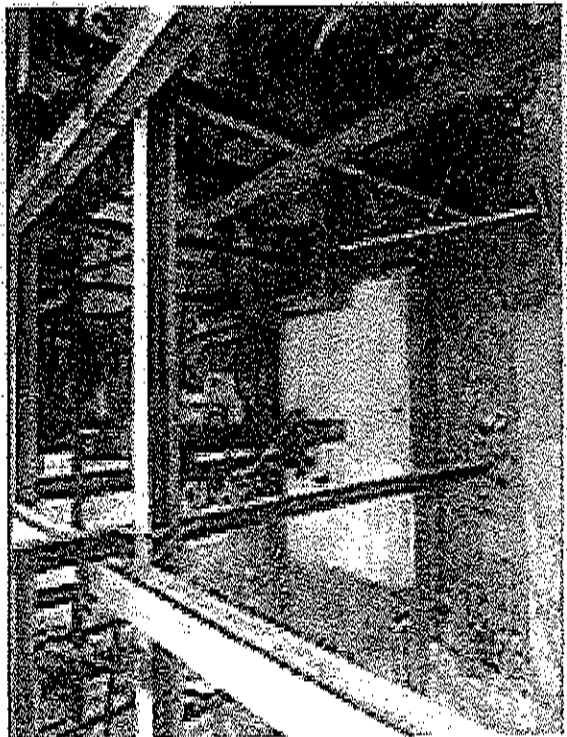

ภาพถ่ายงานฐานราก ชั้นใต้ดิน B2

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
