



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๔๖๔๖
วันที่ 13 ธค ๕๙
เวลา 14-46

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๕
 ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๒๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย)
 ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙)

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ
 ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๓๐๑๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๑๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘) มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- ๕) จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๓๕

เรียน ผอ.สำนัก.ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขาธิการ

๕ ๘ กพ. ๒๕๕๙

- ๒) เรียน อปส.

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอส่งสำเนาหนังสือ สลค.
 ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
 รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่
 ๓๑ ต.ค.๕๘ (ครั้งที่ ๙) มาเพื่อทราบ

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรเวียนแจ้ง
 ให้ทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

สนก.

๑๓ ม.ค.๕๙

(นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)

อปส.

๘ ก.พ. ๒๕๕๙

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี)..... 291

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๕



เลขรับ

กองกลาง

๕๐

๖ ม.ค. ๕๖

๑๕-๕๖

๒๒๓

๖ ม.ค. ๕๖

๑๕-๕๖ น'

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๖

กกค.

๖ ม.ค. ๕๖

พมท.

๖ ม.ค. ๕๖

๖ ม.ค. ๕๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๑๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๒๓๗๙๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙) ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมศรี นาคจำรัสศรี

(นางสมศรี นาคจำรัสศรี)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการปฏิรูปราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th

สำเนาถูกต้อง

สมศรี นาคจำรัสศรี

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ)



ที่ มท ๐๗๑๖/๒๓๓)๕๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๑๔.๘๑ % (ล่าช้ากว่าแผน ๘๒.๔๐%)

๒.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่มี การส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม (โดยส่งมอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐ - ๐ - ๘๐ ไร่)

๒.๓ การขนย้าย...

๒.๓ การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด (จากการคำนวณ) ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้รับจ้างขอใช้ดินในพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินที่ต้องทำการขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ๙๙๗,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันได้ทำการขนย้ายดินตามปริมาณที่คำนวณไว้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ายังเหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก (เพิ่มเติมจากปริมาณที่ได้คำนวณไว้) อีกประมาณ ๓๓,๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไม่ได้ทำการจำหน่าย

๒.๔ ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จำนวน ๑ เล่ม)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิพนธ์ ชัยเชื่อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๕(ตร.๑)๖๔๕๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี

คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่.....

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย)

โดย

กระทรวงมหาดไทย

.....

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ) และนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร่วมกันรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้น คณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเร็วต่อไป

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจพิจารณาแล้ว


ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความเห็นในส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ผลงานสะสมที่ทำได้ ๑๔.๘๑ % (ล่าช้ากว่าแผน ๘๒.๔๐%)
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่มี การส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม (โดยส่งมอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐ - ๐ - ๘๐ ไร่)
๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด (จากการคำนวณ) ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้รับจ้างขอใช้ดินในพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินที่ต้องทำการขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ๙๙๗,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันได้ทำการขนย้ายดินตามปริมาณที่คำนวณไว้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ายังเหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก (เพิ่มเติมจากปริมาณที่ได้คำนวณไว้) อีกประมาณ ๓๓,๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไม่ได้ทำการจำหน่าย

๔. ปัญหาอุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข
(สิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ เล่ม)

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สารบัญ

	หน้า
• สารบัญ	ก
• บทสรุปผู้บริหาร	ข
• สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๑
• ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง	๑๕

บทสรุปผู้บริหาร

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผู้รับจ้างครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ นับวันเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ด้วยการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ประกอบกับปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และไม่มีที่พักดิน จึงทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราว และงานขุดดิน งานก่อสร้างรากฐาน และงานต่อเนื่องส่วนอื่นๆ
- ตามสัญญาก่อสร้าง กำหนดแบ่งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่โดยประมาณ ๑๒๓ ไร่) ออกเป็น ๔ ครั้ง โดยกำหนดส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ในความเป็นจริงได้มีการแบ่งการส่งมอบพื้นที่ออกเป็นครั้งย่อยๆ และล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะในขอบเขตการก่อสร้างอาคารหลักครบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้อีกประมาณ ๒๐ ไร่
- ปริมาณดินที่ต้องขุดเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด(จากการคำนวณ) ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลบ.ม. โดยตามสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดและขนย้ายดินไปยังพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ ซึ่งในช่วงแรกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการบริจาคดินให้กับวัดและหน่วยงานราชการควบคู่ไปกับการขายทอดตลาด แต่ต่อมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ที่ กค๐๓๑๔/๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระงับการบริจาคดินทั้งหมดและให้ดำเนินการขายทอดตลาดเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การระบายดินออกจากพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ปัจจุบันได้ทำการขนย้ายดินตามปริมาณที่คำนวณไว้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ยังเหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก (เพิ่มเติมจากปริมาณที่ได้คำนวณไว้) ประมาณ ๓๓,๓๒๑ ลบ.ม. ซึ่งยังไม่ได้ทำการจำหน่าย
- สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน งานระบบป้องกันดินพังและขุดดินขนย้ายดิน และงานฐานรากอาคาร ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนงานทั้งโครงการ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๑๔.๘๑ % (ล่าช้ากว่าแผนงาน - ๘๒.๔๐ %)

บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ)

- ตามที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จากสาเหตุผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ออกไปจำนวน ๔๗๙ วัน เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาประเด็นการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจากเอกสารคำร้องของผู้รับจ้าง จำนวน ๒๕ ฉบับ รวมถึงข้อเท็จจริงจากที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างและที่ปรึกษาบริหารโครงการ และมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๒๘๗ วัน
- ประเด็นปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งได้รับแจ้งในที่ประชุมว่ากรุงเทพมหานครจะส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนโยธินบูรณะจะส่งมอบพื้นที่ได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พิจารณาแล้วมีมติว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม ไม่กระทบกับการก่อสร้างอาคารหลัก โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการส่งมอบพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 14.81 %	มีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างขั้นได้แก่
		ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 97.21 %	- งานขุดและชนดิน (เพิ่มขึ้น 10,193 ลบ.ม.)
		ล่าช้ากว่าแผน 82.40 %	- งานฐานรากอาคารหลัก แล้วเสร็จ 755 ฐาน จาก 888 ฐาน (เพิ่มขึ้น 30 ฐาน)
		<u>หมายเหตุ</u> ผลงานสะสมเมื่อ 30 ก.ย. 2558 ทำได้ 14.46 %	- งานพื้นชั้น B2 แล้วเสร็จ 52,953 ตร.ม. จาก 80,000 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 0 ตร.ม.)
			- งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B2 แล้วเสร็จ 600 ต้น จาก 742 ต้น (เพิ่มขึ้น 14 ต้น)
			- งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B1 แล้วเสร็จ 251 ต้น จาก 800 ต้น (เพิ่มขึ้น 45 ต้น)
			- งานติดตั้งเสา ชั้น G-2 แล้วเสร็จ 172 ต้น จาก 778 ต้น (เพิ่มขึ้น 104 ต้น)
			- งานติดตั้ง Bracing Layer 2 แล้วเสร็จ 9,080 ม. จาก 9,278 ม. (เพิ่มขึ้น 0 ม.)

คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 $\frac{7}{10}$ ไร่)	ยังไม่มีมีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม	ส่งมอบแล้ว 102 - 3 - 76 ไร่ (คิดเป็น 83.5%)
			ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด
			โดยส่งมอบครึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57
			เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 20 - 0 - 80 ไร่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
3	การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ปริมาณดินทั้งหมดจากการคำนวณ 1,032,818 ลบ.ม. - ผู้รับจ้างขอใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 35,000 ลบ.ม. - เหลือดินที่ต้องทำการขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 997,818 ลบ.ม.	- ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ 997,818 ลบ.ม.	จากการตรวจสอบพบว่ายังมีปริมาณดินส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ขุดและขนย้ายออกอีกประมาณ 33,321 ลบ.ม. (เพิ่มเติมจากปริมาณดินที่คำนวณไว้)

ข้อมูลการขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

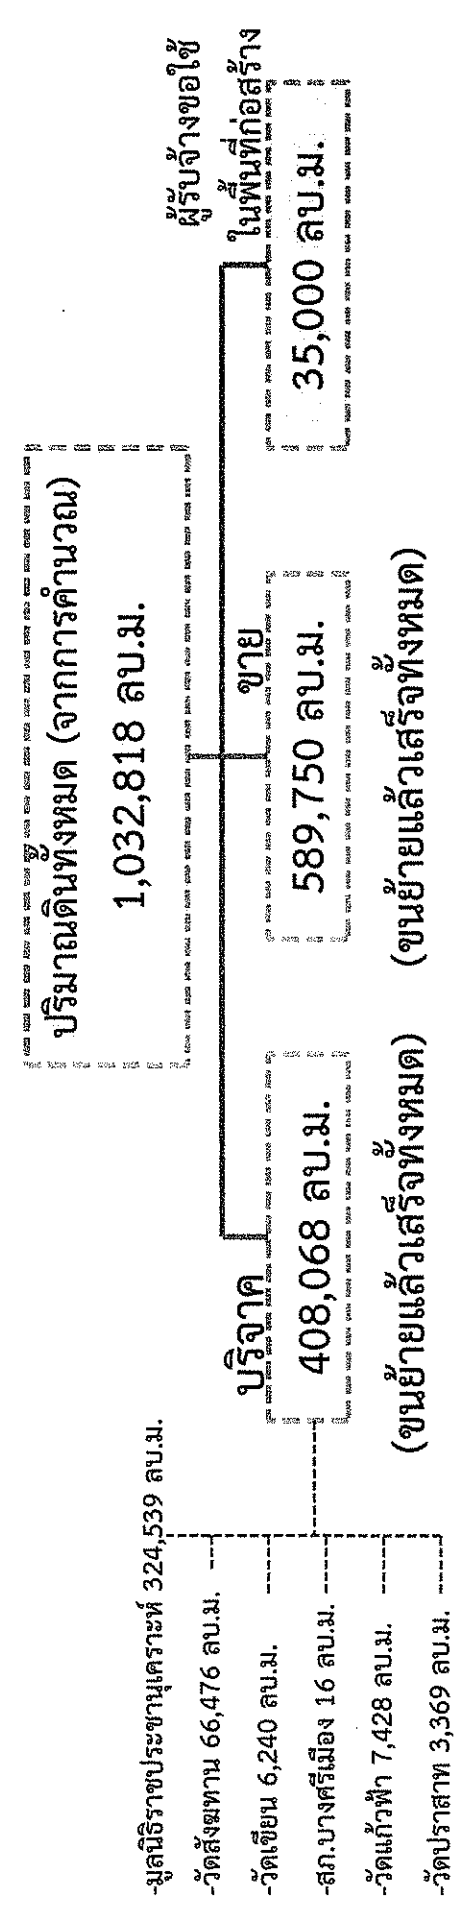

หมายเหตุ จากการตรวจสอบพบว่ายังมีปริมาณดินส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ขุดและขนย้ายออกอีกประมาณ 33,321 ลบ.ม. (เพิ่มเติมจากปริมาณดินที่คำนวณไว้) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาจำหน่ายต่อไป

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค	4.1 ได้มีการเร่งรัดติดตามพื้นที่จากหน่วยงานเดิม ดังนี้	
	4.1 ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือ	4.1.1 พื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่งคืนพื้นที่พร้อมอาคารให้กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
	ยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง	เป็นพื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) 4 ชุม จำนวน 1 อาคาร	- กรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
	กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน ลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น		- ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างดำเนินการขายซากเพื่อรื้อถอนอาคาร คาดว่าจะได้ผู้ซื้อซาก และเริ่มรื้อถอนอาคารได้เดือนพฤศจิกายน 2558
	ก่อสร้างงานส่วนดังกล่าวเป็นเวลา 376 วัน		

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		
		4.1.2 พื้นที่ของ กทม. เป็นพื้นที่ห้องสมุดและศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้องทำการรื้อถอนอาคารเดิมออกก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	- กรุงเทพมหานครได้รับย้ายอุปกรณ์สงนง. เครื่องมือทางการแพทย์ ออกจากพื้นที่ทั้ง 2 หน่วยแล้ว ในเดือนเมษายน 2558 - กรม.มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าชดเชยให้กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 142,000,000 บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 - กรุงเทพมหานครได้รับค่าชดเชยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 - กรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภาได้ภายในเดือนธันวาคม 2558

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.1.3 พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักแห่งใหม่ให้กับ ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน 79 ครอบครัว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ การก่อสร้าง	- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างวันที่ 1 พ.ค. 55 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 56 โดยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 56 สิ้นสุดวันที่ 26 พ.ค. 57 - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 1 จากมติครม. ช่วยเหลือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท ออกไป 150 วัน สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค. 57 - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากอุปสรรคการส่งมอบพื้นที่ที่ไม่สามารถทำงานได้ (งานเฟส3) ออกไป 270 วัน สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 58

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		(ต่อ) - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 3 จากอุปสรรคการส่งมอบพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้ (งานเฟส4) ออกไป 177 วัน สิ้นสุดวันที่ 13 ม.ค. 59 - ปัจจุบัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้าง - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้อาศัยเข้าพักใหม่ โดยประสานกรมธนารักษ์เกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดการเข้าพัก และปรับปรุงแปลต ขส.ทบ.เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้สิทธิในที่อยู่ จำนวน 19 ครอบครัว เข้าพักตามระเบียบข้อกำหนดกรมธนารักษ์ต่อไป

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558


ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.1.4 พื้นที่ของ สภฐ. เป็นพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งก่อสร้างที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ	- สภฐ.ได้รับค่าชดเชย ค่าร้อยละย่ายและก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ลง 15 ส.ค. 51 จำนวน 1,000,000,000 บาท -รัฐสภาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 105,654,700 บาท ตามที่โรงเรียนโยธินบูรณะเสนอและกรมอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 -รัฐสภา ร่วมกับ สภฐ. แก้ไขบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ฉบับที่ 15 ส.ค.51 ในส่วนของโรงเรียนโยธินบูรณะข้อ 2.4 และมีข้อตกลงร่วมกันใหม่เมื่อวันที่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		(ต่อ)
			9 ก.พ.58 ซึ่งโรงเรียนจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับ
			รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม 2558
			-สพฐ. โดยโรงเรียนโยธินบูรณะ ลงนามสัญญา
			จ้างเพิ่มเติม (งบประมาณ 105,654,700 บาท)
			กับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58
			โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน สิ้นสุด
			วันที่ 20 ม.ค. 59
			-ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้าง
			โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งโรงเรียนโยธินบูรณะแจ้งว่า
			จะส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับรัฐสภา
			ได้ภายในเดือนเมษายน 2559

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ผังแสดงพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ส่งมอบให้ผู้อื่น

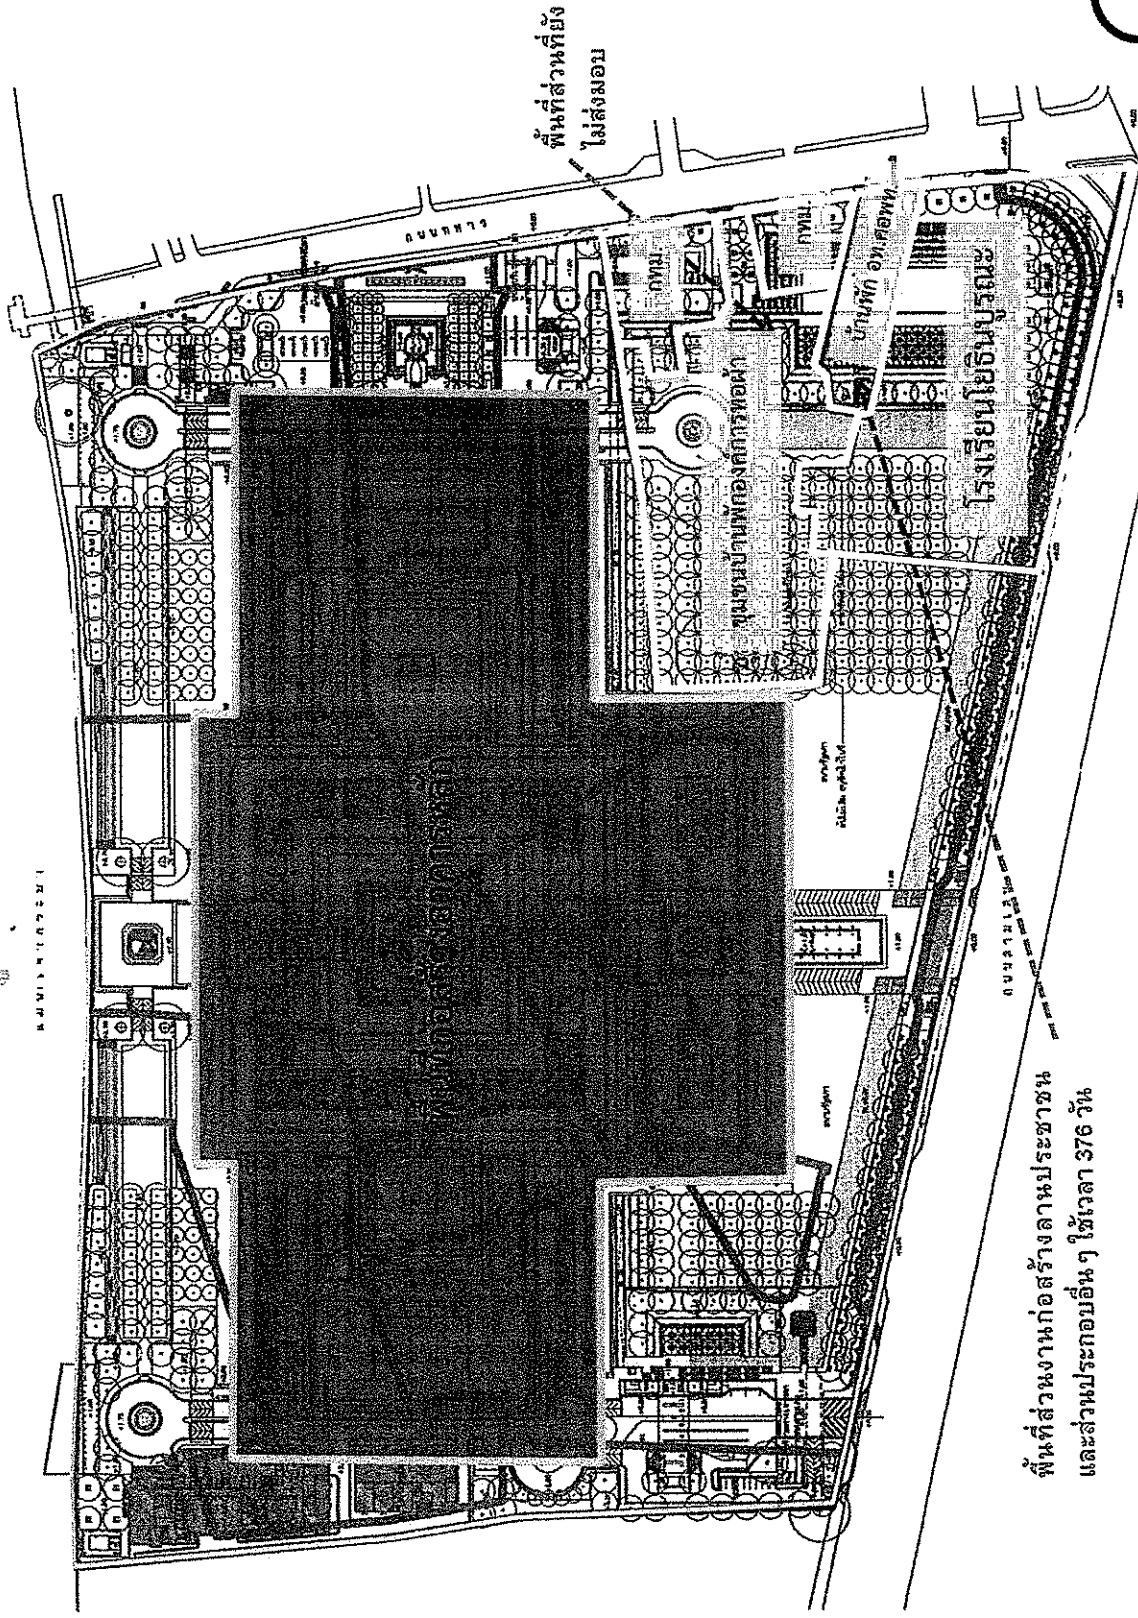

พื้นที่ส่วนงานก่อสร้างลานประชาชน
และส่วนประกอบอื่นๆ ใช้เวลา 376 วัน

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว จำนวน ๑๐๓-๓-๗๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕

คณะกรรมการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้	กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง
	4.2 ปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ำ	เข้าเจรจากับชาวบ้านให้ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทน	ศึกษาและออกแบบโครงการ
	เข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา	ของชาวบ้านว่ายินดีย้ายออกแต่ขอให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ
	บริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา	ในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือค่าชดเชย	เจ้าพระยาตามนโยบายของ
	เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริม	4.2.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือไปยัง	กรม. ซึ่งหากโครงการ
	แม่น้ำ	สำนักงานเขตดุสิต ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อขอความ	ดังกล่าวสามารถดำเนินการ
		อนุเคราะห์ให้เจรจากับผู้รุกล้ำให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งผู้อำนวยการ	ได้ตามกรอบเวลาเริ่มก่อ
		การสำนักงานเขตดุสิตแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเจรจาและดำเนินการทาง	สร้างในเดือนมกราคม 2559
		กฎหมาย	บ้านที่รุกล้ำดังกล่าวก็จะ
			ต้องได้รับการชดเชยและ
			ออกจากพื้นที่

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ต.ค. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.3.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการได้ส่งการให้ผู้ควบคุมงานประสานกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการขุดและขนย้ายไปกองเก็บในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ติดกับบริษัท บุญรอดฯ	
	มากกว่าปริมาณจากการคำนวณ	4.3.2 ที่ปรึกษาบริหารโครงการได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เร่งรัดการจำหน่ายดินให้กับผู้รับซื้อดินโดยเร็ว หรือพิจารณาสั่งการให้ผู้รับจ้างขนย้ายดินไปพักในที่ดินราชพัสดุ บริเวณคลองสาน อยู่ในระยะทางรัศมี 10 กม. ซึ่งกรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว	

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

คณะกรรมการด้านความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผังความก้าวหน้างานพื้นที่ดิน ชั้น B2






ข้อมูลประกอบ : ขนถ่ายดินจากพื้นที่ดินชั้น B2

พื้นที่ดิน 52,953 ตร.ม. คงเหลือ 27,047 ตร.ม.

คณะกรรมการโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

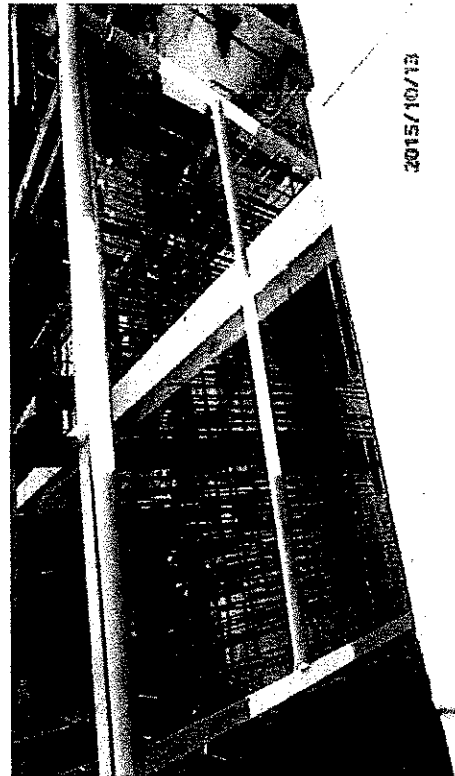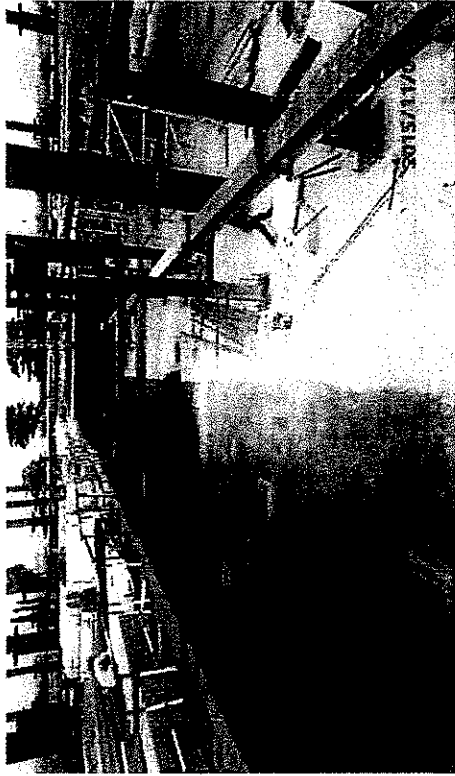



KEY PLAN

งานก่อสร้างส่วนชั้นใต้ดิน

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘


ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

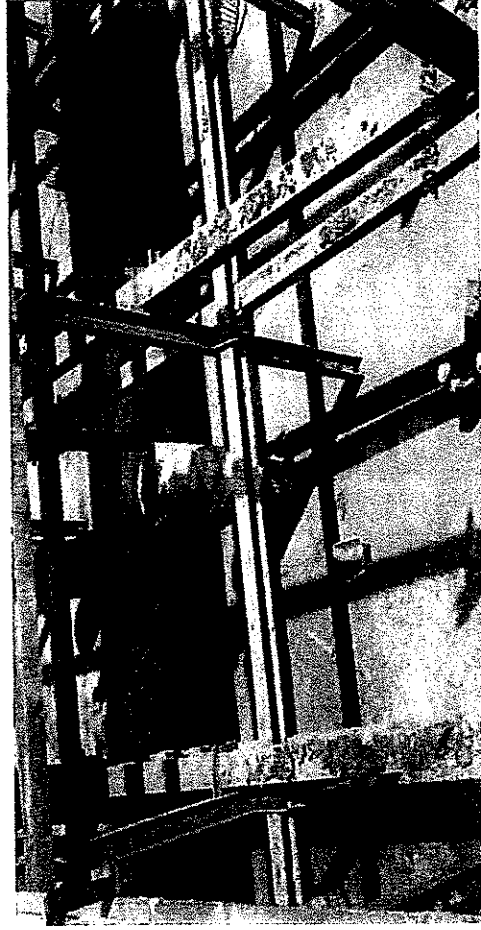

งานจัดทำพื้นที่ B2 และติดตั้งค้ำยันผนังกันดินชั่วคราว

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

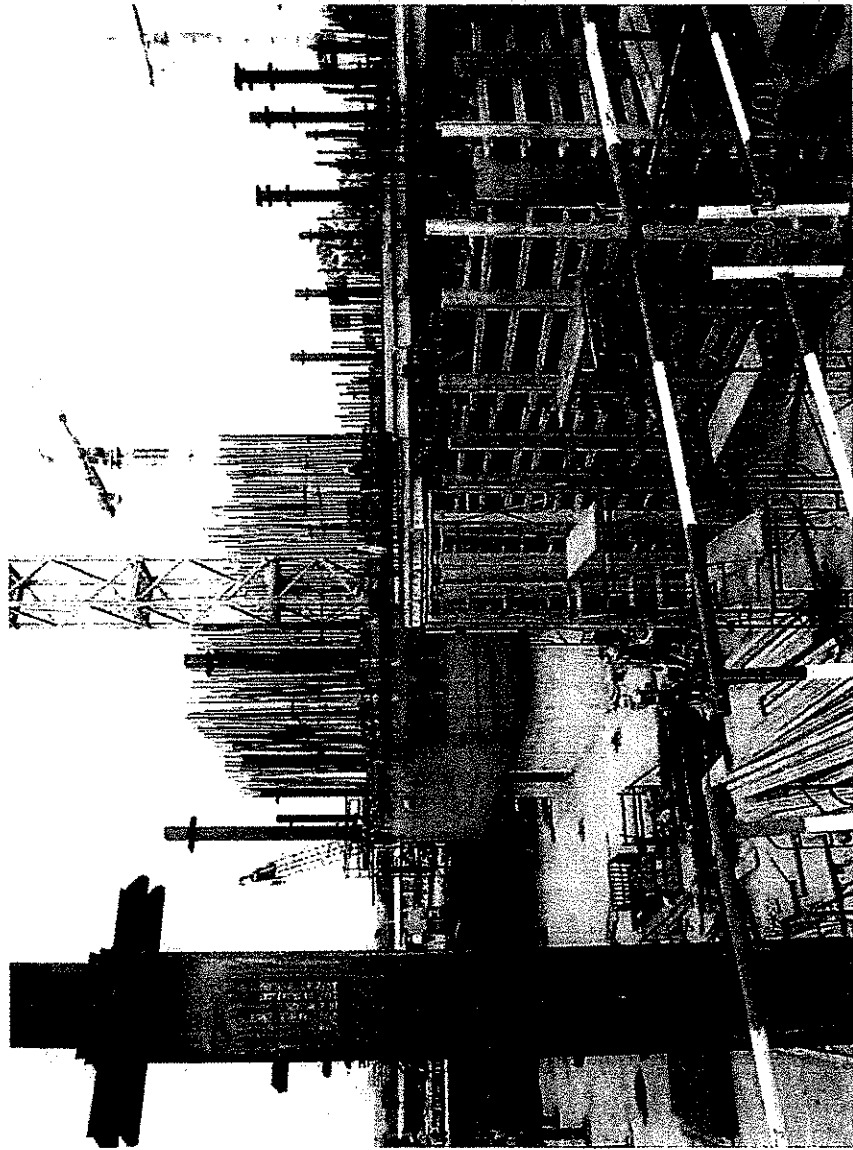

งานพื้นฐาน B1

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง





งานติดตั้งเสาเหล็กรับน้ำหนัก G-1

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

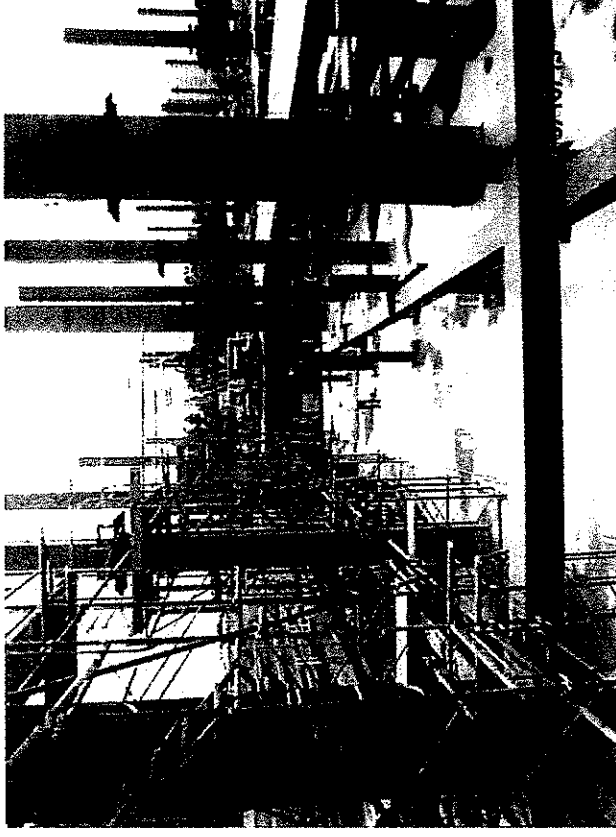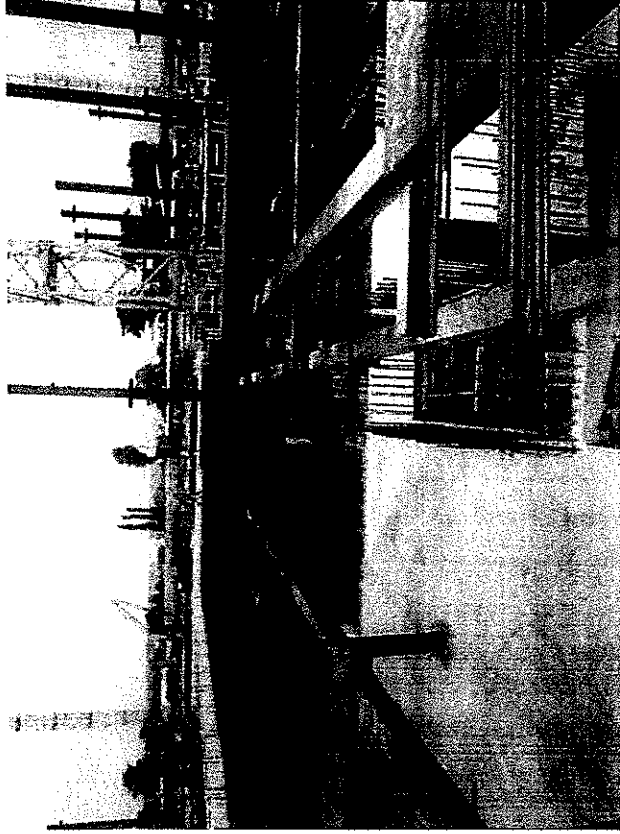

งานเตรียมแบบโครงสร้างพื้น ชั้น B1

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
