



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๖๑๐๑
วันที่ ๑๐/๑/๖๐
เวลา ๑๔.๓๑

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๓

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๔๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒)

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๒๒๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๕๖๖๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๘๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ๔) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๓๗

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขาธิการกรม

(นายสมพาศ นิสพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ๕) เรียน อปส.

สพ. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ให้ กปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)

สพ.

๒๐ ม.ค. ๖๐

- ๖) เรียน กองให้ ทราบ ด่วนที่สุด

(นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐

ew



ที่ มท ๐๗๑๖/ ๐๐๐ ๒๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๒๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๒๐๙๗๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๕.๑๐ % (ผลงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทำได้ ๒๖.๗๗ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ยังไม่
สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก
ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

๒.๒.๒ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบ
ระบบ ICT มากกว่า ๖ เดือน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บ.ซีโน-ไทยฯ)
ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบ
โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๒.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๕)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา สมประสงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑) ๒๕๕๙/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่องี่.....

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
โดย
กระทรวงมหาดไทย

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องี่เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ) และนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร่วมกันรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจพิจารณาแล้ว

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความเห็นในส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒) ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๘.๑๐ % (ผลงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทำได้ ๒๖.๗๗ %)

๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด ให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


๒. ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๑ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๕๒๑ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

๒.๒ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๒ เดือน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บ.ซีโน-ไทยฯ) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป

๒.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

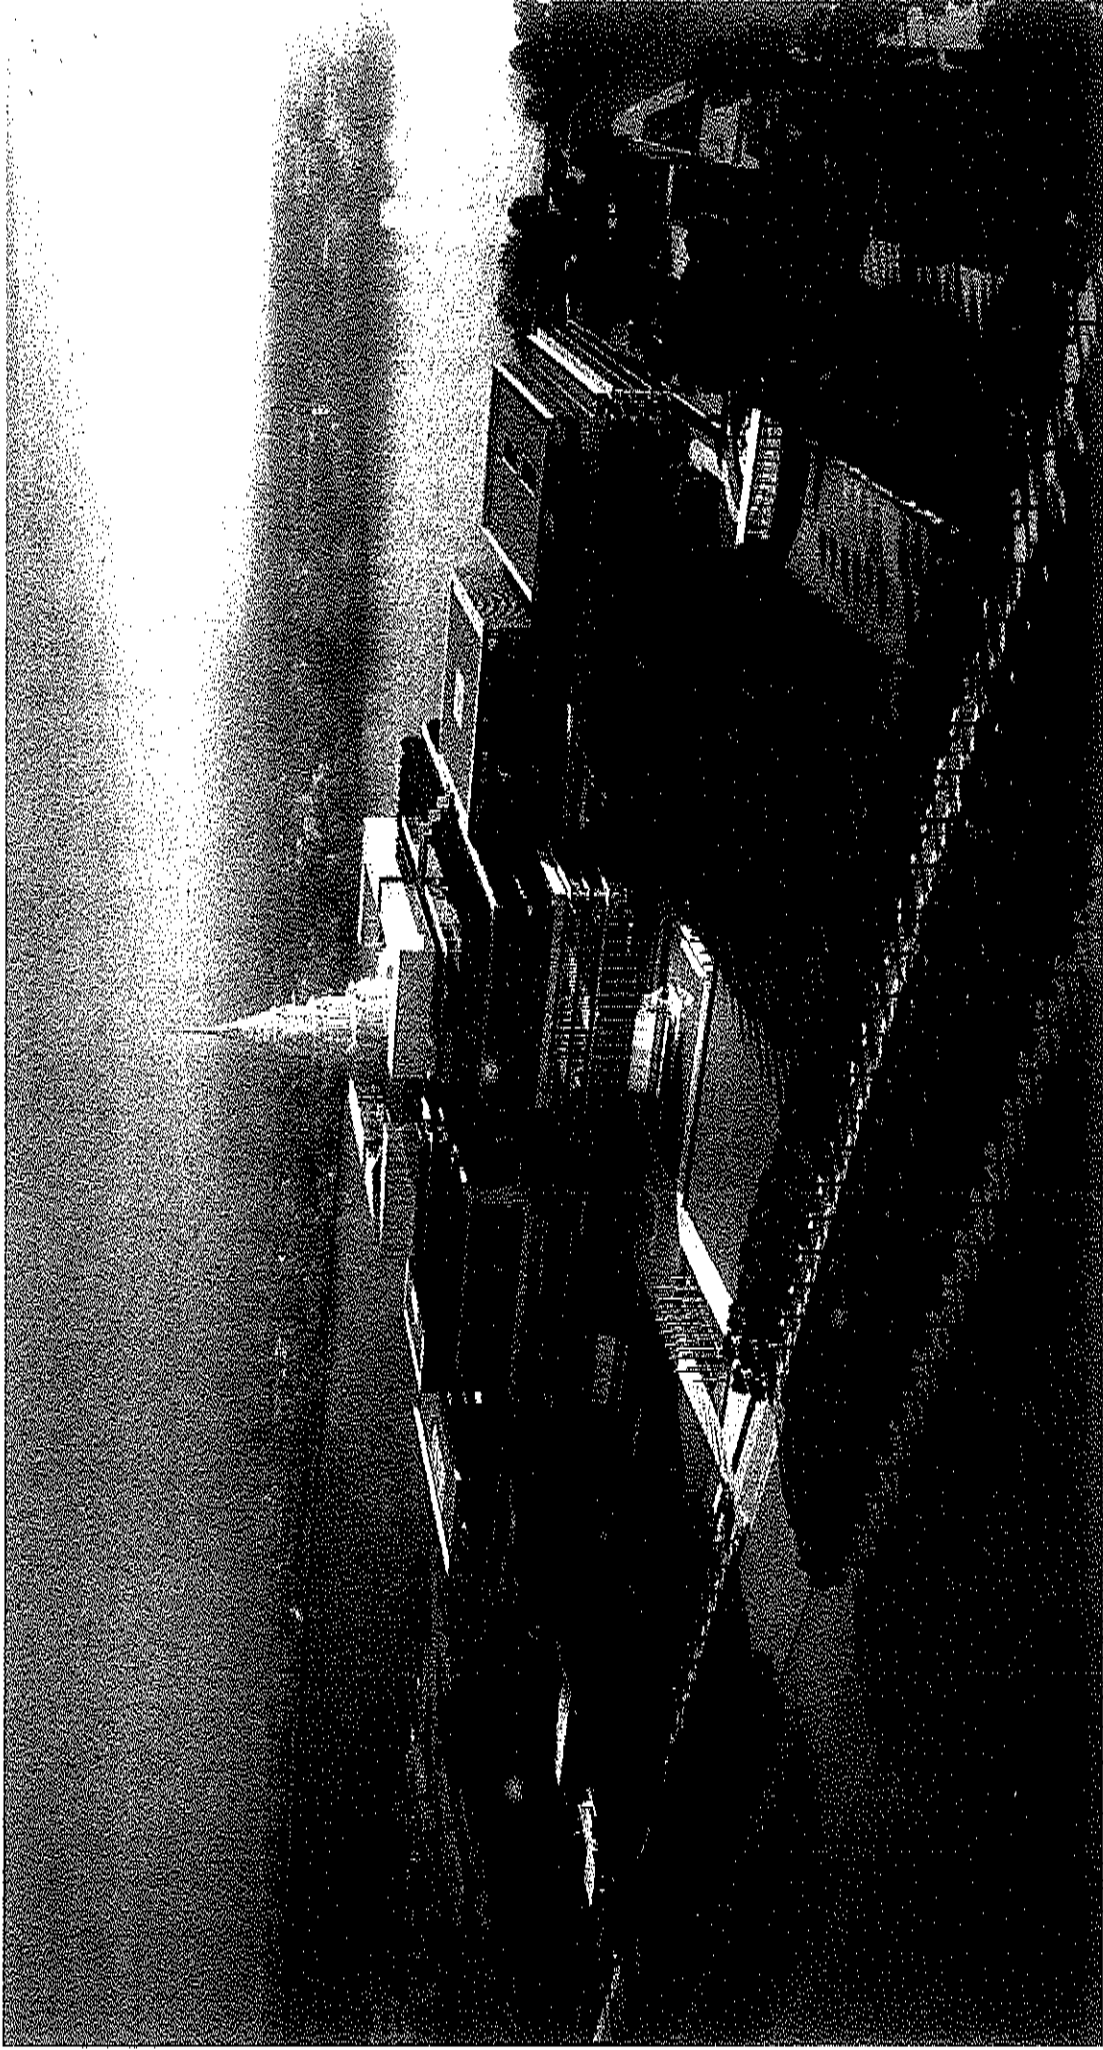

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สารบัญ

หน้า

- สารบัญ ก
- บทสรุปผู้บริหาร ข
- สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ๑
- ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ๘

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บทสรุปผู้บริหาร

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผู้รับจ้างครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ นับวันเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ด้วยการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ประกอบกับปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และไม่มีที่พักดิน จึงทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราวและงานขุดดิน งานก่อสร้างรากฐาน และงานต่อเนื่องส่วนอื่นๆ
- ตามสัญญาก่อสร้าง กำหนดแบ่งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่โดยประมาณ ๑๒๓ ไร่) ออกเป็น ๕ ครั้ง โดยกำหนดส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ในความเป็นจริงได้มีการแบ่งการส่งมอบพื้นที่ออกเป็นครั้งย่อยๆ และล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้กับผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อเทียบกับแผนงานทั้งโครงการ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒๘.๑๐ %
- ผู้รับจ้างได้มีการขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วจำนวน ๒ ครั้ง
 - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓๘๗ วัน จากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและปัญหาเรื่องดินจากเสาเข็มเจาะ ไปสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
 - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔๒๑ วัน จากสาเหตุปัญหาเรื่องการขนย้ายดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ไปสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ)

- คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีความเห็นดังนี้
 ๑. การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๕๒๑ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา
 ๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๖ เดือน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก(บ.ซิโน-ไทยฯ) ดังนั้นคณะทำงานฯจึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ทั้งนี้คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้เคยมีหนังสือ ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ/ ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	<p>ผลงานที่ทำได้ 28.10 %</p> <p>หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 31 ต.ค.59 ทำได้ 26.77 %</p> <p>2. สนน.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59</p> <p>3. สนน.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหาเรื่องดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ออกไปจำนวน 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 ก.พ. 61</p>	<p>การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ออกไปจำนวน 421 วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา</p>

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)	ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว	ส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 12 - 0 - 42.7 ไร่

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

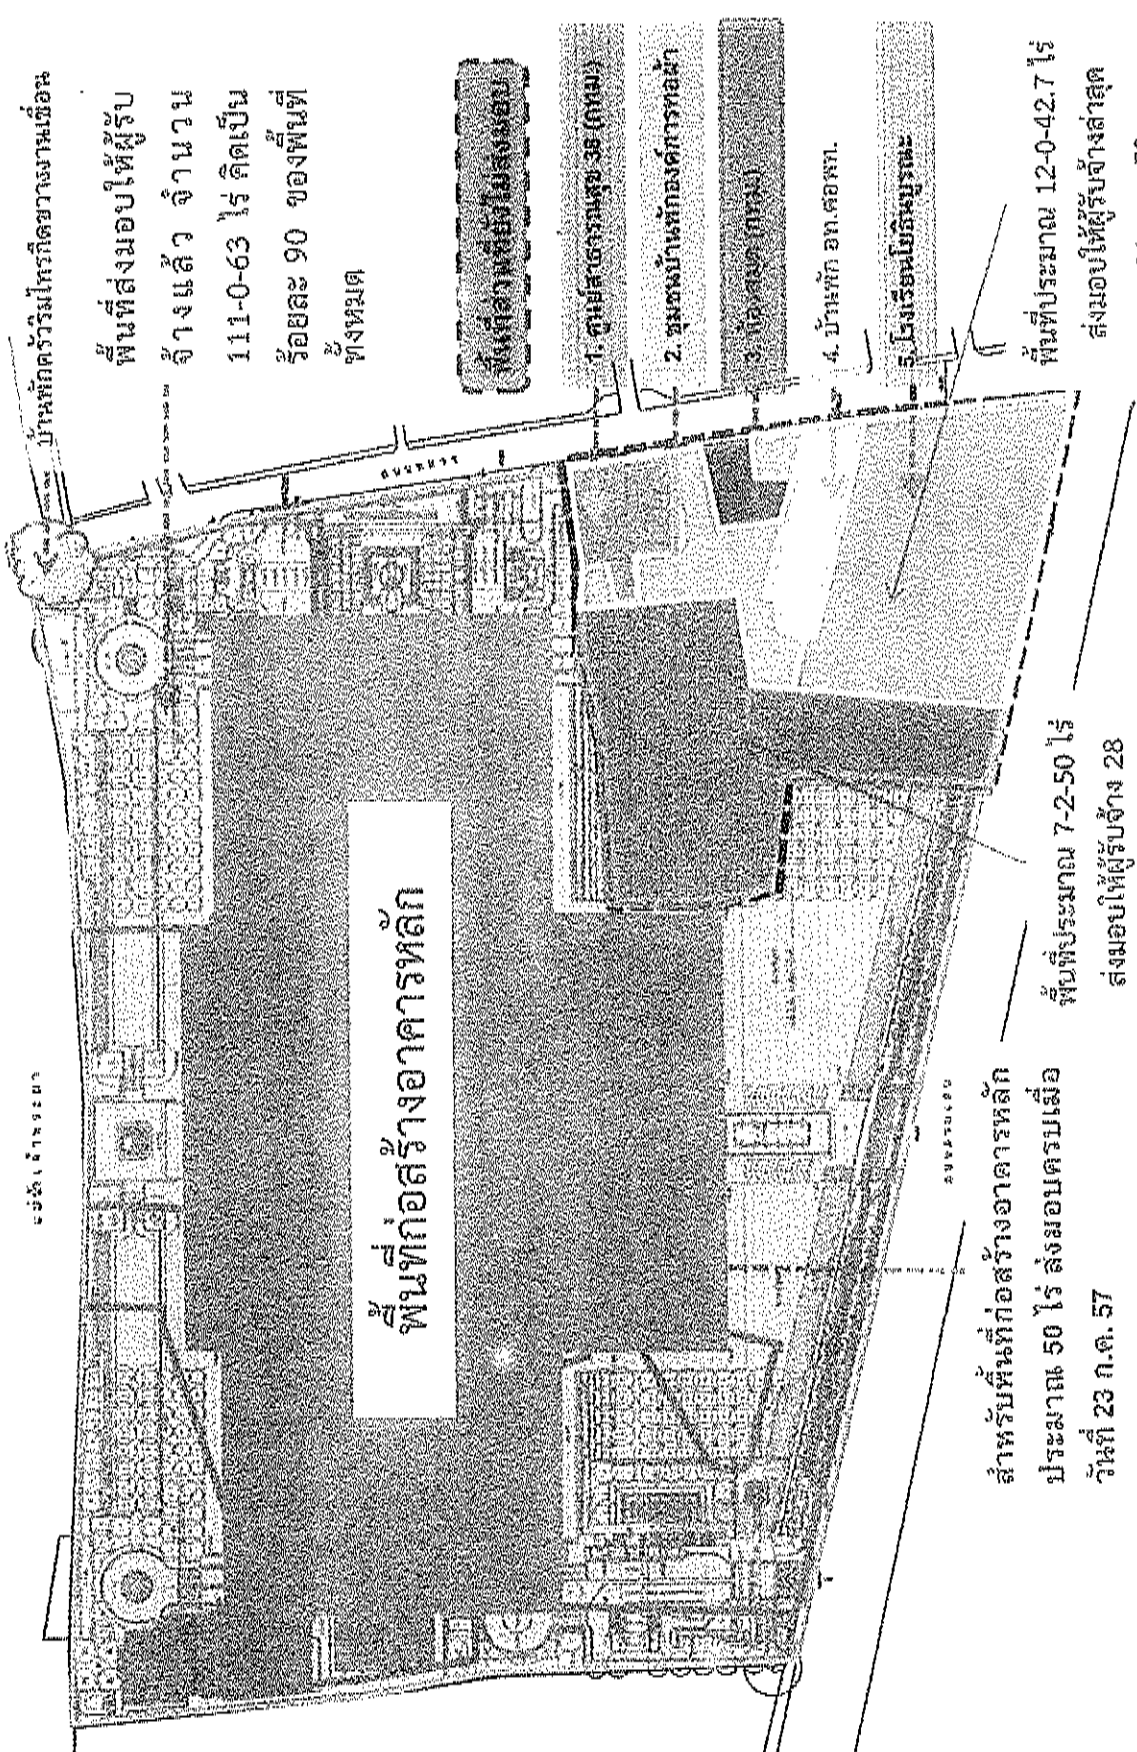

พื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก
ประมาณ 50 ไร่ ส่งมอบครบเมื่อ
วันที่ 23 ก.ค. 57

พื้นที่ประมาณ 7-2-50 ไร่
ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง 28
ก.ย. 59

พื้นที่ประมาณ 12-0-42.7 ไร่
ส่งมอบให้ผู้รับจ้างล่าสุด
11 พ.ย. 59

ผังแสดงพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด



สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ
3	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานเกี่ยวกาย โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าม่วง เป็นต้น</p>	<p>3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ</p> <p>3.1.2 หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบต่อโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p>	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ
3	<p>ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)</p> <p>3.2 ปัญหาอุปสรรคจากแบบรูปรายการ และรายละเอียดขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์</p>	<p>3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้</p> <p>3.2.2 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่มเติม</p> <p>3.2.3 รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป</p>	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ
3	<p>ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)</p> <p>3.3 การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก</p>	<p>3.3.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ</p>	<p>ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบมากกว่า 6 เดือน จึงเห็นสมควรเร่งรัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักของสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก</p>

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


ภาพถ่ายมุมสูง แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

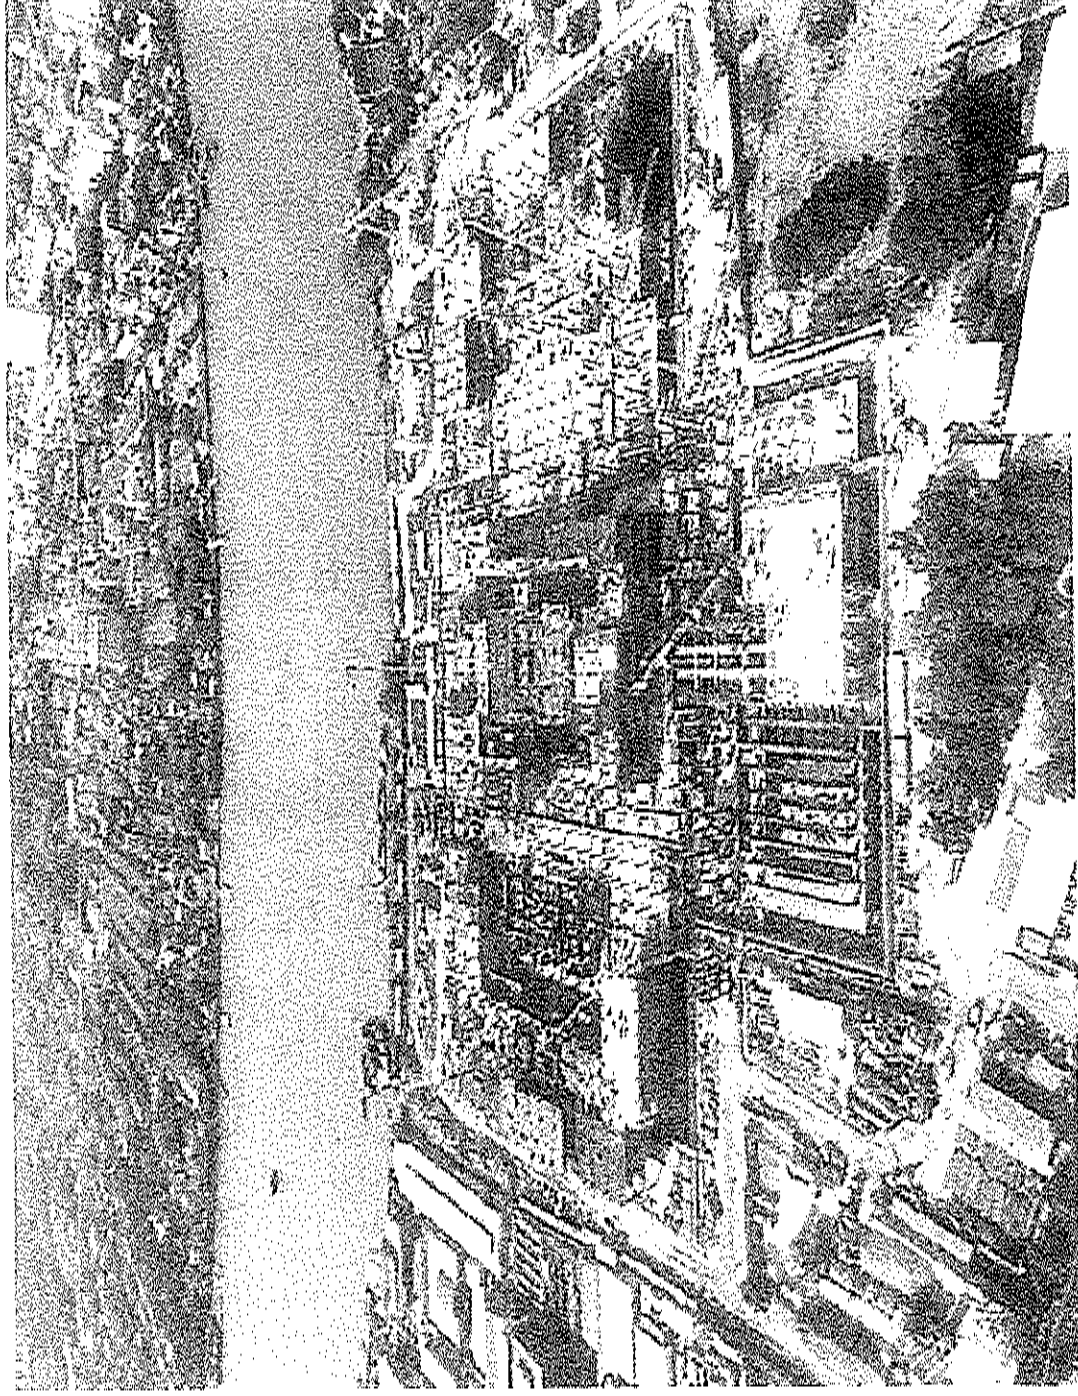


คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


ภาพถ่ายโดยรวมของหน้างานก่อสร้าง

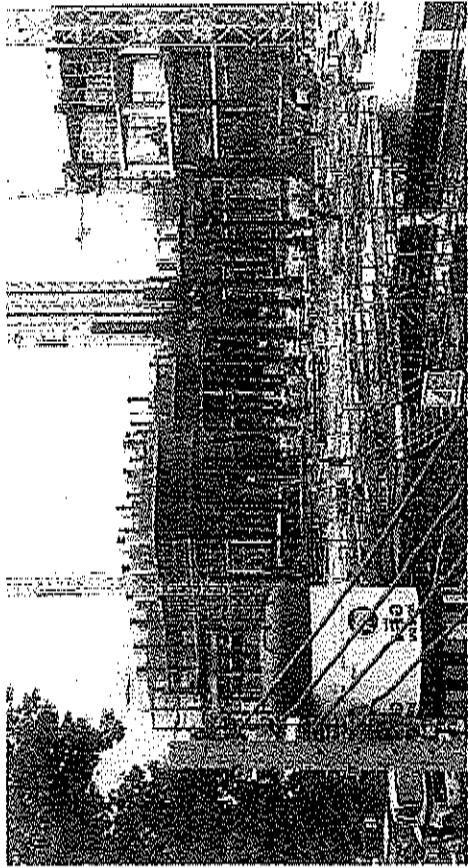

โชนซ้าย (ที่ทำการข้าราชการ ส.จ.)

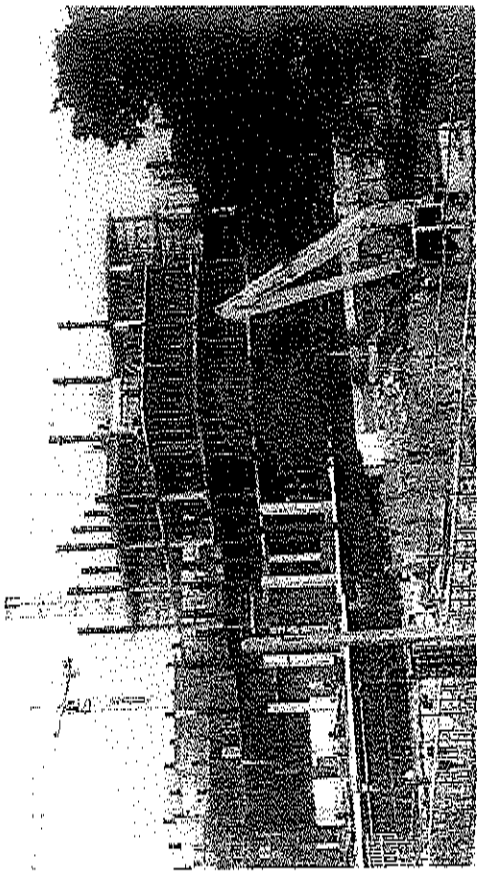


โชนขวา (ที่ทำการข้าราชการ ส.ล.)

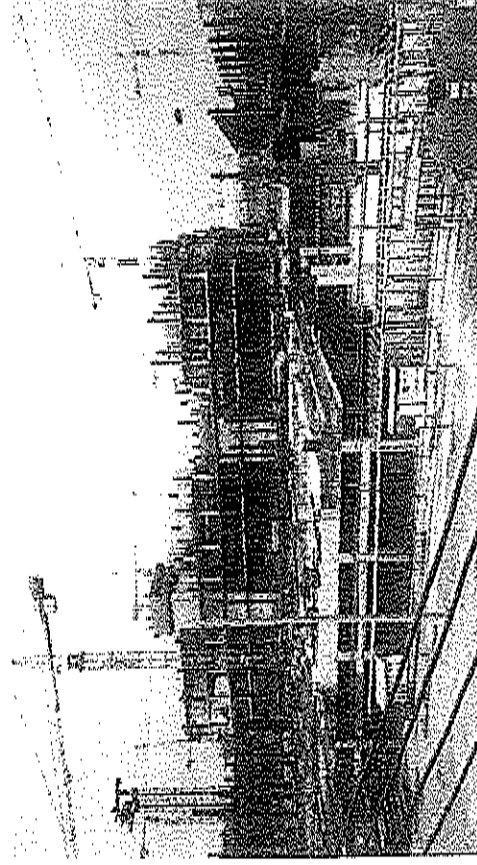




โชนกลาง (สมาชิกวุฒิสภา)

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าก่อสร้าง ส่วนเครื่องยอด

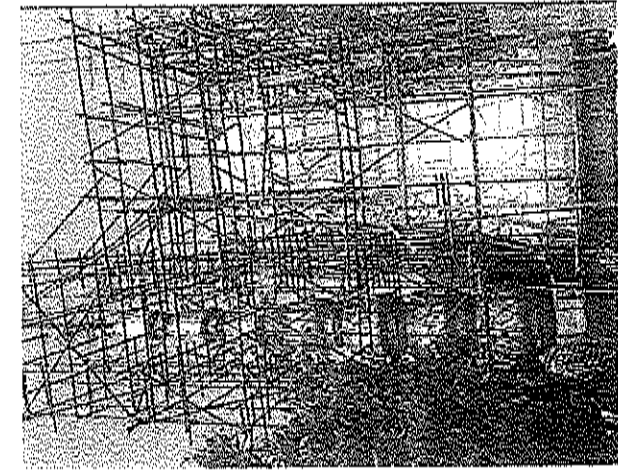

เครื่องยอด ชั้นที่ 5 จัดทำแล้วเสร็จ



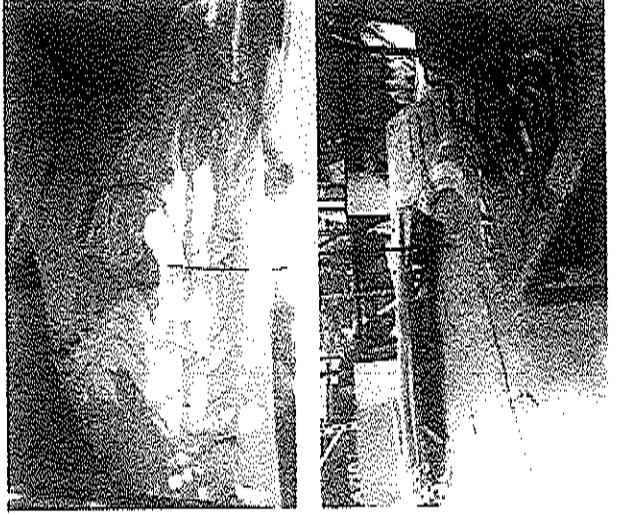
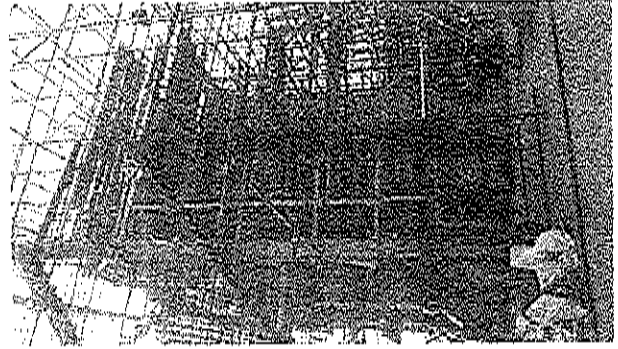
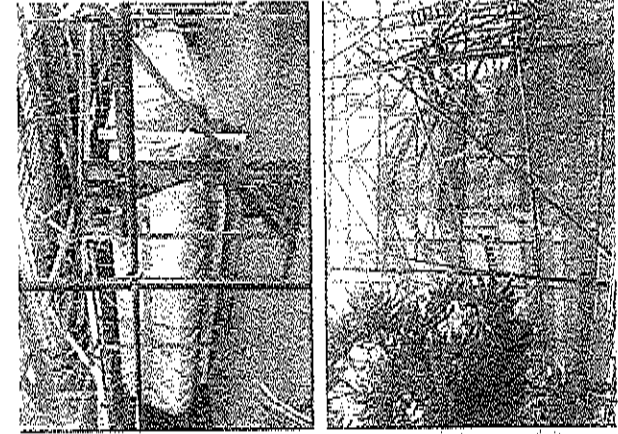


เครื่องยอด ชั้นที่ 4

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง ส่วนเครื่องยอด

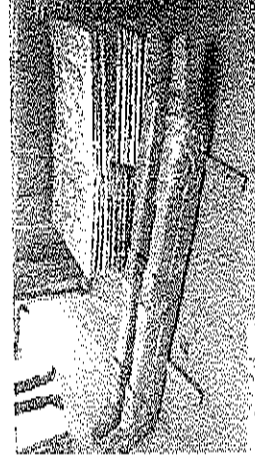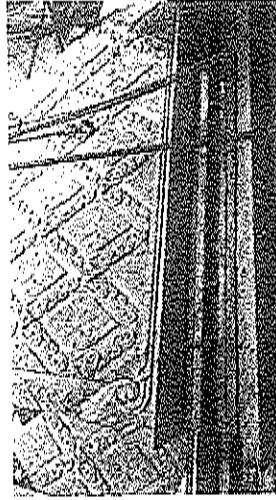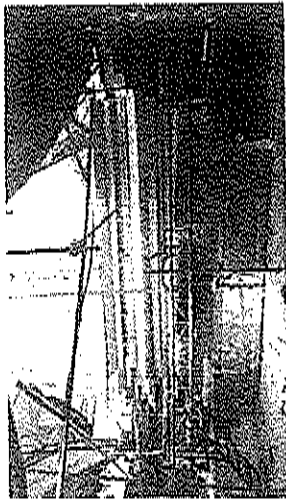

เครื่องยอด ชั้นที่ 3

ชิ้นส่วนประดับเครื่องยอด ชั้นที่ 2, 3, 4

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๑๖/๑๕๕๙๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๔๗๑๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยผลการดำเนินงานยังล่าช้ากว่าแผนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และในฐานที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) จึงมีความเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งรัดการดำเนินงานดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างกรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินชุด จากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.ซีโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป
๓. เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยเพื่อนำรายงานคณะรัฐมนตรี ได้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก. 
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
