



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 00 ๙
วันที่ ๗ ๖ ๖๐
เวลา ๙.๑๕ น.

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓.๔๒๓๓
ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๙๕๔ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๘๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๗๑๐๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๔๕๔

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

na

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขาธิการกรม
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายสมพาศ นิลพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) เรียน อปส.ผ่าน รปส.(๒)

สพ. แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ ให้ กปส.ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทั่วกัน

na

(นายเสมอ นิมเงิน)
ลก.
๗ มี.ค. ๖๐

๓) - ทราบ

- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

na

(นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ)
ป.อปส.
๘ มี.ค. ๒๕๖๐

na

รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ) 1401 2560

เลขรับ	๗/๕๓
วันที่	๑ มี.ค. ๖๐
เวลา	๑๐.๕๖ น.

เลขรับ	๒๕๗๕
วันที่	๑ มี.ค. ๖๐
เวลา	๑๑.๕๖ น.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๗/๑๐๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๘๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๐๒๗๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นางสมศรี นาคจำรัสศรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ฉันทราภรณ์

๔

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๒ (สมจิตร์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th

(นางสาวสมจิตร์ นาคจำรัสศรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงาน



ที่ มท ๐๗๑๖/ ๐๒๗๖๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ เล่ม
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๐๐๐๒๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๑.๒๔ % (ผลงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทำได้ ๒๘.๑๐ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว
เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๒.๒.๒ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง
อาจจะยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

๒.๒.๓ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบ ระบบ
ICT มากกว่า ๗ เดือน ยังไม่ได้ผู้ออกแบบ ซึ่งอาจทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก
(บ.ซีโน-ไทยฯ) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้าง
ผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ค่วนที่สผ ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา สมประสงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)๑๗/๕๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

พลเอก


(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่.....

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
โดย
กระทรวงมหาดไทย

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายวีระพันธ์ นุชนอบัติ) และนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร่วมกันรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจพิจารณาแล้ว

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความเห็นในส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๑.๒๔ % (ผลงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทำได้ ๒๕.๑๐ %)

๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้


๒.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๒.๒ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง อาจจะยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

๒.๓ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบ ระบบ ICT มากกว่า ๗ เดือน ยังไม่ได้ผู้ออกแบบ ซึ่งอาจทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๔ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

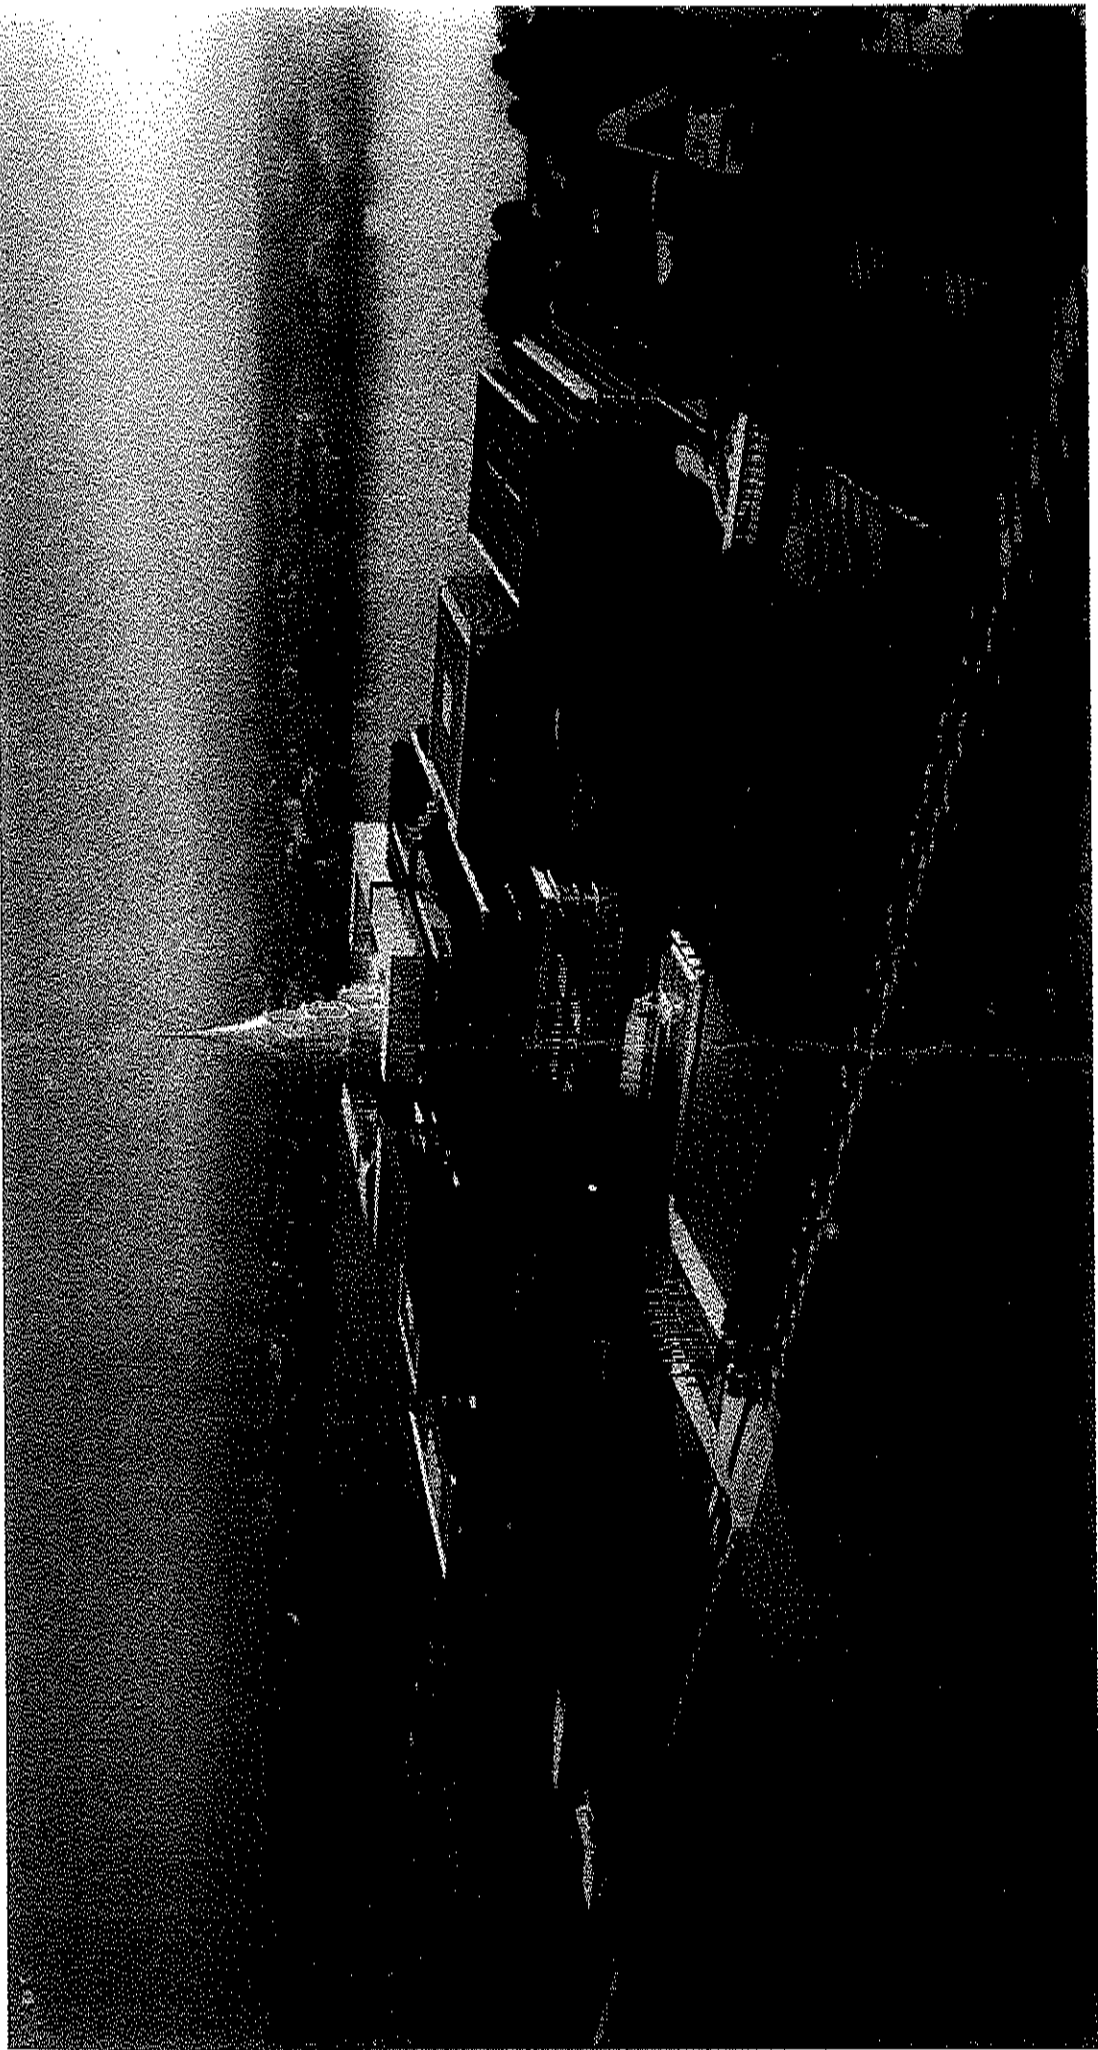

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ธ.ค. 59	หมายเหตุ/ ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 31.24 %	การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ออกไปจำนวน 421 วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา
		หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 30 พ.ย.59 ทำได้ 28.10 % 2. สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59 3. สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหาเรื่องดินจากการก่อสร้างขึ้นได้ดิน ออกไปจำนวน 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 ก.พ. 61	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 59	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)	ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว	ส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 12 - 0 - 42.7 ไร่

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

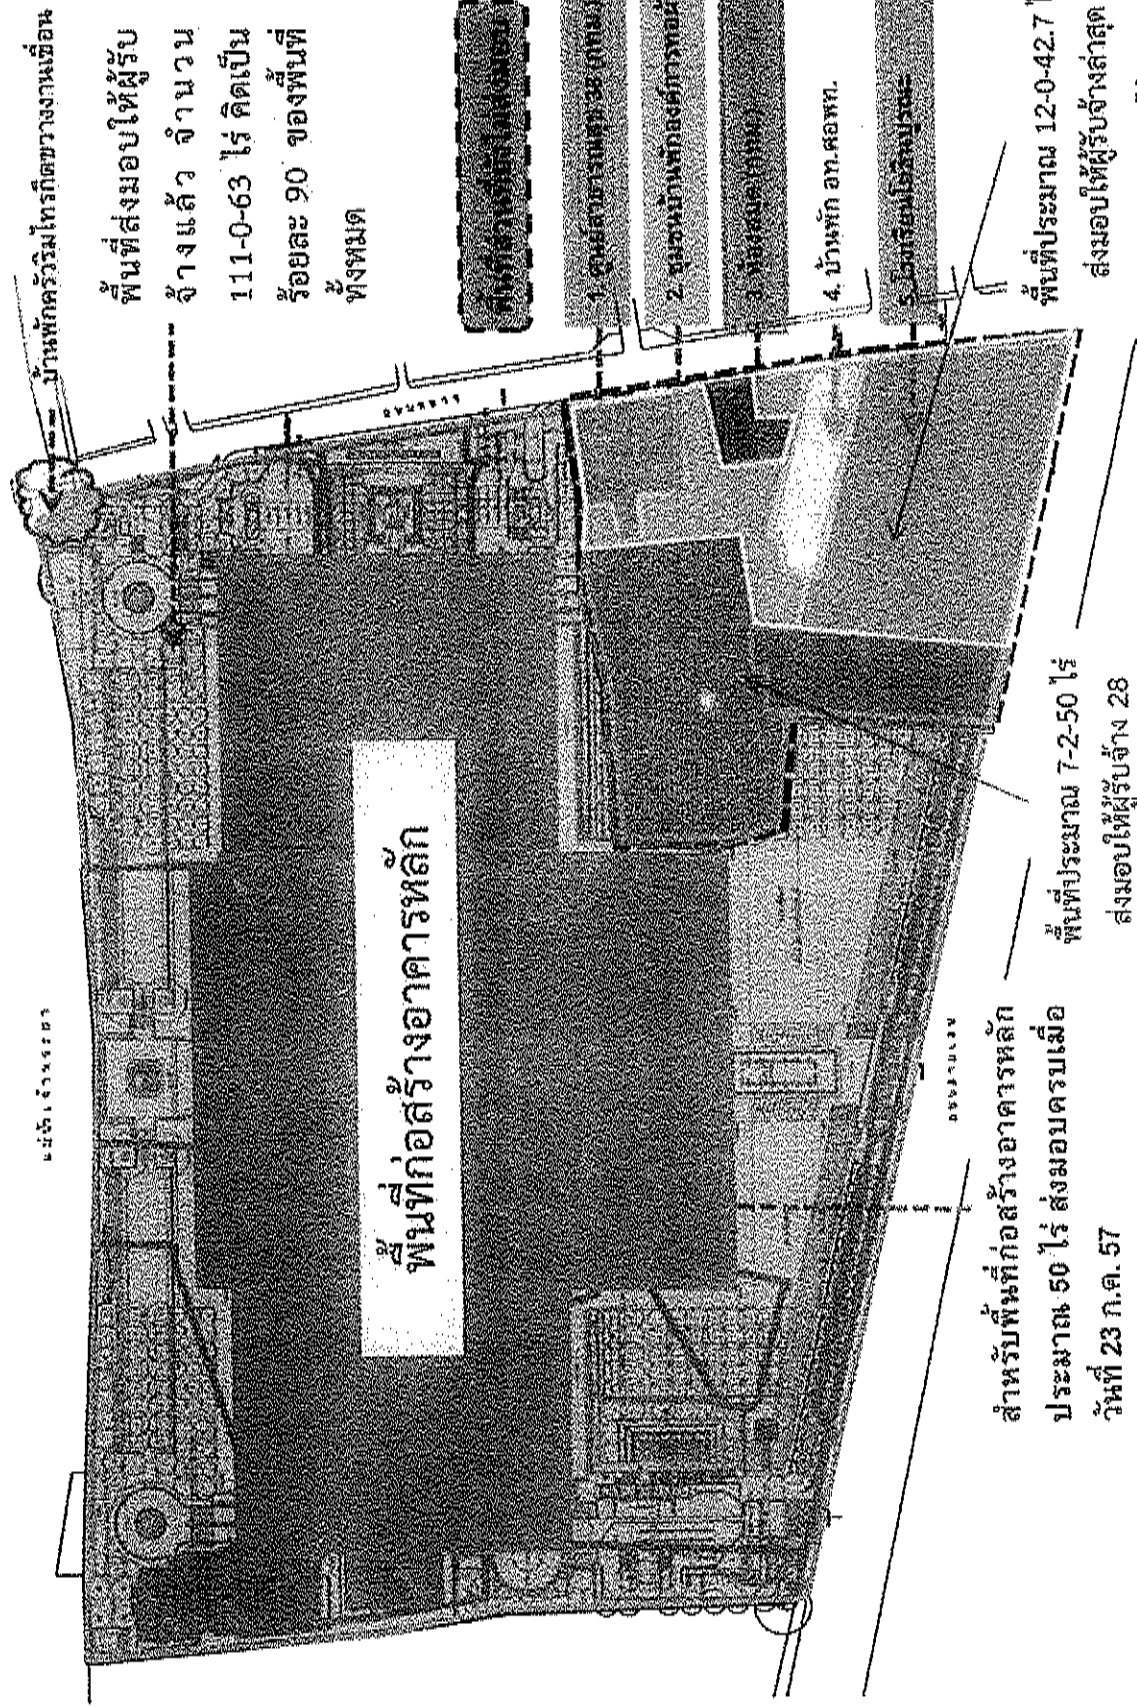

ผังแสดงพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ธ.ค. 59	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค 3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีม่วง เป็นต้น	3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ 3.1.2 หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบต่อโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 3.1.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมพิจารณารูปแบบ โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาข้อสรุปในการตอบข้อซักถามของ สผ.	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ธ.ค. 59	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้	
	3.2 ปัญหาอุปสรรคจากแบบรูปรายการและรายละเอียดขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์	3.2.2 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่มเติม	
		3.2.3 รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างวินิจฉัยต่อไป	


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ธ.ค. 59	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ) 3.4 การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก	3.4.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ	ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบมา กว่า 7 เดือน จึงเห็นสมควรเร่งรัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นการขยายให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

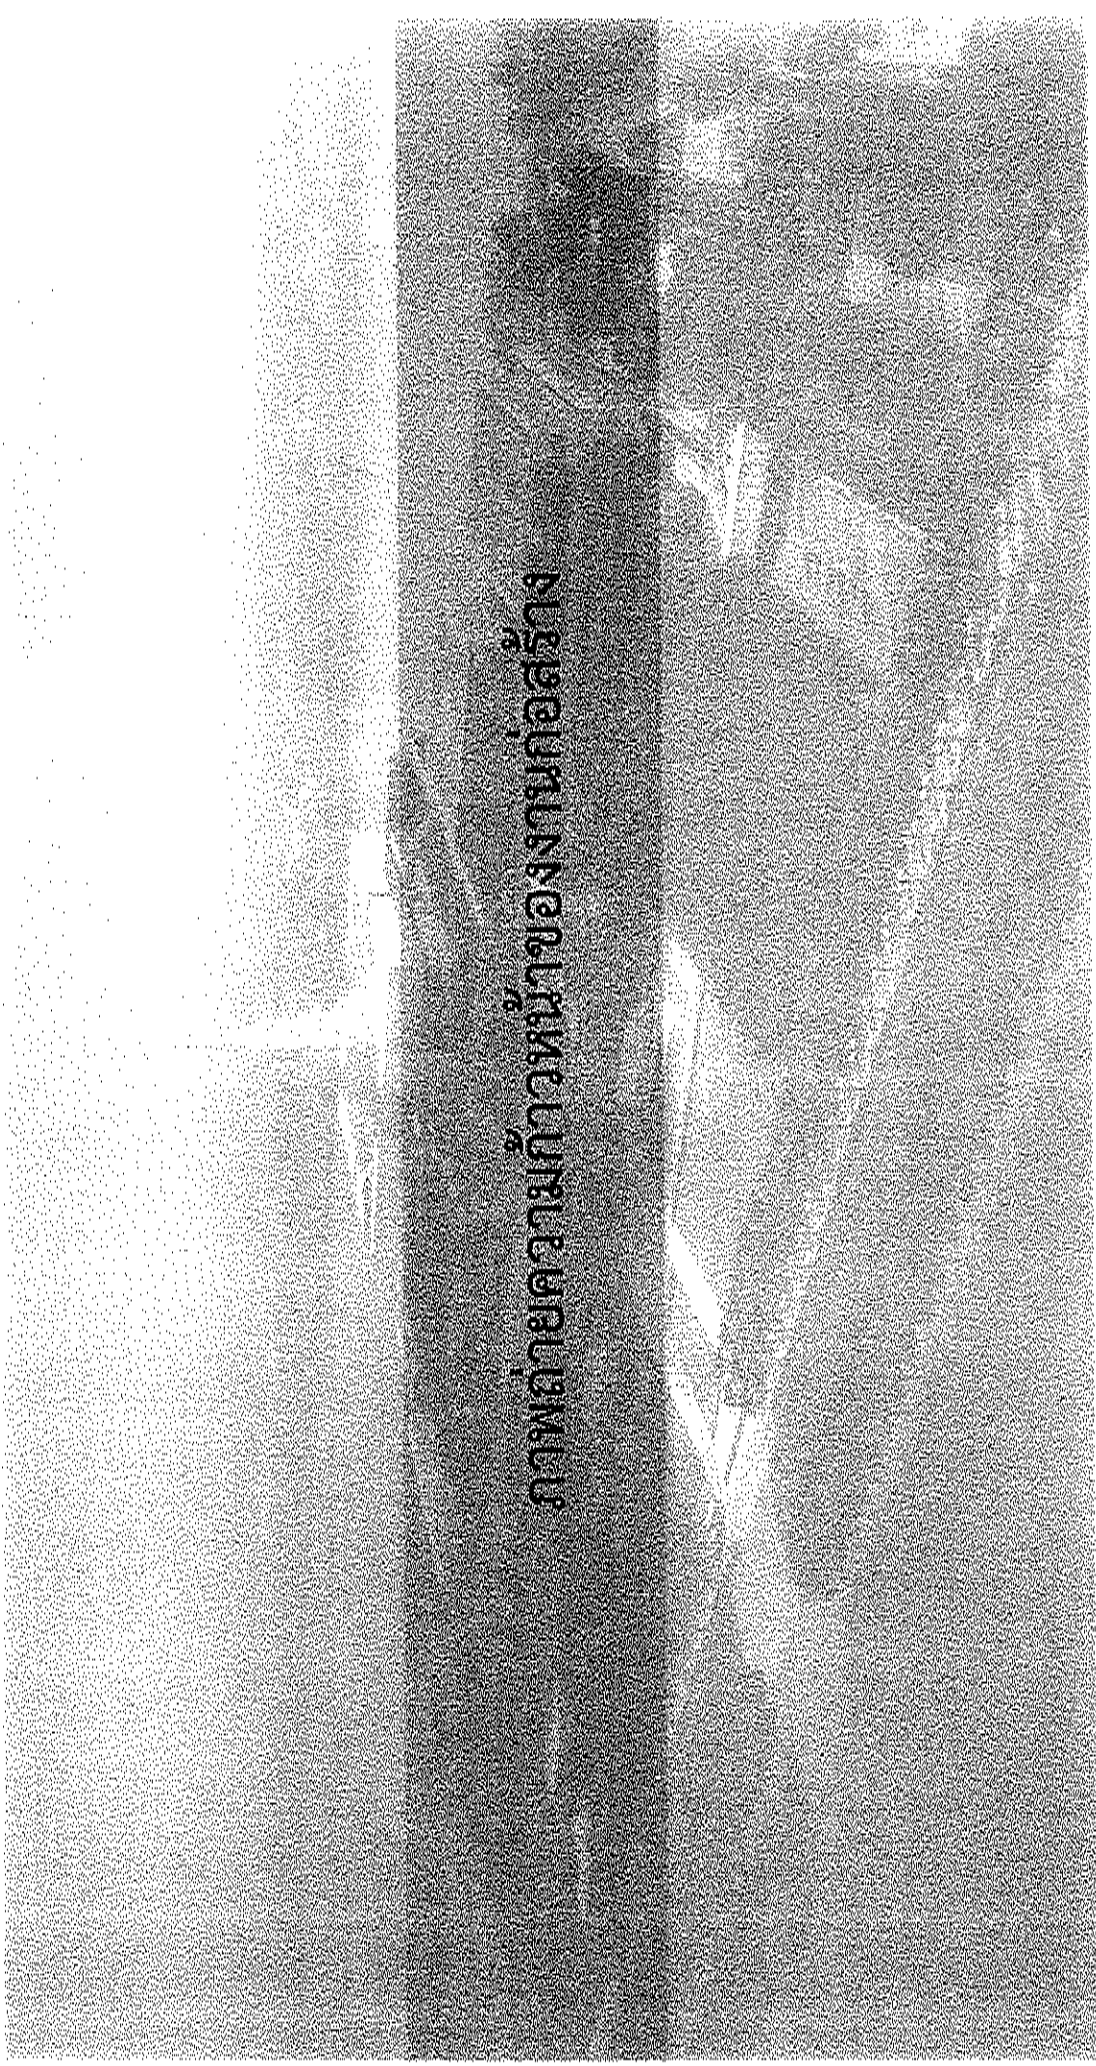


ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


ภาพถ่ายโดยรวมของหน้างานก่อสร้าง

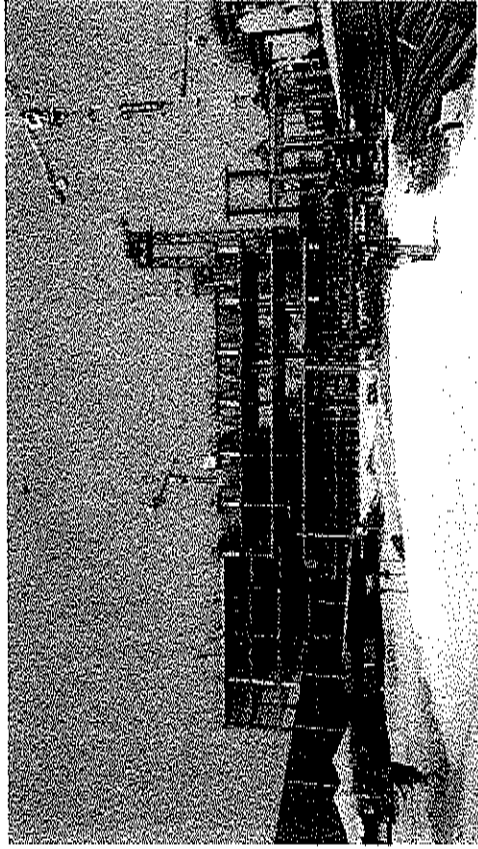

โชนซ้าย (พื้นที่อาคารจอดรถ ล.๑)

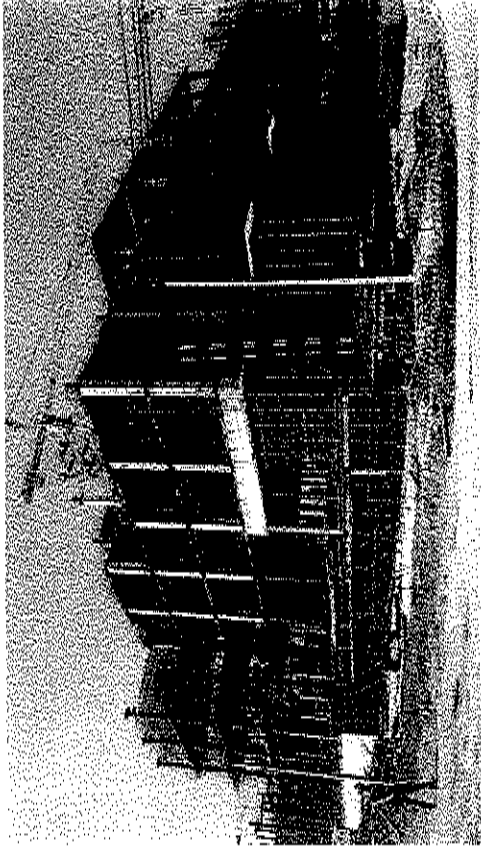

โชนขวา (พื้นที่อาคารจอดรถ ล.๑)

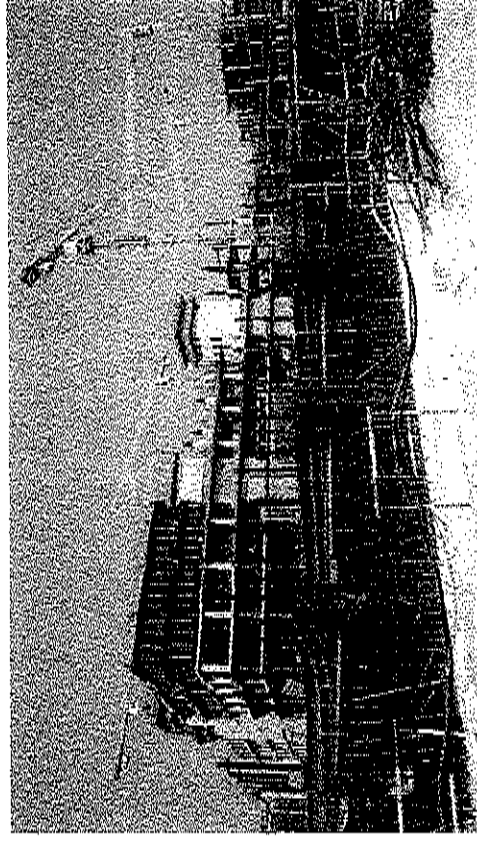


โชนกลาง (สมาชิกรัฐสภา)


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบอาคาร

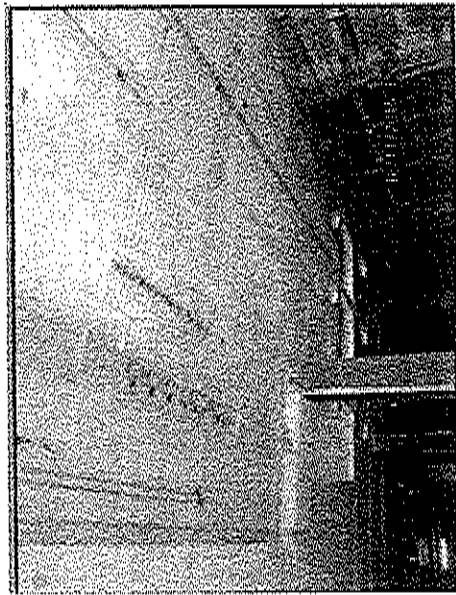

งานติดตั้งท่อและสายไฟฟ้า ชั้น B2,B1,B1M,1,2



งานติดตั้งเมนไฟฟ้า MDB ชั้น B2,B1

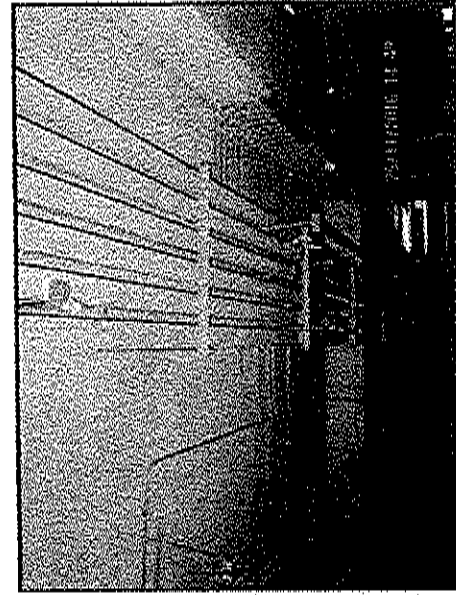


คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตั้งวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบ



งานติดตั้ง ท่อส่งลมเย็นปรับอากาศส่วน B2,B1,B1M,1

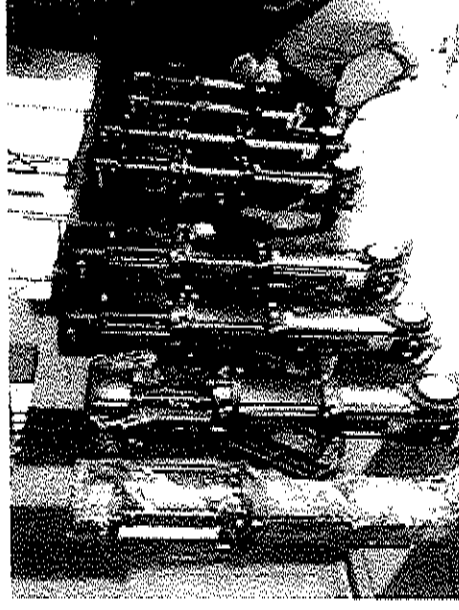

งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาลชั้น B2,B1,B1M

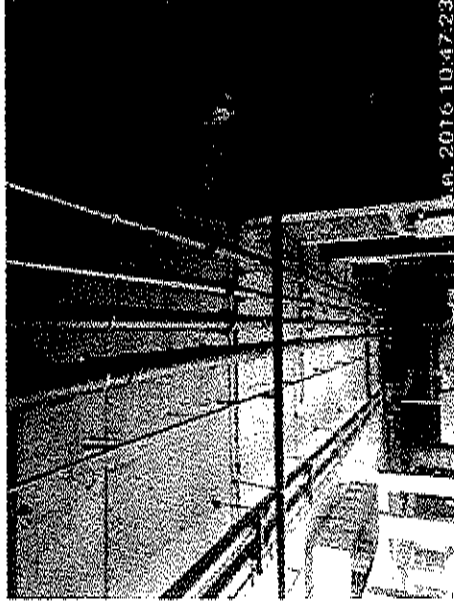

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๓๖/๑๕๕๙๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๔๗๒๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยผลการดำเนินงานยังล่าช้ากว่าแผนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และในฐานที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) จึงมีความเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งรัดการดำเนินงานดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างกรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินขุด จากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.จิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป
๓. เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยเพื่อนำรายงานคณะรัฐมนตรี ได้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก.

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๗/๔-๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง

(นางฉันทนา สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
