



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 40425
รับที่ 21/4/๖๐
เวลา 15.40 น.

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๔

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๖๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๐๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๓๔๔๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ นร ๐๑๐๑.๐๑๑/ว ๗๘๖

เรียน ขอ.สำนัก.สอ.กธ. และหัวหน้ากองช่าง
เพื่อโปรดทราบ

(นายสมพาส นิลพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายเอก นีนะวิท)

เลขาธิการกรม
ที่ นร ๐๑๐๑.๐๑๑/ว ๖๖๐

เรียน อปส.ผ่าน รปส.(๒)

สนร. แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย)
ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ ให้
กปส.ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้
หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายวัฒนา เงินกลม)

ร.สนก.

๒๑ เม.ย. ๖๐

๗ - ทราบ

- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ)

ป.อปส.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

กองกลาง
เลขรับ ๑๓๓๐
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๐
เวลา ๑๕.๕๖ น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขรับ ๑๕๐๖๔
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๐

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๓๔๙๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย)
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๐๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๓ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมศรี นาคจำรัสศรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๒ (สมจิตร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรา อ่อนละมุน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ที่ มท ๐๗๑๖/ ๐๕๒๗๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุต ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๔๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๓.๓๓ % (ผลงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทำได้ ๓๒.๓๘ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๒.๒.๒ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง อาจจะยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่

(๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ

(๒) การขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ ๑๕๐ วัน

๒.๒.๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบ ระบบ ICT มากกว่า ๗ เดือน ซึ่งอาจทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บ.ซีโน-ไทยฯ) ปัจจุบันได้ผู้ออกแบบแล้ว ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการลงนามในสัญญากับผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

นางสาวอุกฉ่อง



(นางอุกฉ่อง ชูประสงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๓) ๓๗๔๕ /๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(แยกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป


พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนก งามประสงฆ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

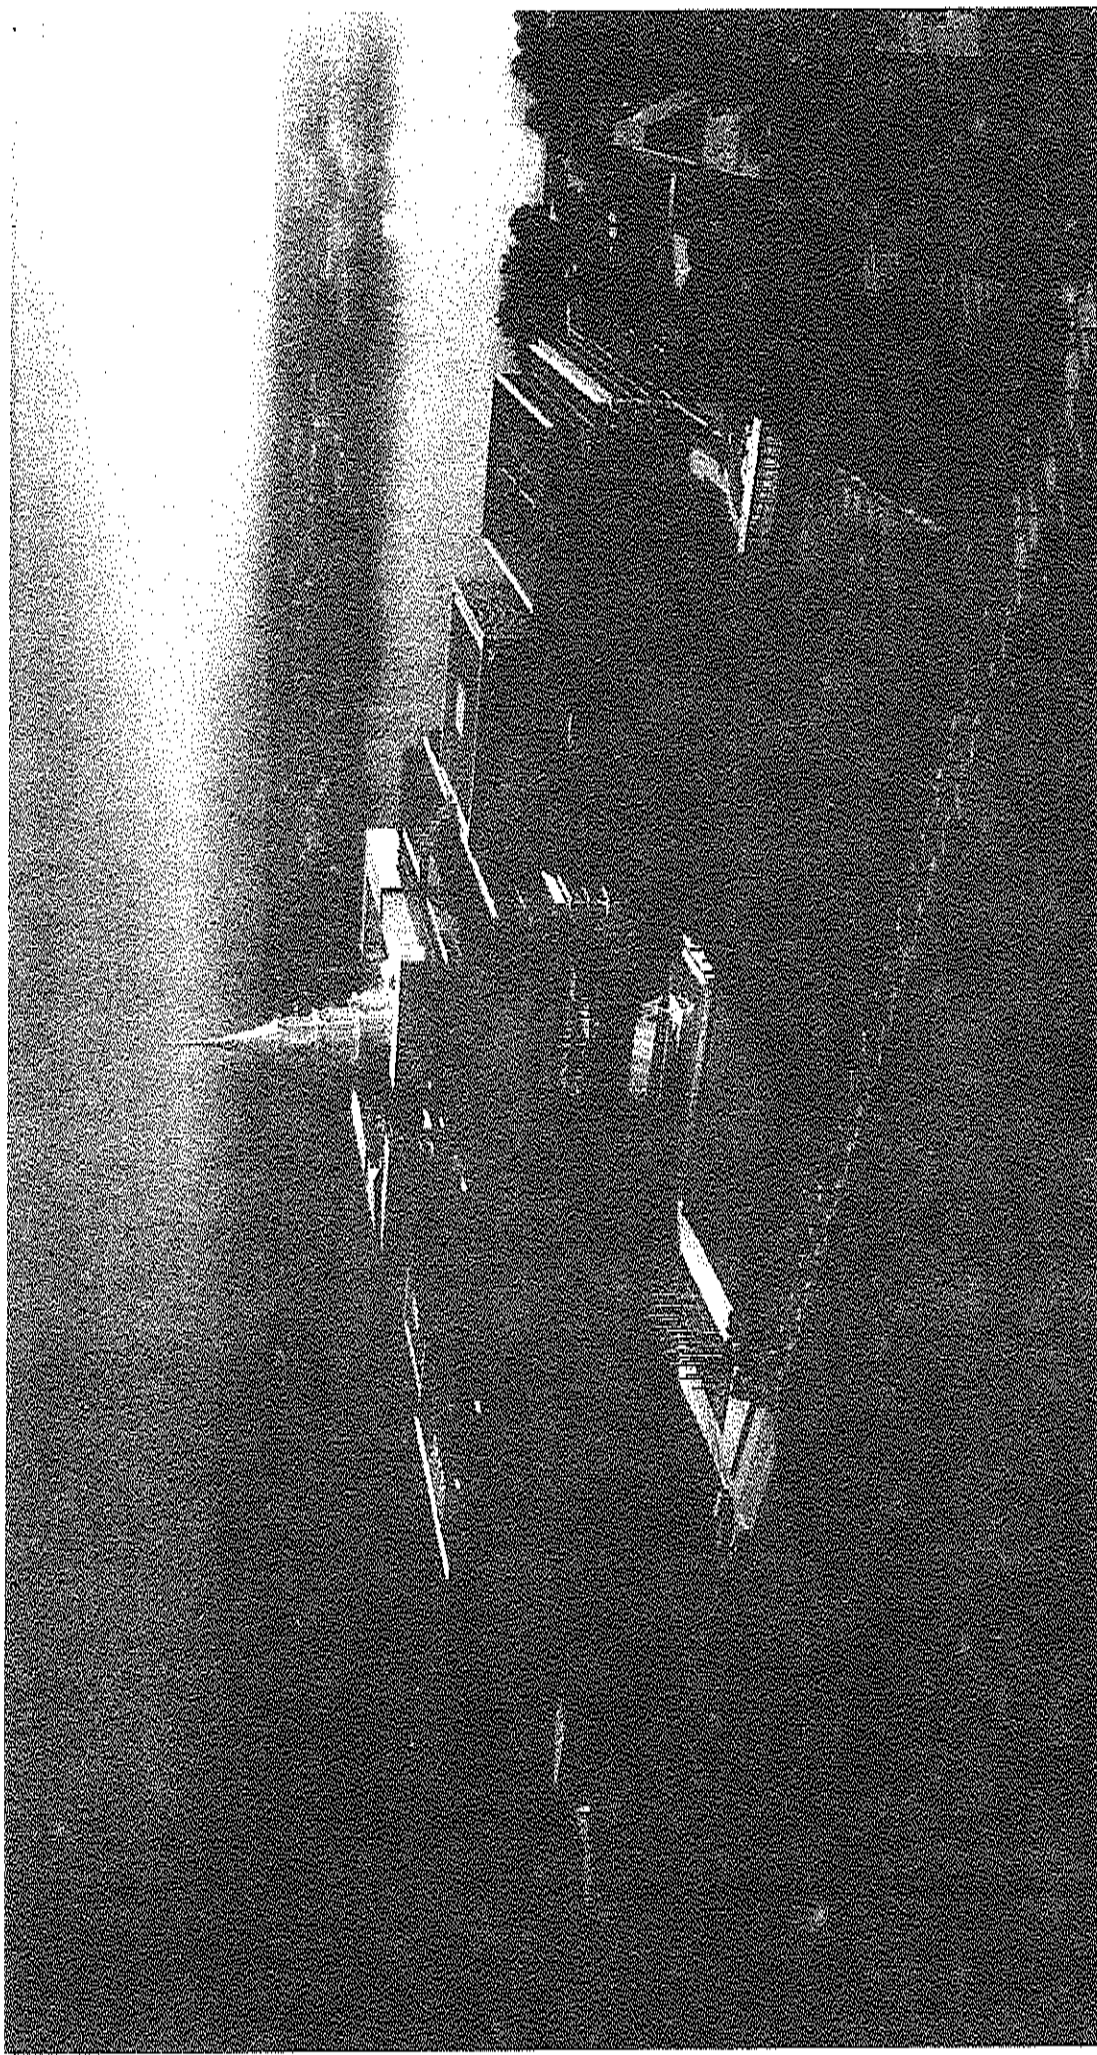

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ก.พ. 60	หมายเหตุ/ ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 33.33 % หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 31 ม.ค.60 ทำได้ 32.38 % 2. ส่นง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา ขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างจากสภาเหตุการณ์การส่งมอบพื้นที่ ลำช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59 3. ส่นง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา ขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหา เรื่องดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ออกไปจำนวน 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 ก.พ. 61	การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ออกไปจำนวน 421 วัน ยังไม่สามารถทำให้ งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุ ให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ออกไปอีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ม.ค. 60	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)	ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว	ส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 12 - 0 - 42.7 ไร่

พื้นที่ส่งมอบให้ผู้รับ
จ้างแล้ว จำนวน
111-0-63 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของพื้นที่
ทั้งหมด

พื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก
ประมาณ 50 ไร่ ส่งมอบครบเมื่อ
วันที่ 23 ก.ค. 57

พื้นที่ประมาณ 7-2-50 ไร่
ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง 28

ก.ย. 59
ผังแสดงพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

1. อาคารจอดรถยนต์ 300 คัน
2. ซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
4. บ้านพัก อา.ศอ.พ.
5. โรงเรียนปริณิธยานะ

พื้นที่ประมาณ 12-0-42.7 ไร่
ส่งมอบให้ผู้รับจ้างล่าสุด
11 พ.ย. 59



สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ก.พ. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค	3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ	
	3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า	3.1.2 หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบต่อโครงการรัฐสภาแห่งใหม่เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป	
	ม่วง เป็นต้น		

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ก.พ. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ) 3.2 ปัญหาอุปสรรคจากแบบรูปรายการ และรายละเอียดขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์	3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ 3.2.2 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ในกรณีที่เป็นงานเพิ่มเติม 3.2.3 รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาบริหาร โครงการและผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและ ความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจัยต่อไป	


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ก.พ. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ) 3.4 การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้ กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก	3.4.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ผู้รับจ้าง ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องติดตามการขออนุมัติราคากลาง ในการจ้าง จากสำนักงานงบประมาณ


ภาพฉายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


ภาพถ่ายโดยรวมของหน้างานก่อสร้าง

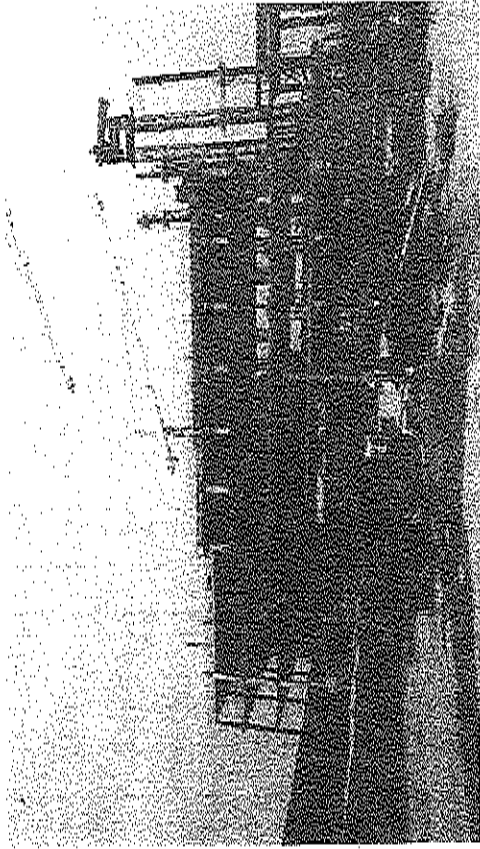

โอบข่าย (พื้นที่การขุดเจาะ ล.ว.)

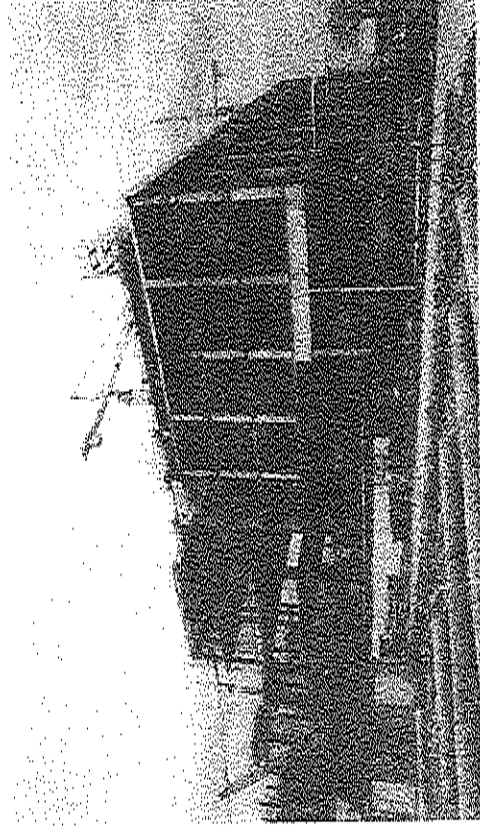




โอบข่าย (พื้นที่การขุดเจาะ ล.ล.)

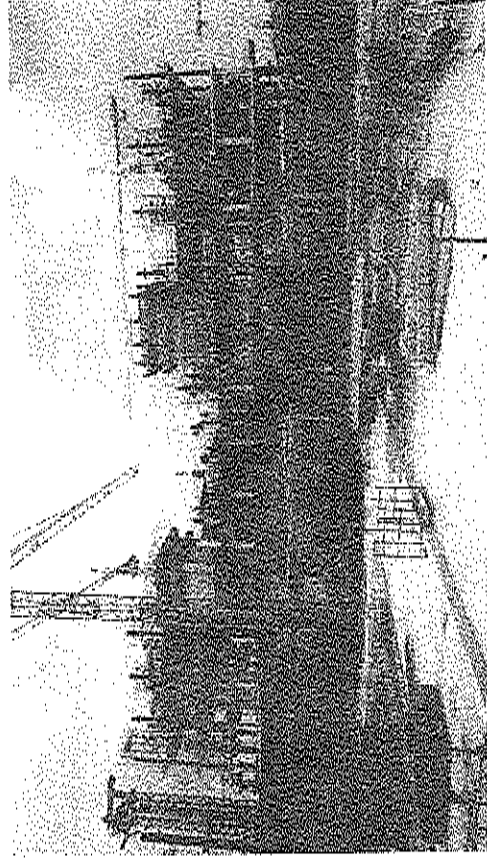

โอบกลาง (สมาชิกรัฐสภา)

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าก่อสร้างอาคาร

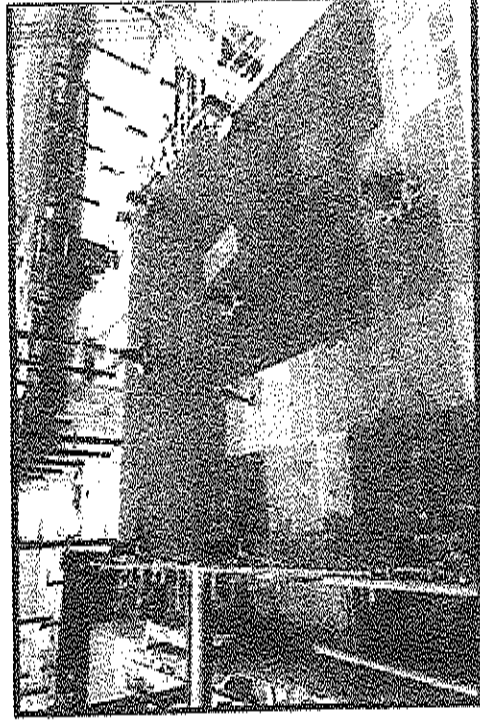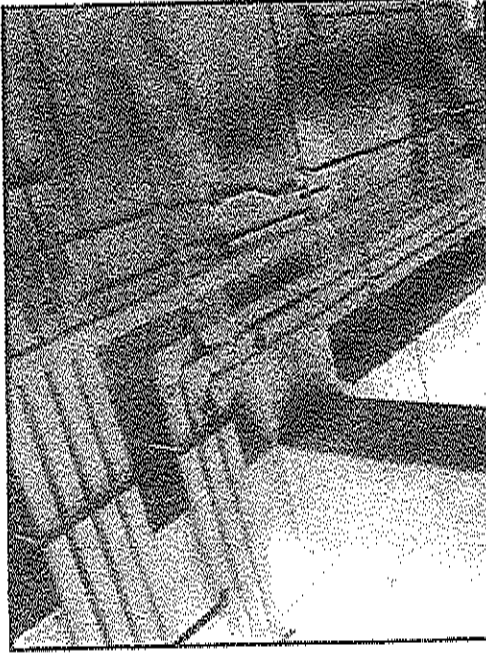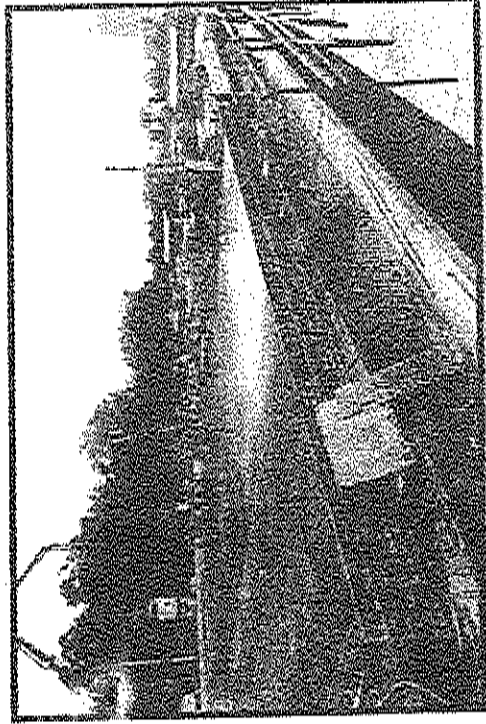


งานโครงสร้างโดยรวม


งานติดตั้ง ท่อและสายไฟฟ้า ชั้น B2(B1,B1M,1,2,3)

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบ

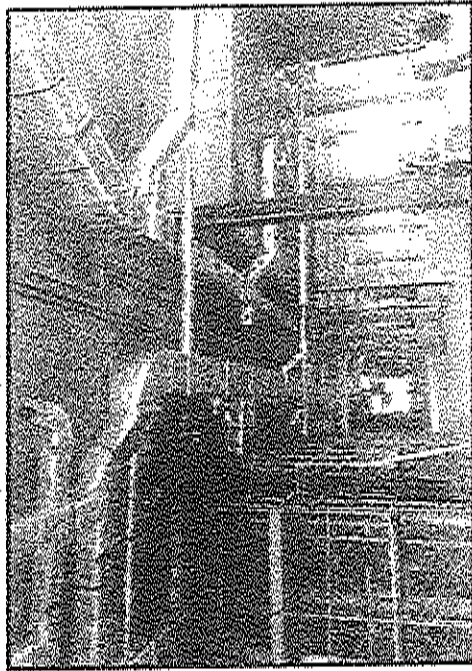

งานติดตั้ง ท่อส่งลมเย็นปรับอากาศชั้น B2,B1,B1M,1,2



งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาลชั้น B2,B1,B1M,1,2

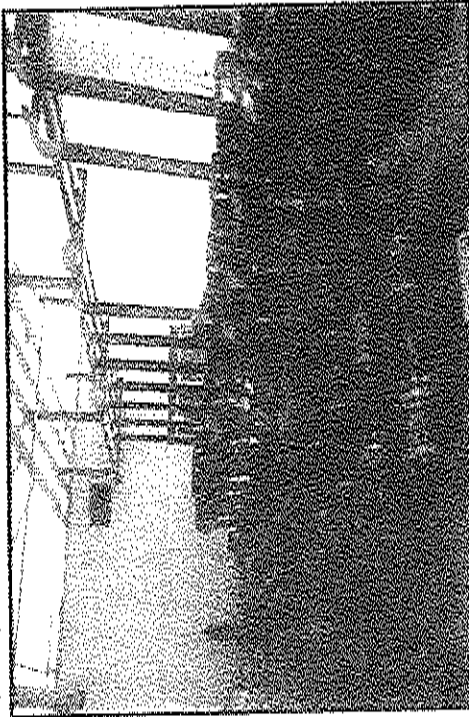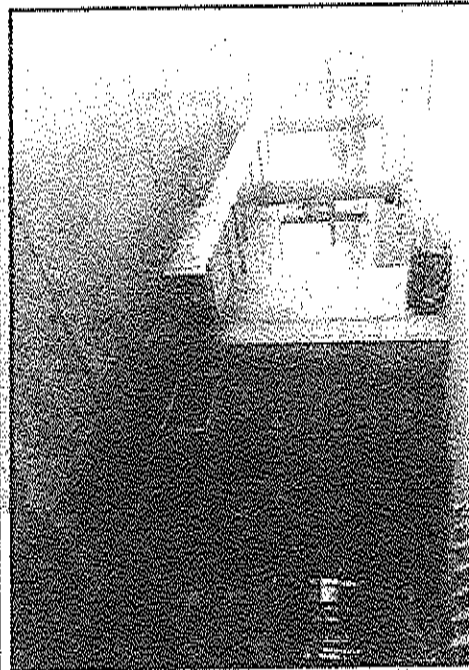

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๗๑๖/๑๕๕๕๙



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๕๗๒๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยผลการดำเนินงานยังล่าช้ากว่าแผนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และในฐานที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) จึงมีความเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งรัดการดำเนินงานดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างกรณีผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ์อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินชุด จากงานก่อสร้างขั้นได้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.จิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป

๓. เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยเพื่อนำรายงานคณะรัฐมนตรี ได้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สำเนาถูกต้อง

(นางจันทนา สมประสงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๔๖
