



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 5964
วันที่ 14/6/60
เวลา ๐๙.1๙๖

ส่วนราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๓

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๔๔๒๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)

- ๑ เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๓๔๙๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๔๔๔๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕

ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๖๖๔๘

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายสมพาศ นิลพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขาธิการกรม

๑๕ มิ.ย. ๖๐

๓ - ทราบ

- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

- ๒ เรียน อปส.ผ่าน รปส.(๒)

สพ.แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ๘ มิ.ย.๖๐ มาให้ กปส. ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

สนก.

๑๓ มิ.ย. ๖๐

(นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ)

ป.อปส.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

กองกลาง
เลขรับ ๑๕๐๕
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๐
เวลา ๑๐.๔๕ น.

๔๐๖๓
๕ มิ.ย. ๖๐
๑๐.๓๕ น.

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๕๕๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๓๔๙๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๐๘๗๒๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า

๑. รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Ornl (Jum)

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๒ (สม/จิตร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววิจิรา อ่อนละมุน)

๙ มิ.ย. ๖๐ ๑๐.๓๕ น.

ก.ก.
๐๖
๕ มิ.ย. ๖๐
กชป.
๕ มิ.ย. ๖๐
๕ มิ.ย. ๖๐
๕ มิ.ย. ๖๐

ที่ มท ๐๗๑๖/ ๐๘๗๒๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ เล่ม
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๕๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๔.๕๒ % (ผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทำได้ ๓๓.๓๓ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบ
พื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว
เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๒.๒.๒ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง
อาจจะยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่

(๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ

(๒) การขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ ๑๕๐ วัน

๒.๒.๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบ ระบบ ICT
มากกว่า ๗ เดือน ซึ่งอาจทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บิซิโน-ไทยฯ) ปัจจุบันได้ผู้ออกแบบแล้ว
ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการลงนามในสัญญากับผู้
ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๑ ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖

ผู้อำนวยการกอง



(นางสาวสมจิตร รูปพะมาะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๓(กร.๑) ๕๓๕๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

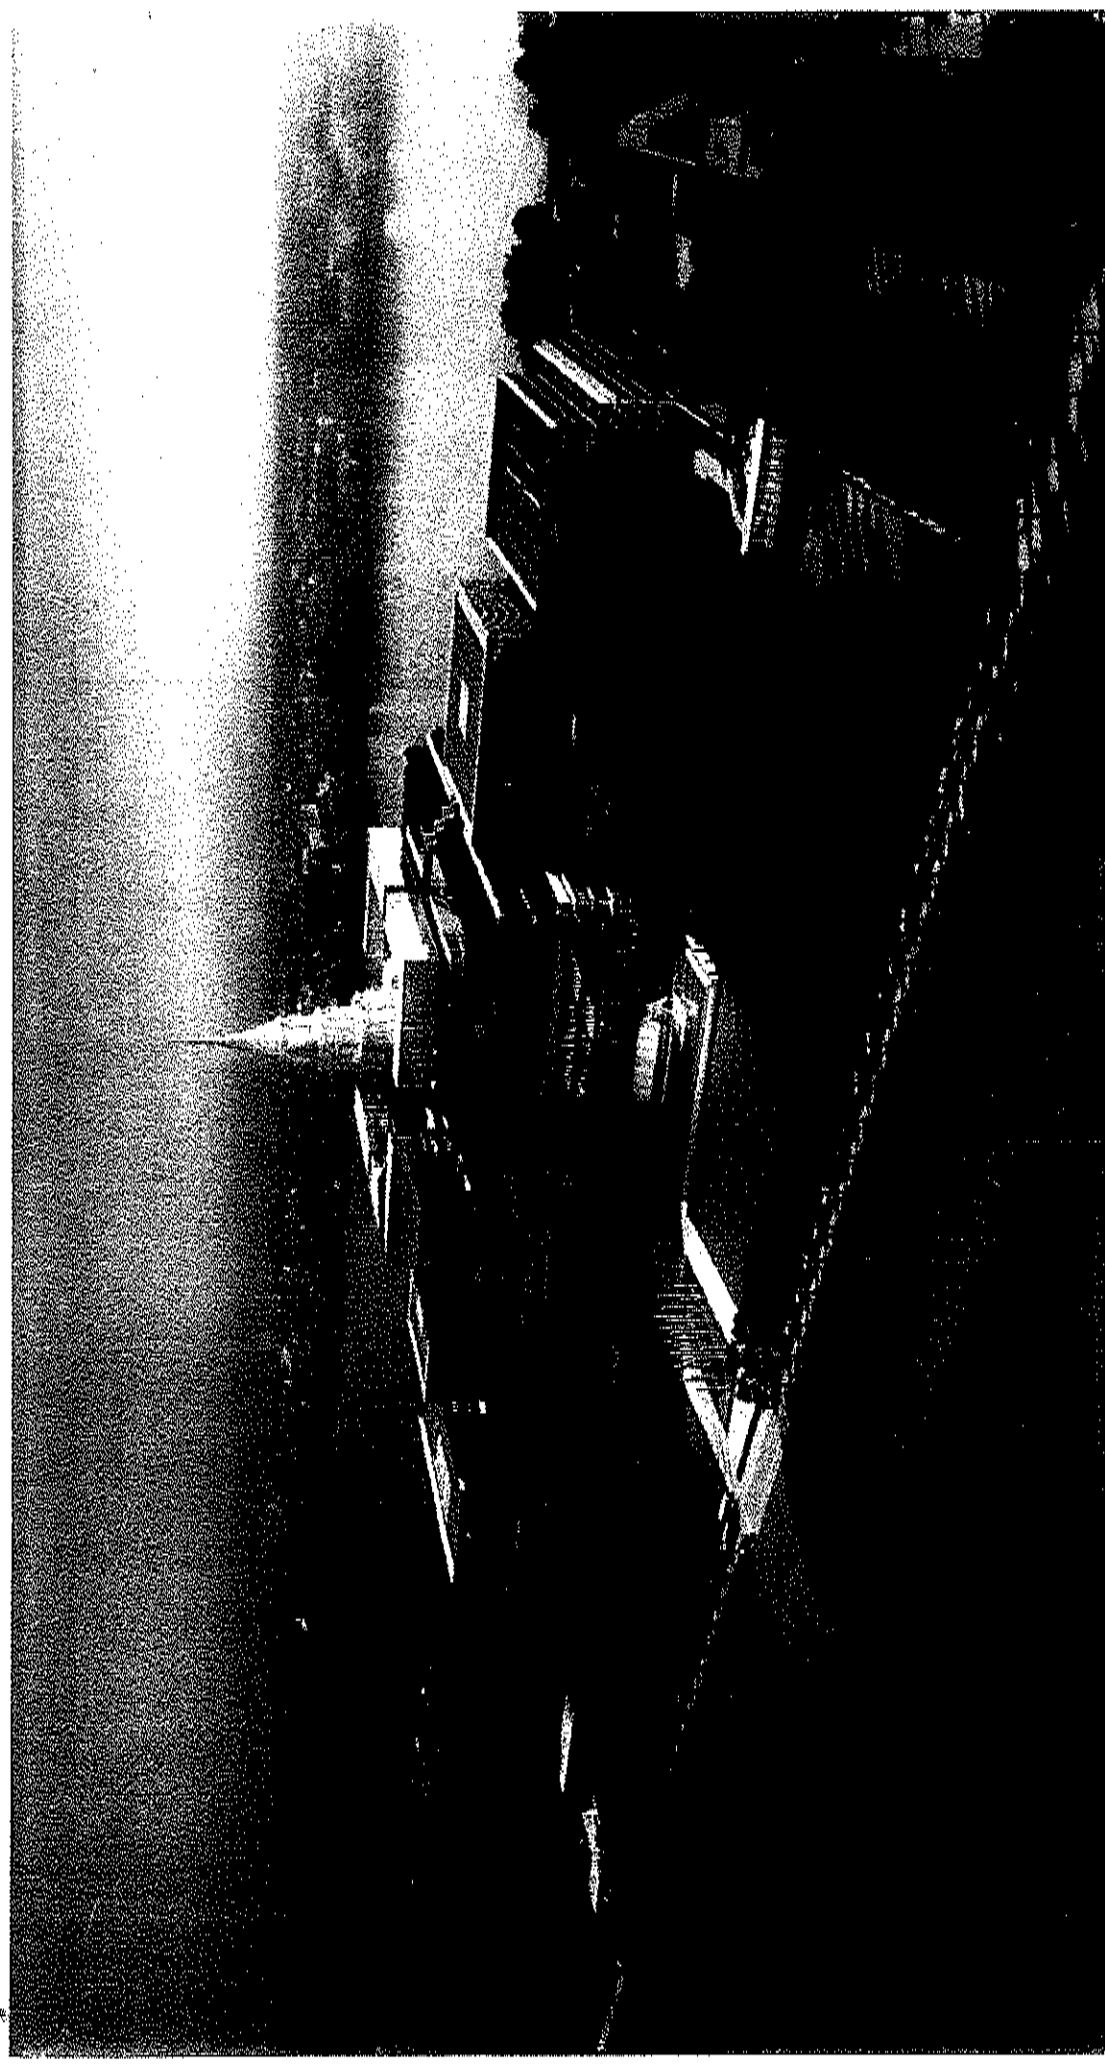

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มี.ค. 60	หมายเหตุ/ ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 34.52 % หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 28 ก.พ.60 ทำได้ 33.33% 2. ส่นง.เลขธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59 3. ส่นง.เลขธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหาเรื่องดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ออกไปจำนวน 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 ก.พ. 61	การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ออกไปจำนวน 421 วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ (๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ (๒) การขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ ๑๕๐ วัน


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มี.ค. 60	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว	ส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมครั้งล่าสุด
	(พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)		เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59
			จำนวน 12 - 0 - 42.7 ไร่

ผังแสดงการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแต่ละครั้ง

- ครั้งที่ 1/1 ส่งมอบ 7 มิ.ย.56
- ครั้งที่ 1/2 ส่งมอบ 6 ก.ย.56
- ครั้งที่ 1/3 ส่งมอบ 11 พ.ย.56
- ครั้งที่ 1/4 ส่งมอบ 19 พ.ค.57
- ครั้งที่ 2 ส่งมอบ 23 ก.ค.57
- ครั้งที่ 3/1 ส่งมอบ 23 ก.ค.57
- ครั้งที่ 3/2 ส่งมอบ 20 พ.ย.57
- ครั้งที่ 4/1 ส่งมอบ 8 มี.ค.59
- ครั้งที่ 4/2 ส่งมอบ 28 ก.ธ.59
- ครั้งที่ 4/3 ส่งมอบ 11 พ.ย.59

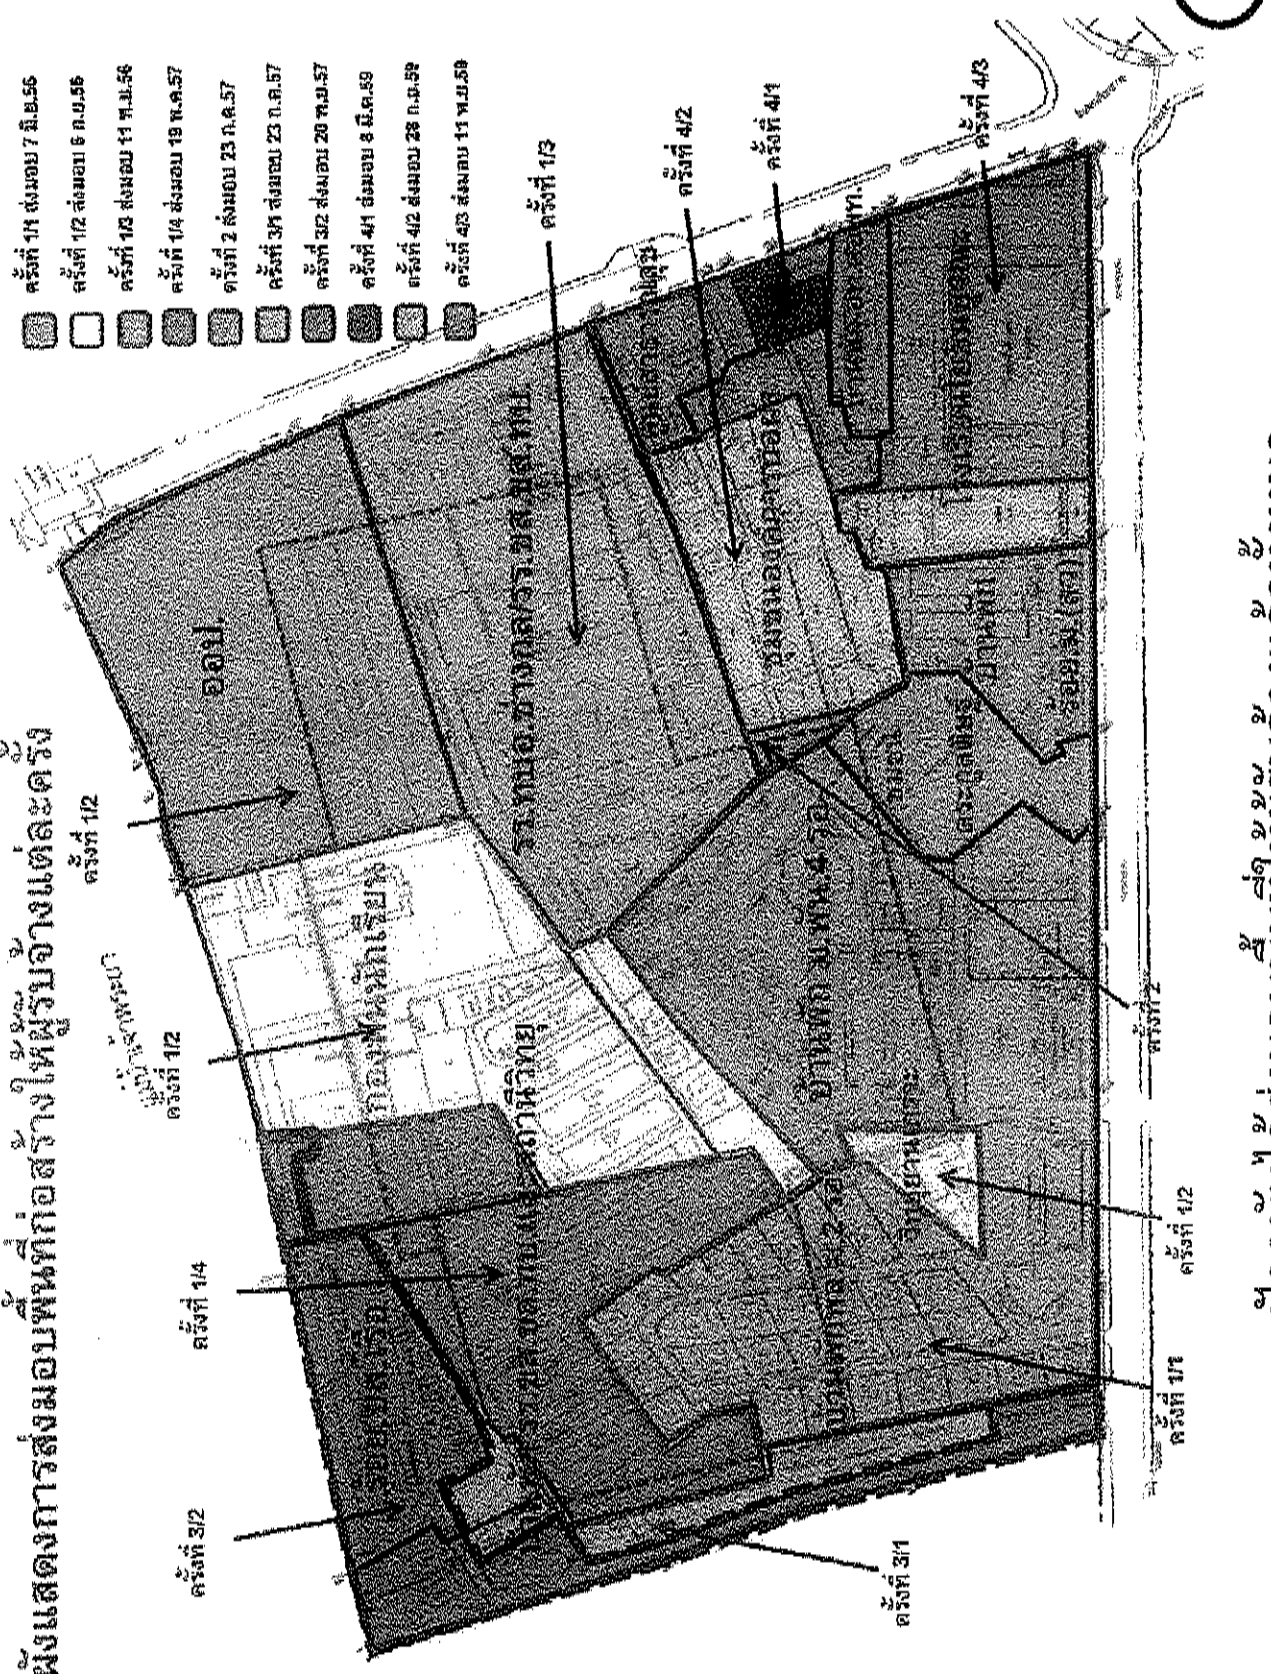

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มี.ค. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค	3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ	
	3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพาน	3.1.2 หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบต่อโครงการรัฐสภาแห่งใหม่	
	เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า	เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป	
	ม่วง เป็นต้น		

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มี.ค. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้	
	3.2 ปัญหาอุปสรรคจากแบบบูรณาการและรายละเอียดขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์	3.2.2 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่มเติม	
		3.2.3 รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560


ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง มี.ค. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		
	3.3 การจัดจ้างผู้ออกแบบพิเศษและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่ง	3.3.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ผู้รับจ้าง ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องติดตามการขออนุมัติราคากลาง ในการจ้าง จากสำนักงบประมาณ
	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้		
	กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก		




ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐


ภาพถ่ายโดยรวมของหน้างานก่อสร้าง

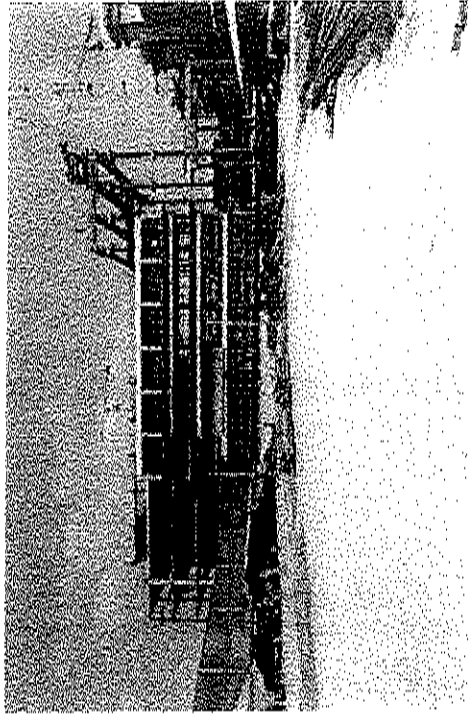

ภาพถ่าย (เขตก่อสร้างฝั่งกลาง (ล.ว.)

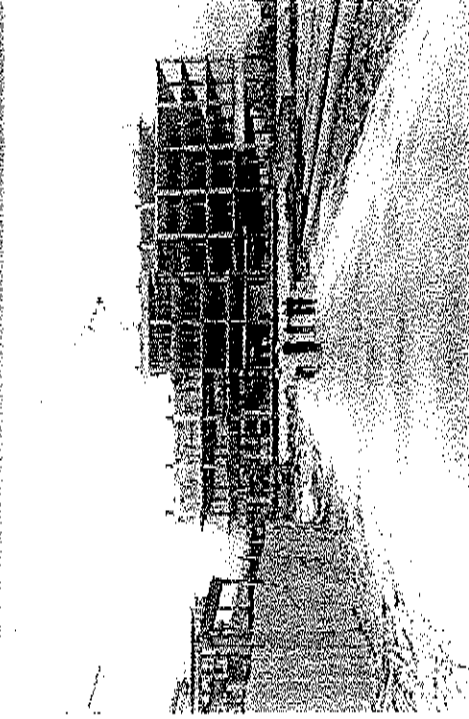


ภาพถ่าย (เขตก่อสร้างฝั่งขวา (ส.)

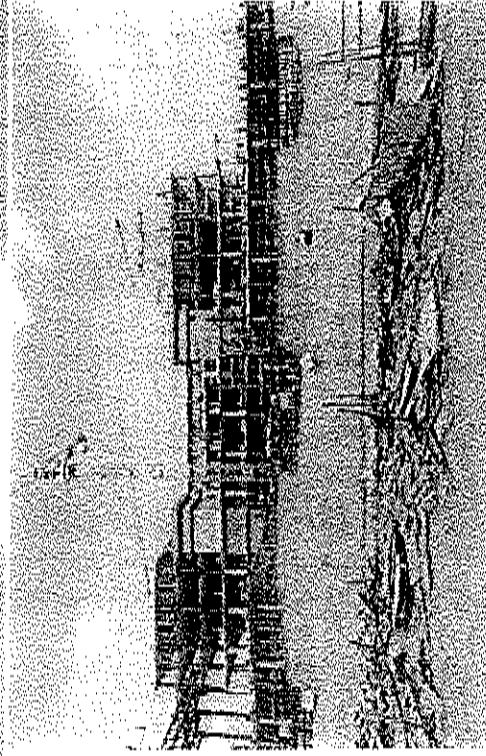


ภาพถ่าย (เขตก่อสร้างฝั่งซ้าย)

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตั้งวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าก่อสร้างอาคาร

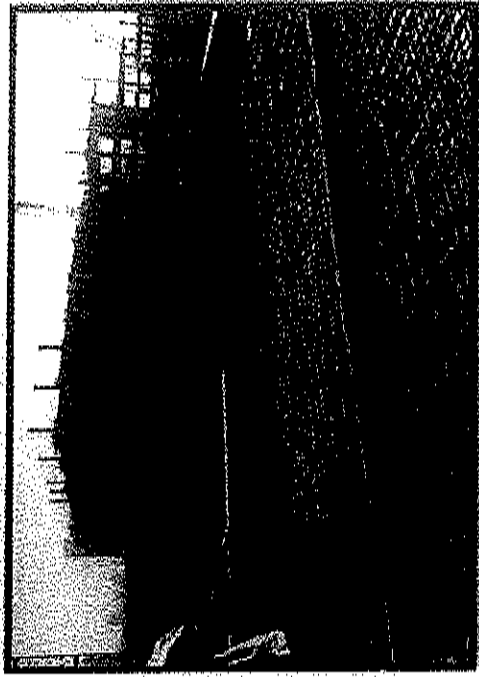




งานโครงสร้างโดยรวม

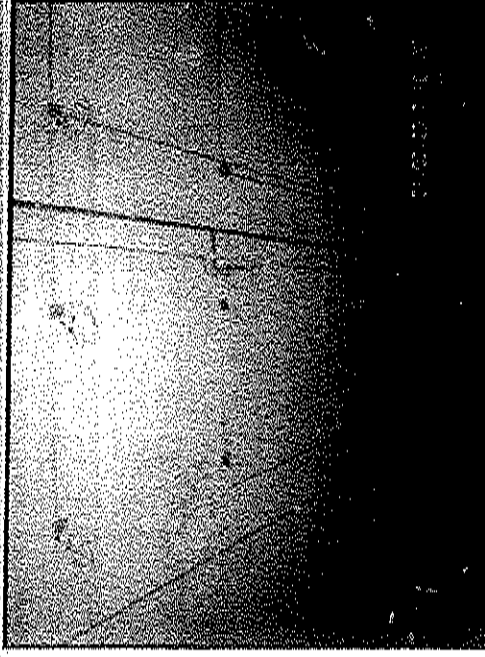

งานติดตั้ง ค่อและสายไฟฟ้า ชั้น ๒2 ชั้นเพดาน

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบ

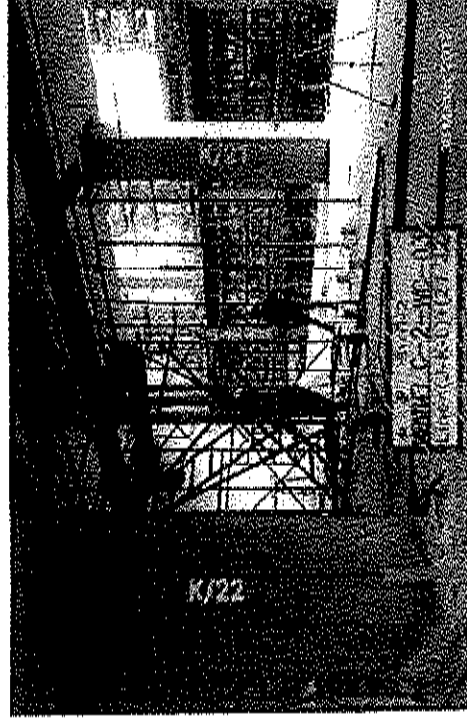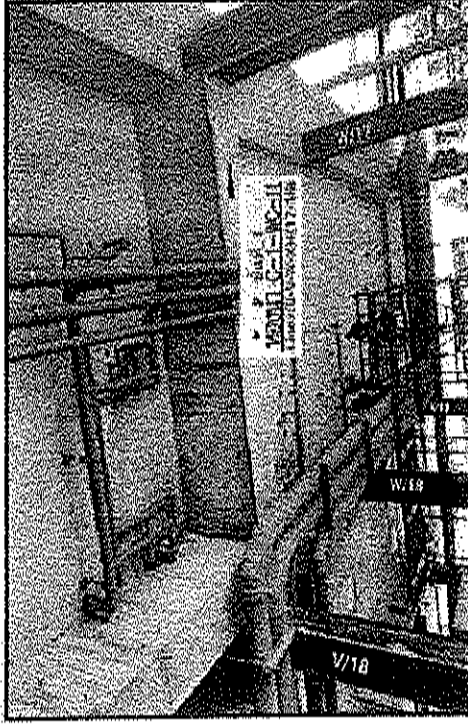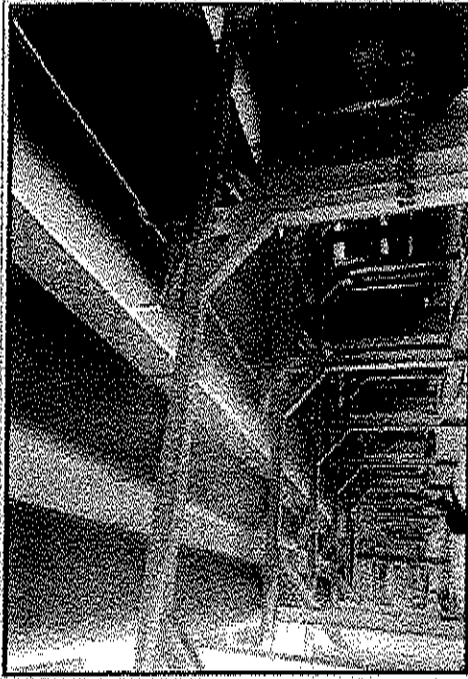


งานติดตั้ง ท่อส่งลมเย็นปรับอากาศชั้น B2.B1.B1M.1-3

งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาลชั้น B2.B1.B1M.1-3

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบ

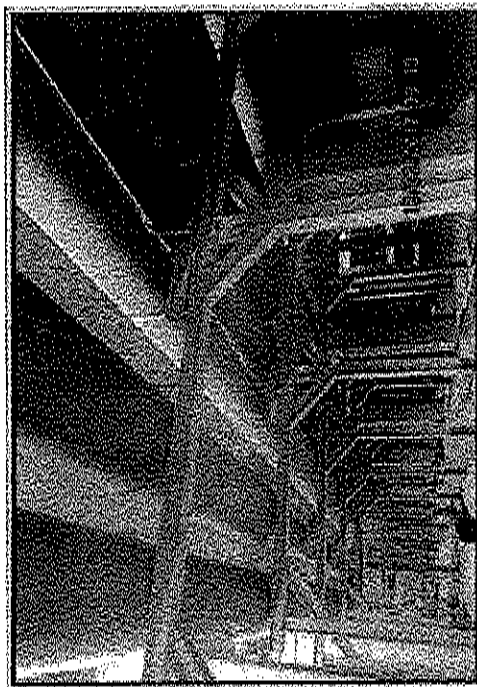

งานติดตั้ง ท่อส่งลมเยื่อรีไซเคิลภาคต้น E.2.E1.B1M.1-3



งานติดตั้ง ระบบสุขภัณฑ์ E.2.E1.B1M.1-3

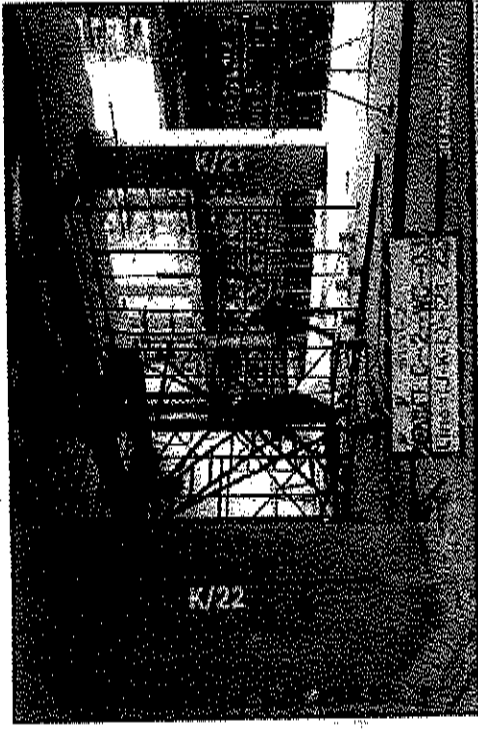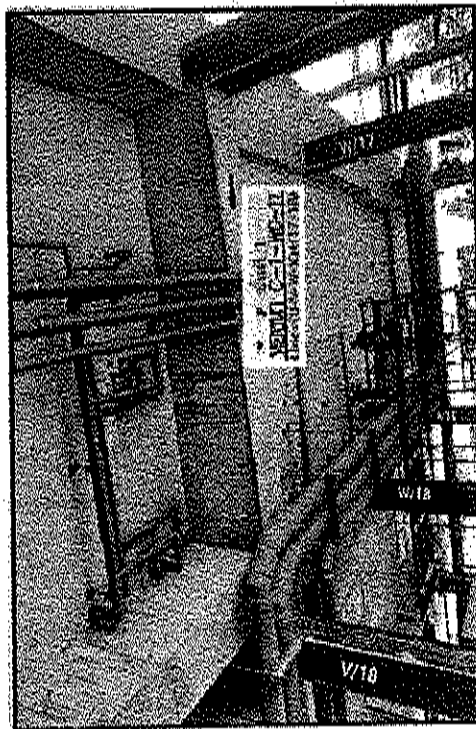

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
