



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่	63542
วันที่	22 มี.ย. 60
เวลา	16.22 น.

ส่วนราชการ : ส่วนกฤษฎาบัญญัติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐-๒๒๘๙ ๔๒๓๔

ที่ : นร ๐๓๐๑/ว ๕๔๖๒ วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๑/ว ๕๔๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ด) ๑๔๔๔๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ด) ๒๐๘๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงศ์ นิตพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) เรียน อปส.ผ่าน รปส.(๒)

สพ.น.แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) มาให้ รปส.ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นางสาวจิตติรัตน์ ศรีธีระวีโรจน์)

ลกม.

๒๒ มิ.ย.๖๐

๓)

- ทราบ

- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ)

ป.อ.ปส.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ นร ๐๖๐๑.๐๓/ว ๖๒๐๑

เรียน พล.อ.อ. นพ.อ. และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตติรัตน์ ศรีธีระวีโรจน์)

อ.ก.ก.ก.ก.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ชันทยานุกุลกิจ) 3198 ๔ 5 มิ.ย. 2560

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๐๘๘๓



กองกลาง	เลขรับ	๒๐๕๕
	วันที่	๒๐ มิ.ย. ๖๐
	เรื่อง	๓๓-๖๖ น.

ส่งถึง	ผู้รับ
เลขที่	๕๗๖๐
วันที่	๒๐ มิ.ย. ๖๐
เวลา	๑๗.๐๓ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๔๔๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๐๔๕๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๒ (เสมียน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th

วันออกต้อง
๑๗๖๐๖๕ ๖๖๖๐
๑๗๖๐๖๕ ๖๖๖๐
นักวิชาการชำนาญการ/ผู้ช่วย



ที่ มท ๐๗๑๖/๐๘/๕๒๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๐๗๗๘๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๕.๐๕ % (ผลงานสะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ทำได้ ๓๔.๕๒ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบ
พื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว
เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๒.๒.๒ การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจำนวน ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง
อาจจะยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่

(๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ

(๒) การขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ ๑๕๐ วัน

๒.๒.๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดจ้างผู้ออกแบบเพื่อศึกษาและออกแบบ
งานระบบ ICT ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่ ซึ่งขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้บริษัทผู้ออกแบบ
ระบบ ICT และได้ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีระยะเวลาดำเนินการออกแบบ ๙ เดือน
ให้แล้วเสร็จโดยต้องเร่งประสานการทำงานกับผู้รับจ้างหลัก บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา ลมประสงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ นร ๐๔๐๓(กร.๑)๕๐๗/๓๔๒๕๖๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(แยกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป


พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางฉันทนา สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

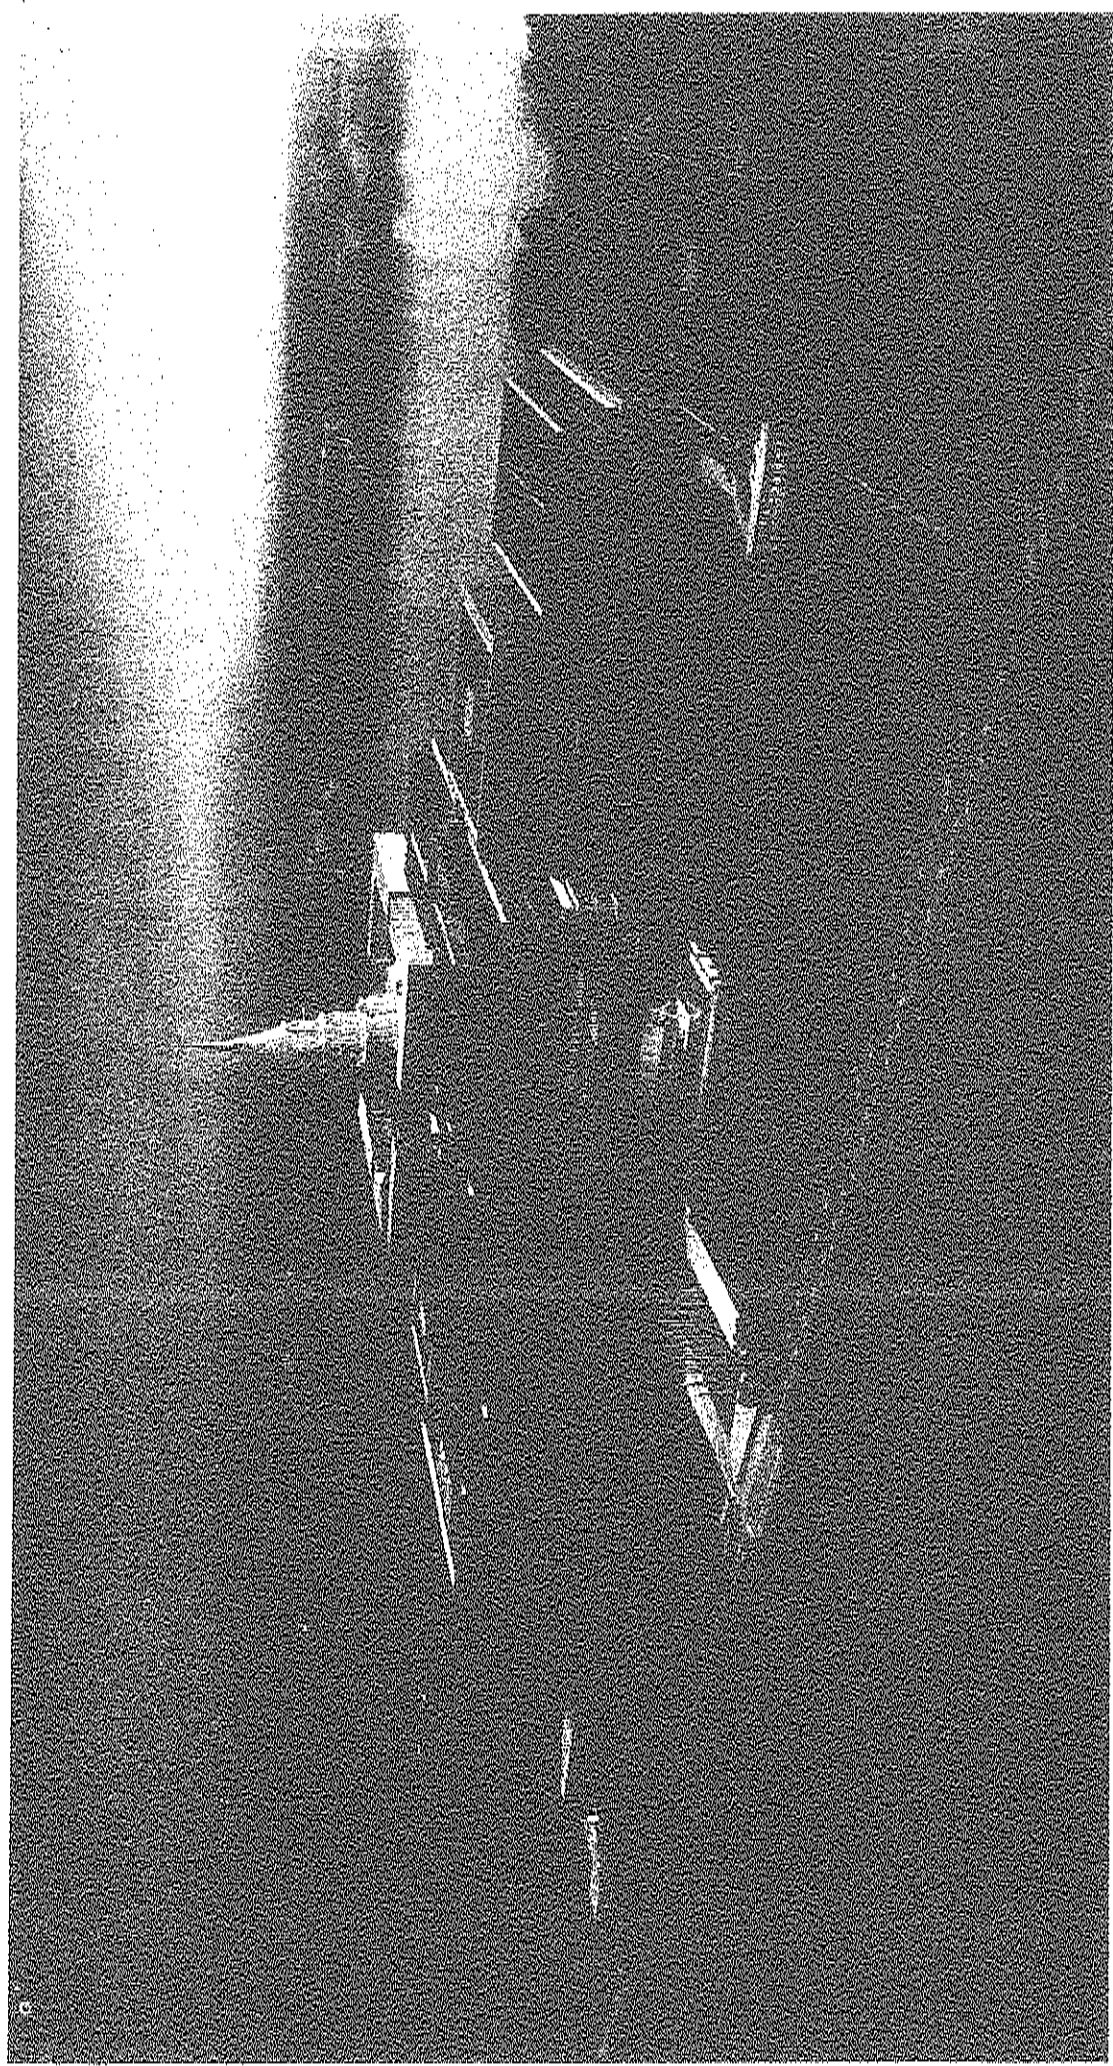

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐



คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง เม.ย. 60	หมายเหตุ/ ข้อดีที่เห็นของคนทำงาน
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 35.05 % หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 31 มี.ค. 60 ทำได้ 34.52 % 2. ส่นง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59 3. ส่นง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหาเรื่องดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ออกไปจำนวน 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 ก.พ. 61	การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ออกไปจำนวน 421 วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ (๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ (๒) การขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ ๑๕๐ วัน


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง เม.ย. 60	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 ⁷ / ₁₀ ไร่)	ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว	ส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 12 - 0 - 42.7 ไร่

ผังแสดงการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแต่ละครั้ง

- ครั้งที่ 1/1 ส่งมอบ 7 ผ.ย.56
- ครั้งที่ 1/2 ส่งมอบ 8 ผ.ย.56
- ครั้งที่ 1/3 ส่งมอบ 11 ผ.ย.56
- ครั้งที่ 1/4 ส่งมอบ 19 ผ.ย.57
- ครั้งที่ 2 ส่งมอบ 23 ผ.ย.57
- ครั้งที่ 3/1 ส่งมอบ 23 ผ.ย.57
- ครั้งที่ 3/2 ส่งมอบ 20 ผ.ย.57
- ครั้งที่ 4/1 ส่งมอบ 8 ผ.ย.59
- ครั้งที่ 4/2 ส่งมอบ 29 ผ.ย.59
- ครั้งที่ 4/3 ส่งมอบ 11 ผ.ย.59

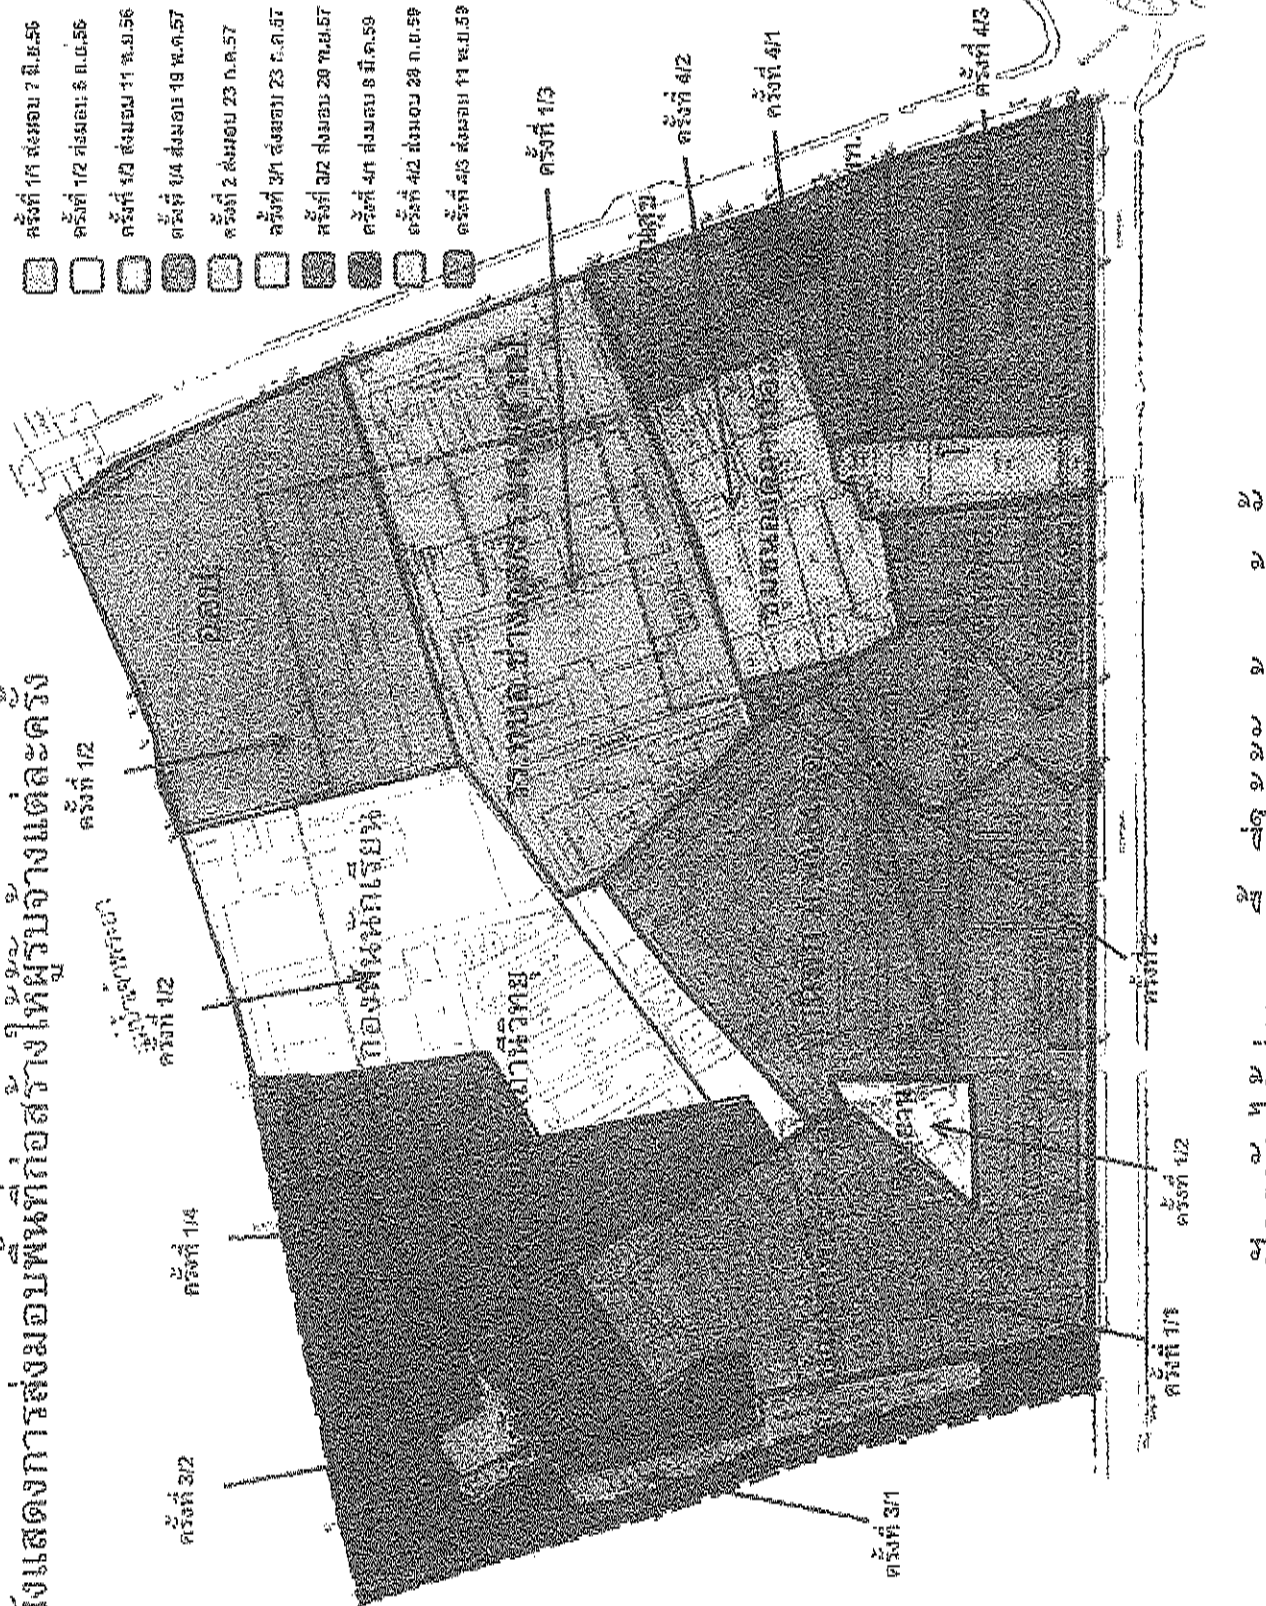

ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด

คณะกรรมการการรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง เม.ย. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค	3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ	
	3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพาน	3.1.2 หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบต่อโครงการรัฐสภาแห่งใหม่	
	เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน	เพื่อหาหรือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป	
	และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีม่วง เป็นต้น		

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ส.ค. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้	
	3.2 ปัญหายุบสรรคจากแบบบูรณาการและรายละเอียดขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์	3.2.2 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่มเติม	
		3.2.3 รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป	

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ 30 เม.ย. ๒๕๖๐


สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง เม.ย. 60	หมายเหตุ
3	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	3.4.1 สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ในการจ้างผู้ออกแบบ ICT ภายในวงเงิน 54,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 3.4.2 สำนักงานเลขารธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ผู้รับจ้างออกแบบแล้ว ได้ลงนามในสัญญา เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 60 โดยมีระยะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 9 เดือน 3.3 การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT สำเข้า ซึ่งสำนักงานเลขารธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก	




คณะกรรมการก้ำวน้ำของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ภาพถ่ายโดยรวมของหน้างานก่อสร้าง

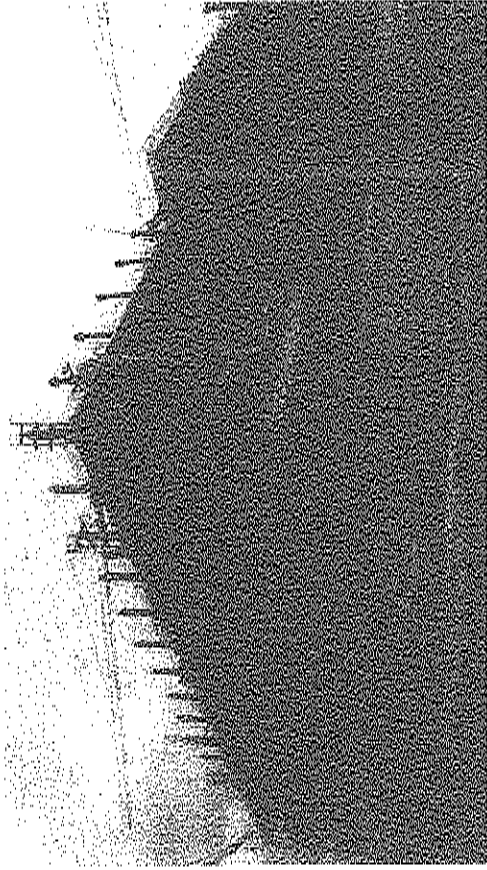

โซนซ้าย (ที่ทำการข้าราชการ ส.ว.)

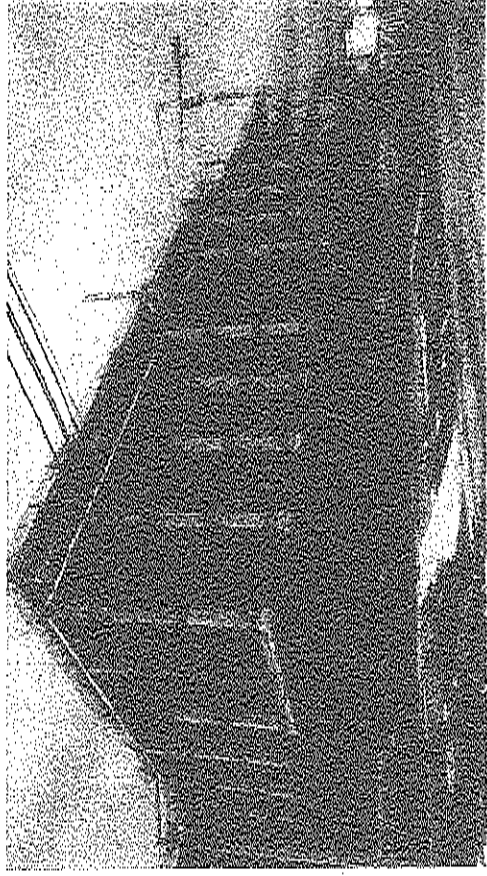

โซนขวา (ที่ทำการข้าราชการ ส.ส.)




โซนกลาง (สมาชิกวุฒิสภา)



คณะกรรมการการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าก่อสร้าง งานระบบ



งานติดตั้ง ท่อและสายไฟฟ้า ชั้น B2,B1,B1M,1-5



งานติดตั้ง ท่อและสายระบบแก๊สเพลิงใหม่ ชั้น B2,B1,B1M,1-4

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐



ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานระบบ



งานติดตั้ง ท่อส่งลมเย็นปรับอากาศชั้น B2,B1,B1M,I-3



งานติดตั้ง ระบบสลิคยาลชั้น B2,B1,B1M,I-4

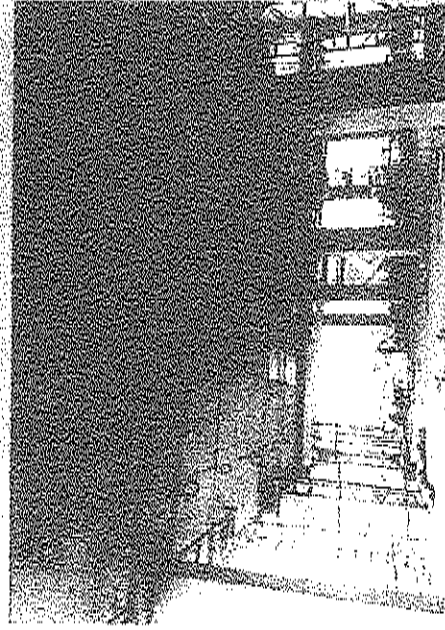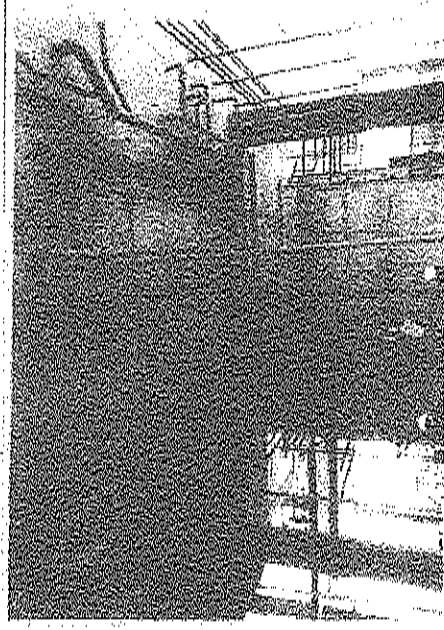

คณะกรรมการความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐
