



ຄ່າວນຫຼືສູດ

บันทึกข้อความ

กกรมป่าสงเคราะห์พัทลุง
รัตนที่ 184135
วันที่ 22/12/60
1981 14.4.9.4

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๖๒๘๗๔๙๐๐

ที่ ๘๙ ๐๗๐๑/๔ ผู้ดูแล

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารธุรกิจสภากแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพฤกษ์ ถนนทหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครึ่งที่ ๖/๒๕๖๐)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ค) ๒๐๘๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนท่าหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครึ่งที่ ๕/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นر ๐๕๐๗/ว(ต) ๔๐๔๙๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนท่าหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครึ่งที่ ๖/๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อโปรดทราบ

Levi's signature

(นางประภาศรี บุญวิเศษ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କୋଣଟାଳେ ମହାଦେବ

ເຕັມ ໂດຍກຳນົດໂລກ ແລະ ເວັບໄກທ້ານຸມ
ເຕັມໃຫຍງວ່າ

[Signature]

(ມາຮັດຍິນດີຕະຫຼອນ ພົມລົງຈຸບັນທຶນ)

1375-1376/93/3/755-5

10 5.9. 1974

กอกกาล
ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.๐๘.๒๕๖๔



เลขที่รับ..... 28667
วันที่..... 76.6.9
เวลา..... 90.69 น

ទំនាក់ទំនង

ที่ ๙๖ ๐๔๐๗/ว(ก) ๔๐๔๗

สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ୧୯୮୦

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐบาลตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณบดีรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/ว(ก) ๒๐๘๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สังที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๖/๑๙๗๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนท่าหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ครึ่งที่ ๕/๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครึ่งที่ ๖/๒๕๖๐) ไปเพื่อดำเนินการ ความลazoleย์ดีประภากตามสำเนานั้นสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณธรรมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่า

๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนท่าหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการอาคารรัฐสภาระเบียงใหม่ สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร อย่างใกล้ชิด และกำชับให้การดำเนินการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมของสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนระบบงานอื่น ๆ แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

४८

(นางณัฐภรณ์ จารี ยันนันดศศิลป์)
รองเลขานุการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๓ (ภายในรัฐ)
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๑๙๐๐-๔
www.soc.go.th

ສໍາເນາດຸກຕ້ອງ

(นายอุรรถพงศ์ พูมโค)
นักจัดการงานที่ว่างไปปฏิบัติการ



ที่ มท ๐๗๑๖/ อธส ๗๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้
เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕ (๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ
พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็wt่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน
และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ นท ๐๗๑๖/๐๙๔๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๓ สรุปความ...

๒.๓ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๓.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๙.๕๙ %

๒.๓.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนารายภูมิส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒.๔ ความเห็นคณฑ์ทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

คณฑ์ทำงานได้ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วได้รับแจ้งว่างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามสัญญาเนี้ยเมื่อสร้างเสร็จอาจจะไม่สามารถใช้อาคารได้เนื่องจากตามสัญญาเดิมได้ตัดปริมาณบางส่วนออกไปได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคระบบประกอบอาคาร ที่ทางผู้ออกแบบ ระบุ ๑๐๕๗ ได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่ร่วมอยู่ในงานสัญญาหลัก (งานอภิคงประมาณ) กับมีงานบางส่วนซึ่งมีความจำเป็นต้องทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จึงเห็นว่าอาจต้องพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเดิมประมาณ ๕,๕๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยสามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนารายภูมิ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเดิมจากรัฐบาลต่อไป

(สิงที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณฑ์รัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณฑ์ทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนท่าหาร (เกียกกาย) ตั้งกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณฑ์รัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำรับเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณฑ์รัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก


(อนุพงษ์ เพ็ญศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรณียธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๖๗๙ ๔๔๗-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๖๗๙ ๔๔๕๖

สำเนาถูกต้อง


(นางพันทนา สมประสังค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โทร. ๐ ๒๖๗๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๗
ที่ ๊ ๙ ๐๔๓ (กร.๑) ๑๗๗๗/๑๗๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๖๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนหน้ารัฐ (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ด้วยกระธรรมหาดไทยได้เสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

จังเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

Welsh

9 J: AUS.

(ประวิตร วงศ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่.....

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
โดย
กระทรวงมหาดไทย

กราบเรียน นายคณะรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการสภาพผู้แทนราชภาร (นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ) และนายไชยเดชจุชา อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ได้ร่วมกับรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแล ให้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็wt่อไป

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความเห็นในส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๓๘.๕๙ %

๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการสภาพผู้แทนราชภารส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

คณะทำงานได้สรุปงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ประกอบด้วย

๒.๑ มีปริมาณงานที่ต้องออกใบได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคระบบประกอบอาคาร ที่ทางผู้ออกแบบ ลงบ ๑๐๕๑ ได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่รวมอยู่ในงานสัญญาหลัก (งานออกแบบงบประมาณ)

๒.๒ มีปริมาณงานบางส่วนซึ่งมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมได้แก่

๒.๒.๑ สัญญาจ้างออกแบบ

- วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๐๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท

- อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(การจ้างออกแบบแก้ไขสัญญา)

๒.๒.๓ สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ

- | | |
|---|-----------------|
| - วงเงินตามสัญญาจ้าง | ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| - อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม | ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (การจ้างที่ปรึกษาช่วงขยายเวลาการก่อสร้าง) | |

๒.๒.๔ สัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---|-----------------|
| - วงเงินตามสัญญาจ้าง | ๒๑๔,๙๗๕,๐๐๐ บาท |
| - อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม | ๗๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (การจ้างควบคุมงานช่วงขยายเวลาการก่อสร้าง) | |

๒.๒.๕ สัญญาจ้างก่อสร้าง (สัญญา ๑ บมจ.ชีโน-ไทยฯ)

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - วงเงินตามสัญญาจ้าง | ๑๒,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| - อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม | ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (ปรับแก้ไขสัญญางานเพิ่ม-ลด) | |

๒.๒.๖ สัญญาจ้างออกแบบด้าน ICT และหบทวนแบบเพิ่มเติม

- | | |
|---|----------------|
| - วงเงินตามสัญญาจ้าง | ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (การดำเนินการยังไม่กราบทบกับงบประมาณจ้าง) | |

๒.๒.๗ งานก่อสร้างสัญญา ๒ (งานนอกสัญญา ครม.อนุมัติ ๒๐ กย.๕๕)

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - วงเงินตามสัญญาจ้าง | ๓,๕๙๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| - อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม | ๔,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (งานระบบประกบอาคาร) | |

ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วได้รับแจ้งว่างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามสัญญานี้เมื่อสร้างเสร็จอาจจะไม่สามารถใช้อาคารได้เนื่องจากความสัญญาหลักเดิมได้ตัดปริมาณบางส่วนออกไปได้แก่งานระบบสาธารณูปโภคระบบประกบอาคาร ที่ทางผู้ออกแบบ (กลุ่มกิจกรรมร่วมค้า สงข ๑๐๕๑) ได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่รวมอยู่ในงานสัญญาหลักเดิม (งานนอกงบประมาณ) กับมีงานบางส่วนซึ่งมีความจำเป็นต้องทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จึงเห็นว่าอาจต้องพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเติมประมาณ ๕,๕๙๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หัวพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลต่อไป


จึงเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๒๖

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល សាខាអង់គ្លេស ភ្នំពេញ

សៀវភៅ និងអាណាពិល

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល សាខាអង់គ្លេស ភ្នំពេញ

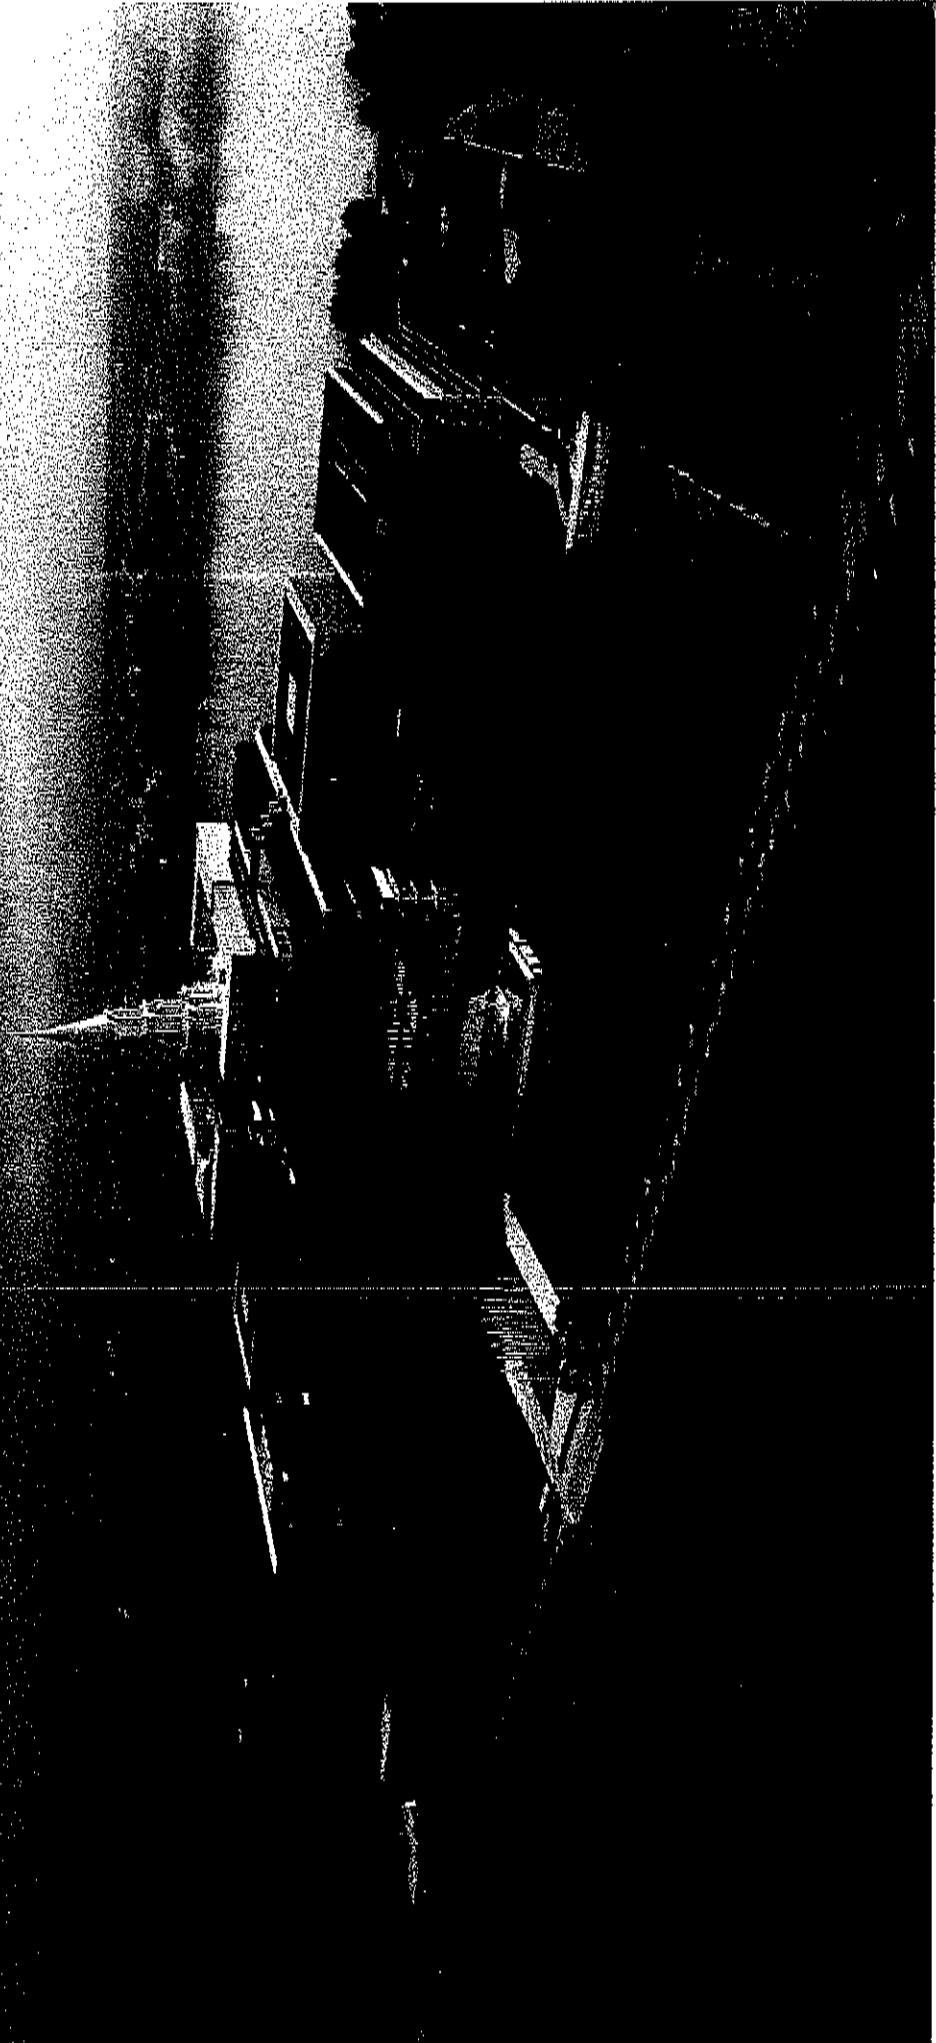

គណន៍អំពីការបង្កើតការងារសាខាអាស៊ានុយិត្តនៃក្រសួងរៀបចំការងាររដ្ឋបាល
និងរដ្ឋបាល នៅ ភី.អ.ល. នៅទី១០

និងការបង្កើតការងារសាខាអាស៊ានុយិត្តនៃក្រសួងរៀបចំការងាររដ្ឋបាល
និងរដ្ឋបាល នៅ ភី.អ.ល. នៅទី១០

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภากาแฟแห่งใหม่ ประจำปี 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการเรียบด้วย	ความก้าวหน้าถึง ส.ค. 60	หมายเหตุ
1	ผลงานสร้างที่ทำได้	<p>ผลงานที่ทำได้ 39.59%</p> <p>หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 31 ก.ค.60 ทำได้ 38.10%</p> <p>2. สมน. เลขานิการสภานามนราษฎร์ ให้ความหมาย ระยะเวลา การก่อสร้างจะดำเนินการบนพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากภาระงาน คาดว่าใช้เวลาร่วม 387 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 15 ธ.ค. 59</p> <p>3. สมน. เลขานิการสภานามนราษฎร์ ได้พิจารณา ขยาย ระยะเวลา การก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากสาเหตุปัญหา เรื่องดินจราจรการก่อสร้างชนิดดิน คาดว่าใช้เวลาร่วม 421 วัน ไปสิ้นสุด วันที่ 9 พ.ย. 61</p>	<p>การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 สำหรับงานที่ 3 ยังไม่สามารถทำ ให้สำเร็จในกำหนดเวลา เนื่องจากภาระงานที่ 3 ยังคงดำเนินต่อไป</p> <p>ให้ผู้รับผิดชอบอย่างรัดtight มาตรการก่อสร้าง ให้สำเร็จในกำหนดเวลา</p> <p>คาดว่าได้แก้ไขแล้ว</p> <p>(๑) ปัจจุบันการซ่อมรอบพื้นที่ส่วนลดพ้าย ของโครงสร้างนี้ยังคงบูรณะ</p> <p>(๒) การขยายระยะเวลาการก่อสร้างต่อไป คงต้องรักษาเดิม ไม่超過วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘ ให้終わันการซ่อมแซมหลังผู้รับผิดชอบตามแผน แจ้งงานจากการซ่อมค่าแรงชั่วคราวต่อไป ๑๕๐ วัน</p>
2	การตั้งมูลค่าเบ็ดเตล็ด	<p>การตั้งมูลค่าเบ็ดเตล็ด ที่ผู้รับผิดชอบแล้ว จำนวนทั้งหมด 123 - 1 - 5 $\frac{7}{10}$ [ร.]</p>	<p>ส่วนของเบ็ดเตล็ดที่ผู้รับผิดชอบแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 12 - 0 - 42.7 [ร.]</p>

คณฑ์ทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่
ผู้ว่าที่ ๓๙ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๐

ગુજરાત સરકારની પણ કાંઈ વિધાન નથી 31 જાન્યુઆરી 2560

ลำดับ	รายการชีวิต	หมายเหตุ	หมายเหตุ
3	ปัญหาอุปสรรค	3.1.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้ตกลง กันมา จัดการด้านงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมีชื่อเสียง ด้วยสิ่งที่ได้ (ผลงานธุรกิจ) คุณธรรมศรีอุบลฯ รายละเอียดโครงการแล้ว	โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่ายฟ้าเมืองเดี๋ยว (สถานีรักษากา)
	3.1.2 หน่วยงานภายนอกที่กระทบกับ ระบบและภารกิจการรักษา	รายละเอียดโครงการจัดทำ สำหรับ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงิน 1.1 แสนล้านบาท	คาดว่าริบบิลสร้างปี 2561 เปิดเดินรถได้ปี 2567
	3.1 ปัญหาอุปสรรคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับ ระบบและภารกิจการรักษา	เพื่อหารือข้อมูลรับปัญหาท้ายก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป เจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสระน้ำรักษ์พืช	
		ม่วง เป็นเดือน	

ପାଦବୀ କରିବାକୁ ଅନ୍ତରେ ଏହାରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั้นใหม่ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ส.ค. 60	หมายเหตุ
3	ปูพื้นท่าอุปสรรค (ต่อ)	<p>3.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และแจ้งให้ผู้ออกแบบ และรายละเอียดซึ่งดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ ต่อไป</p> <p>3.2.2 นำเสนองานข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างผู้จัดการ โครงการที่มีเป็นเดิม</p> <p>3.2.3 รายงานที่ยังไม่มีข้อสรุปพร้อมจ้างการร่วมราษฎร์ที่มาได้ ที่ปรึกษาบริหาร โครงการและผู้ควบคุมงานอธิบายระหว่างการร่วมราษฎร์ให้ทราบ คราวเมื่อเดือนกันยายน สำหรับการจ้างผู้จัดการที่มี</p>	

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าโครงการรัฐส่วนที่ 3 ประจำเดือนที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง ส.ค. 60	
		หมายเหตุ	หมายเหตุ
3	ปูนหิน/อุปสรรค (ต่อ)	3.3.1 ดำเนินงบประมาณได้ให้ครบทั่วทั้งขอบเขตทางกายภาพ ของราคา ในภาระจ้างผู้ออกแบบศึกษาและ ออกแบบระบบ ICT ล่าสุด ทำให้ การพัฒนากิจกรรมทางการอาชญากรรม	ผู้ออกแบบระบบ ICT ได้ลงนามในสัญญา การศึกษาและสัมภาระไว้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัสดุที่จะใช้ในการติดตั้งระบบ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อจ้างราคา
	3.3 การจัดตั้งผู้ออกแบบศึกษาและ ออกแบบระบบ ICT ล่าสุด ทำให้ การพัฒนากิจกรรมทางการอาชญากรรม	54,000,000 บาท เนื่องจาก วันที่ 25 เมษายน 2560 ออกใบอนุญาต ให้ลิขิตในสัญญา เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 60 โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 210 วัน	ที่ผู้ออกแบบระบบที่ได้รับมอบหมายมาต้องรับผิดชอบ ว่างานประดิษฐ์ งานในสัญญาที่ 2 ไม่เป็นไป ตามกรอบเวลาที่กำหนด อาจจัดกระบวนการกันการ ก่ออุบัติเหตุกฎหมายหลัก
	3.3.2 ดำเนินงานลดภาระผู้ดูแลประชาชน ออกใบอนุญาต ให้ลิขิตในสัญญา เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 60 โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 210 วัน	3.3.2 ดำเนินงานลดภาระผู้ดูแลประชาชน ให้ผู้ดูแลฯ จัด ออกใบอนุญาต ให้ลิขิตในสัญญา เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 60 โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 210 วัน	3.3.2 ผู้รับจ้างออกแบบฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทางกฎหมายของราคายังไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน ก่อนเดือน กันยายน 2560
	3.3.3 ผู้รับจ้างออกแบบฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทางกฎหมายของราคายังไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน ก่อนเดือน กันยายน 2560	3.3.3 ผู้รับจ้างออกแบบฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทางกฎหมายของราคายังไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน ก่อนเดือน กันยายน 2560	3.3.3 ผู้รับจ้างออกแบบฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสารทางกฎหมายของราคายังไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน ก่อนเดือน กันยายน 2560

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานاه้่งใหม่ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถัง ส.ค. 60	หมายเหตุ
3	<p>ปูอุบทา/orปลด (ต่อ)</p> <p>3.4 จ้านวนแรงงานไม่เพียงพออีก บริษัทฯสามารถดำเนินการได้ ตามนี้จะต้องใช้แรงงานอีกคน</p>	<p>3.4.1 ที่ปรึกษาแจ้งให้ผู้ควบคุมงานประทับตราเก็บผู้รับเข้า ทำการติดตั้งระบบงานและศักดาตามห้องการร่วม กันที่นี้จะต้องใช้แรงงานอีกคน</p> <p>3.4.2 ให้ผู้รับผู้จัดต่างๆ เตรียมทีมช่างมาจำนวน เพื่อจะเร่งรัดและทำการก่อสร้างให้มีความตืบหน้าเพิ่มขึ้น 2,200 คน ทั้งนี้งานก่อสร้างมีความ ลึกมากที่ทำได้โดยอยู่ที่ 0.50% -</p> <p>1.00% ต่อเดือน และผลงานนี้อยู่กว่า หนึ่งห้าเดือนก่อนที่ก่อสร้าง ก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จในปลายปี 2562</p>	<p>ผู้รับผู้จัดต้องให้มีการพัฒนาบ้านเรือนของบ้านมาอีก ประมาณ 10% ปัจจุบันมีแรงงานประมาณ 2,500-2,700 คนที่ให้เพิ่มผลงานการก่อสร้าง ในเดือนสิงหาคม 2560 มีความตืบหน้า 1.49%</p>

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานแห่งใหม่ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าดังนี้ ณ ศ.ค. 60	
		หมายเหตุ	หมายเหตุ
3	ปัจจุบัน/อปสรรค (ต่อ)	<p>3.5.1 โครงการงานก่อสร้างทางสัญญาหลัก ที่ดินอยู่ระหว่าง ก่อสร้างในงบประมาณ 12,280 ล้านบาท ยังมีงานในส่วน ของสถาปัตย์ ได้แก่ งานสาธารณูปโภค งาน ICT นอกรสัญญาหลัก ได้แก่ งานสถาปัตย์ งาน ICT งานภายนอกอาคาร งานไม้สักหัวปลอก และงาน พื้นดินออกแบบได้ต้องภายในช่วงของการเป็น</p>	<p>สำนักงานฯ โดยคณะกรรมการบริหาร โครงการฯ อยู่ระหว่างพัฒนารายละเอียดของ รายการงานนอกสัญญาและกรอบวงเงิน ค่าก่อสร้างส่วนที่จะเพิ่มเติม</p>

กิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การผลิตกราฟฟิคโดยใช้คอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ ๑๙

This image is a high-contrast, black-and-white scan of a textured surface. The left side is dominated by a dark, granular texture, while the right side features a series of vertical, lighter-colored streaks or lines. A prominent, bright, rectangular area is centered in the upper portion of the frame, appearing to be a reflection or a hole in the material. The overall quality is grainy and lacks fine detail due to the high contrast.

卷之三

41.02 %	7.15 %	7.28 %	9.32 %
41.02 %	7.15 %	7.28 %	9.32 %
41.02 %	7.15 %	7.28 %	9.32 %
41.02 %	7.15 %	7.28 %	9.32 %

គិតជាការប្រព័ន្ធឌីជីថល ការប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការប្រព័ន្ធឌីជីថល

ปริมาณงานในส่วนที่ต้องออก

งานระบบสารสนับโภคระบบประกอบอาคาร ที่ทางผู้ออกแบบแบบลงบ ๑๐๕๙ ได้ออกแบบไว้แล้ว
แต่ยังไม่ร่วมอยู่ในงานสัญญาหลัก (งานนองบประมาน)

๑. งานระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสื่อสาร อาคารหลัก และอาคารประกอบ ได้แก่ งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) ทั้งหมด ๔Sets และระบบส่งจ่ายน้ำมัน ๑ ระบบงานเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) งานระบบไฟสัญญาณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Heliport Light) บริเวณชั้น ๘ งานระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) งานระบบพื้นที่ Data Center ชั้น B๑
๒. งานระบบป้องกันอัคตีภัย ได้แก่ งานจัดหาติดตั้งและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
๓. งานระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่งานติดตั้งอุปกรณ์โทรทัศนวงจรปิด Type II และ คอนโทรล/ซอฟต์แวร์งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพิเศษ งานจัดหาและติดตั้งทดสอบระบบเครื่องกันหนึ่งชั้น งานจัดหาและติดตั้งทดสอบระบบตรวจจับการบุกรุกร่องบริเวณ
๔. งานระบบปรับอากาศได้แก่ ELECTROSTATIC KITCHEN AIR CLEANER สำหรับอาคารหลัก ELECTROSTATIC KITCHEN AIR CLEANER สำหรับล้านประชาชน งานระบบปรับอากาศและระบบยาガ๊าท์หน่วยพยาบาล
๕. งานระบบสุขาภิบาลได้แก่ระบบก๊าซทางการแพทย์ สำนักพยาบาล (ด้าน สส.) ระบบก๊าซทางการแพทย์ สำนักพยาบาล (ด้าน สว.) ระบบก๊าซทางการแพทย์ แผนกหันตกรรม

ตารางแสดงงบประมาณเพื่อให้อาหารรัฐส่วนที่ไม่ใช่ “โครงการต่อสรุป”

ลำดับขั้น	วิจัยเข้าห้องสมุดฯ (บาท)	ที่อยู่ทั่งบประมาณเพื่อเดิน (บาท)	รายละเอียด
๑. ศูนย์รับข่าวสารภายนอก	๒๐๕,๔๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	การจ้างออกแบบทำขาร่างพื้นที่อยู่ บนที่ดินที่ราชบุรี
๒. ศูนย์ปฏิบัติที่ปรึกษาโครงสร้าง	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐,๐๐๐	การจ้างที่ปรึกษา ช่วงขยายเวลาโครงการอู่ซั่งครั้งที่ ๒ (๖๗๗ วัน) จนกว่าจะมีอู่ซั่งเสร็จ ปลายปี ๒๕๖๒
๓. ศูนย์บริการศูนย์ควบคุมงาน	๙๗๔,๙๗๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐	การจ้างศูนย์ควบคุมงาน ช่วงขยายเวลาโครงการอู่ซั่งครั้งที่ ๒ (๖๗๗ วัน) จนกว่าจะมีอู่ซั่งเสร็จ ปลายปี ๒๕๖๒
๔. ศูนย์รับข่าวสาร (ศูนย์ฯ ๑ ปมช. ที่น้ำ-ทราย)	๑๒,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับเปลี่ยนศูนย์งานพื้นที่ดิน ประมวล พ๖๐๐ รายการ เช่น การเปลี่ยนแปลง สถานที่ที่อยู่ งานพื้นที่ดินอย OUTLET งาน ICT งานปรับศูนย์มาตั้งระบบ ปรับอากาศ “โซ”
๕. ศูนย์รับข่าวสารแบบต้าน ICT และทางานแบบเพื่อเดิน	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	-	การดำเนินงานเบื้องต้นกับงานประมาณร้านฯ
๖. งานอู่ซั่งครั้งที่ ๒ (งานยกห้องสมุดฯ ๑ ครั้ง. อัมมูล ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒)	๗,๔๕๖,๗๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐	งานยกห้องสมุดฯ ๑ เนื่องด้วย เหตุขาดแคลนบุคลากร ได้แก่ งาน ICT งานสำนักงานใหญ่ งานระบบประปาของอาคารและภายนอก งาน DATA CENTER และ APPLICATION ฯลฯ
รวมเงินงบประมาณเพื่อเดิน		๕,๕๓๖,๐๐๐,๐๐๐	หมายเหตุ : เป็นราคากล่องละ จัดการดำเนินการจะนับชั้นบัน (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)

๐๐
