



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๑๙๙

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/ ๓๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓ (SP๒)

เรียน รปส.(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา ผชช. (นางทัศนีย์ ผลชานิโก) ได้แจ้งที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ให้นำหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามโครงการลักษณะที่ ๑ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ได้แก่ สทท. สวท. สนผ. สฟป. สปต. สนข. สปข.๑ - ๘ ให้รายงานไปยัง สปข.๖ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้แบบรายงานของ สปข.๖

- ให้นำหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามโครงการลักษณะที่ ๓ (๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ได้แก่ สปข. ๔, ๕, ๖ ให้รายงานไปยัง สนผ. ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยใช้แบบรายงานของ สนผ.

- มอบหมายให้ สนผ.(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) เป็นหน่วยงานรวบรวมรายงานตามข้อ ๑ และ ๒ ส่งให้ คอ.บต. ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ กปส.เสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓ (SP๒) และขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย วงเงิน ๔๕ ล้านบาท รายละเอียดตามหนังสือ กปส. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงบประมาณแจ้งให้ กปส. ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ในระบบ e - Budgeting ซึ่งได้นำเสนอ อปส. ขอปรับแผนและส่งให้สำนักงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามบันทึก ที่นร ๐๒๐๑.๐๒/- ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ สำนักงบประมาณเห็นชอบเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓ (SP๒) ที่ใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติวงเงินเพื่อการดำเนินโครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยของ กปส. (งวดที่ ๑) จำนวน ๗๑ รายการ เป็น

/ เงิน ๓๒,๘๐๓,๓๕๕ บาท...

เนื่องจากต้องดำเนินการโอนข้อมูลจากระบบ e - Budgeting (SP) ไปสู่ระบบ GFMS ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนข้อมูลแล้ว ทราบว่าต้องสร้างรายการใหม่ในระบบ GFMS เพราะ กปส. ไม่เคยได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ พ.ร.ก. มาก่อน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จหลังวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากมีวันหยุดช่วงสงกรานต์หลายวัน มีผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ตามแผนที่กำหนดคือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

๓.๕ รายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๙ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๑๙๖,๖๔๕ บาท ได้แจ้ง สปข. ๔,๕,๖ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบ ประ ๔ และ ประ ๕ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งให้ ผชช.(นางทัศนีย์ฯ) ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น สปข. ๔,๕,๖ แจ้งว่าได้ประสานกับสำนักงานโยธาประจำจังหวัดเพื่อให้ประเมินราคาแล้ว แต่บางรายการอาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเป็นรายการย่อยๆ ไม่มีแบบแปลนที่จะคำนวณราคาได้


๔.ข้อพิจารณา

๔.๑ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ข้อ ๙) อนุมัติและรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจาก ครม. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และสำนักงานงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ แต่เนื่องจากการอนุมัติเงินโดยสำนักงานงบประมาณยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนของการอนุมัติเงินงวด จึงเห็นควรให้ถือว่าวันที่ กปส.ได้รับใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นวันที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ และให้หน่วยงานดำเนินการลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ ทั้งนี้ กคส. ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการ (ผชช.นางทัศนีย์ฯ) จะประสานและติดตามเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อแจ้งวันที่จะต้องลงนามในสัญญาที่ชัดเจนต่อไป

๕.ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้ง สปข. ๔, ๕, ๖ ทราบความคืบหน้า และเตรียมดำเนินการตามข้อพิจารณา ๔.๑ เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติเงินงวดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ จักขอบพระคุณยิ่ง

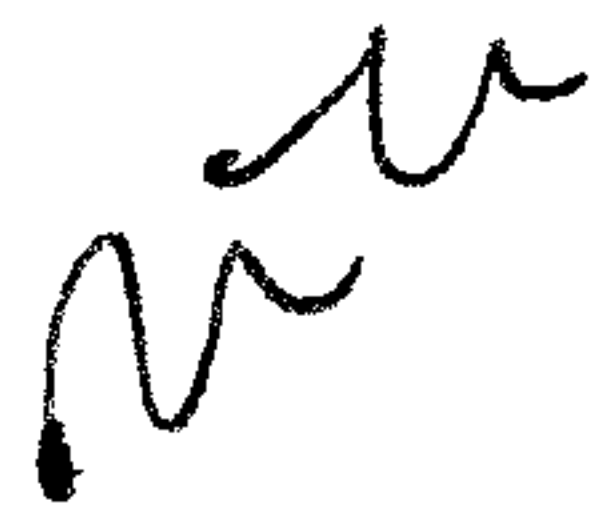

(นางทัศนีย์ ผลชานิก)

ผชช.เฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการฯ

- มอบ สปข. 4, 5 และ 6

ดำเนินการตามเสนอ

- เรียน อคค.

เพื่อโปรดทราบด้วย

ร.อ.ปส.

ร.อ.ปส.

11 เม.ย. 2554

ปส. (นายธีรพงษ์ ไชยสิทธิ์)

11 เม.ย. 2554

1342

เงิน ๓๒,๘๐๓,๓๕๕ บาท ส่วนที่เหลืออีก ๔๙ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๑๙๖,๖๔๕ บาท ให้ กปส. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๑๑๕๙๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ ในคราวประชุม ผอ.สพข. ๑ - ๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ผชช. (นางทัศนีย์ฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓ (SP๒) มีมติให้ สบข. ๔,๕,๖ รับทราบผลการอนุมัติงบประมาณในงวดแรกจำนวน ๗๑ รายการ ต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ และอนุมัติงวดที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการซึ่งต้องจัดหาเอกสารแบบ ประ ๔ ประ ๕ เพิ่มเติม เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๔)

๓.ปัญหาอุปสรรค

๓.๑ การประสานกับสำนักงบประมาณในครั้งแรก ได้ตกลงว่าจะยุบรายการซึ่งมีอยู่จำนวนมากให้น้อยลง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Budgeting (SP) ฝ่ายเลขานุการจึงแจ้งให้ สบข. ๔ ,๕, ๖ พิจารณารวมรายการที่สามารถจัดหาพร้อมกันได้ไว้ด้วยกัน เมื่อนำร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งแสดงรายละเอียดที่ยุบรายการรวมกันไว้ด้วยไปให้สำนักงบประมาณตรวจ ก็ได้รับคำแนะนำว่า ควรจะแยกรายการให้ชัดเจน เนื่องจากตามระเบียบพัสดุฯ กำหนดว่า รายการที่ระบุรายละเอียดรวมกันไว้ ไม่สามารถจัดหาแบบแยกรายการได้ เพราะจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แต่ถ้ารายการที่จำแนกรายละเอียดแต่ละรายการไว้ สามารถจัดซื้อจัดหาพร้อมกันได้ ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลจึงบันทึกข้อมูลแบบจำแนกรายละเอียดแต่ละรายการ ทำให้รายการที่ต้องบันทึกมีจำนวนมากถึง ๑๒๐ รายการ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องมาก

๓.๒ การบันทึกข้อมูลในระบบ e - Budgeting (SP) ที่ดำเนินการครั้งแรก ต้องเริ่มบันทึกตั้งแต่ขั้นตอนคำของบประมาณฯ แล้ว sign off ระบบไปที่สำนักงบประมาณ เมื่อสำนักงบประมาณตรวจสอบแหล่งเงินถูกต้องจึงอนุญาตให้บันทึกในขั้นตอนของระบบวางแผน เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก และ สบข. ๖ ขอปรับปรุงรายการบางส่วนในระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูล จึงเกิดความล่าช้าจากการตรวจสอบรายการและแก้ไขจำนวนเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง

๓.๓ เมื่อส่งบันทึกในระบบแล้วเสร็จ จึงส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับช่วงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ต้องดำเนินการให้ทันปฏิทินงบประมาณ จึงทำให้สำนักงบประมาณพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ ล่าช้า และได้แจ้งให้ กปส. ดำเนินการแก้ไขการบันทึกข้อมูลงบประมาณซึ่งเดิมบันทึกในระบบของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาบันทึกใหม่ในระบบของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมถึงการปรับแก้ไขวันลงนามสัญญาจากเดิมกำหนดไว้ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็น ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

๓.๔ หลังจากแก้ไขข้อมูลในระบบ e - Budgeting (SP) เรียบร้อยแล้ว สำนักงบประมาณเห็นชอบแผนฯ และอนุมัติเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แต่ยังไม่สามารถขออนุมัติดำเนินการได้

/ เนื่องจากต้องดำเนินการ...
